



CARATULA DE ESTIMACION

1 Y
FINIQUITO
No. ESTIMACION **OBRA:** REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES"
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. **FECHA:** 13-abr-21
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL **AVANCE**
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021 **FISICO** **FINANCIERO**
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDEZ CAMACHO **100.00%** **100.00%**
PERIODO EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021 **HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN DE ORDENES DE CAMBIO

AMPLIACION AL CONTRATO INICIAL

IMP. ORDENES DE CAMBIO ANTERIOR	ORDENES DE CAMBIO PRESENTE	ORDENES DE CAMBIO ACUMULADO
O.C. No.	O.C. No.	O.C. No.
TOTALES DE O.C.	-\$ 16,811.18	-\$ 16,811.18

No. DE ESTIMACION **UNO Y FINIQUITO**

AUTORIZO

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA ENCARGADO DE DESPACHO

JUAN CARLOS RESÉNDEZ CAMACHO CONTRATISTA

DETALLE DE LA SOLICITUD DE PAGO

IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO: \$ 957,902.19
ANTICIPO DEL 30 %: \$ 287,370.66
IMPORTE DE CONTRATO ACTUALIZADO: \$ 941,091.01
IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACION: \$ 811,285.35
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 247,733.33
SUMA: \$ 563,552.02
I.V.A. 16 %: \$ 90,168.32
SUB-TOTAL: \$ 653,720.34
RETENCION DEL 5 AL MILLAR: \$ 4,056.43
RETENCION DEL 2 AL MILLAR: \$ 1,622.57
TOTAL A PAGAR NETO: \$ **648,041.34**

ESTADO DE CUENTA (DEL IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO)

ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR: \$ -
PRESENTE ESTIMACION: \$ 941,091.01
TOTAL ESTIMADO: \$ 941,091.01
IMPORTE POR ESTIMAR: \$ -
AMORTIZADO ANTERIORMENTE: \$ -
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION: \$ 247,733.33
TOTAL AMORTIZADO: \$ 247,733.33
POR AMORTIZAR: \$ -
TOTAL DE RETENCIONES DEL CONTRATO: \$ 5,679.00
ACUM. POR RET. HASTA ESTIM. ANTERIOR: \$ -
PRESENTE RETENCION: \$ 5,679.00
TOTAL RETENIDO: \$ 5,679.00
POR RETENER: \$ -



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C: REGJ10922712

1 Y
FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

PERIODO EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21

HOJA: 1 DE 4

AVANCE

FINICIO FINANCIERO 100.00%

PRESUPUESTO DE CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO		AVANCES		IMPORTES	
						ANTERIOR	ESTE	ANTERIOR	ESTE	ANTERIOR	ESTE
1245 11	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE ESTABLECIENDO REFERENCIAS.	ML	183.70	\$ 15.46	\$ 2,840.00	0.00	183.70	\$ -	\$ 2,840.00	\$ -	\$ 2,840.00
1000 21	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.	ML	533.60	\$ 52.70	\$ 28,120.72	0.00	527.13	\$ -	\$ 27,779.75	\$ -	\$ 27,779.75
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.	M3	46.01	\$ 166.55	\$ 7,662.97	0.00	42.84	\$ -	\$ 7,135.00	\$ -	\$ 7,135.00
9000 45	ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA, TRÁNSITO NORMAL, INCLUYE CARGA.	M3	69.02	\$ 65.77	\$ 4,539.45	0.00	64.26	\$ -	\$ 4,226.38	\$ -	\$ 4,226.38
9002 45	ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1RO. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO ZONA URBANA, TRÁNSITO NORMAL.	M3/KM	276.06	\$ 14.14	\$ 3,903.49	0.00	257.04	\$ -	\$ 3,634.55	\$ -	\$ 3,634.55
1100 03	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANIA EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA EN SECO, EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN CAMIÓN.	M3	380.51	\$ 64.51	\$ 24,546.70	0.00	416.30	\$ -	\$ 26,855.40	\$ -	\$ 26,855.40
7845 02	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO EN CEPAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍA PARA DRENAJE.	ML	183.70	\$ 41.22	\$ 7,572.11	0.00	183.70	\$ -	\$ 7,572.11	\$ -	\$ 7,572.11
1140 03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P.	HR	24.00	\$ 236.69	\$ 5,680.56	0.00	24.00	\$ -	\$ 5,680.56	\$ -	\$ 5,680.56
1130 02	PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR EN ZANÍAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA)	M3	14.97	\$ 468.74	\$ 7,017.04	0.00	14.70	\$ -	\$ 6,890.48	\$ -	\$ 6,890.48

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ

RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C: REGJ710922712

1 Y
FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

PERIODO EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21

HOJA: 2 DE 4

AVANCE FINANCIERO
FISICO 100.00%
100.00%

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO		AVANCES		IMPORTE	
						ANTERIOR	ESTE	ANTERIOR	ESTE	ANTERIOR	ESTE
8039A 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR USO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FÁBRICA, 12" DE DIÁMETRO.	ML	183.70	\$ 478.73	\$ 87,942.70	0.00	183.70	183.70	\$ -	\$ 87,942.70	\$ 87,942.70
PH-12"	REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL SANITARIO A UNA CARGA DE (0.5 kgf/cm ² , hidrostática, ó 0.3 kgf/cm ² , neumática) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	183.70	\$ 63.82	\$ 11,723.73	0.00	183.70	183.70	\$ -	\$ 11,723.73	\$ 11,723.73
CLF-130	RECONEXIÓN A LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 3,636.38	\$ 14,545.52	0.00	4.00	4.00	\$ -	\$ 14,545.52	\$ 14,545.52
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. (ACOSTILLADO DE ARENA).	M3	64.08	\$ 472.85	\$ 30,300.23	0.00	78.96	78.96	\$ -	\$ 37,336.24	\$ 37,336.24
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. (REOLITA).	M3	45.70	\$ 470.63	\$ 21,507.79	0.00	87.26	87.26	\$ -	\$ 41,067.17	\$ 41,067.17
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	134.41	\$ 117.26	\$ 15,760.92	0.00	164.86	164.86	\$ -	\$ 19,331.47	\$ 19,331.47
9000 05	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL.	M3	669.40	\$ 65.77	\$ 44,026.44	0.00	562.0100	562.01	\$ -	\$ 36,963.40	\$ 36,963.40

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C: REGJ710922712

1 Y

FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

PERIODO EST.: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21

HOJA: 3 DE 4

AVANCE

FINICIO FINANCIERO 100.00%

100.00%

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO		AVANCES		IMPORTES	
						ANTERIOR	ESTE	ANTERIOR	ESTE	ANTERIOR	ESTE
9002 05	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL IRO., DE MATERIALES PÉTRCOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL.	M3/KM	2677.60	\$ 14.14	\$ 37,861.26	0.00	2248.04	2248.04	\$ -	\$ 31,787.29	\$ 31,787.29
DE-SA	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERÍA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, AFINE DE TALUDES Y FONDO, PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE ARENA DE 15CM SOBRE EL LOMO DE TUBO, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO, TEE DE INSERCIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE 12", ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL.	PZA	25.00	\$ 4,144.88	\$ 103,622.00	0.00	22.00	22.00	\$ -	\$ 91,187.36	\$ 91,187.36
6005 01	REGISTRO DE TRANSICIÓN CON MURO DE TABICÓN DE CONCRETO 14 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 Y HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	25.00	\$ 3,429.55	\$ 85,738.75	0.00	22.00	22.00	\$ -	\$ 75,450.10	\$ 75,450.10
CO-TA	RECONEXIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON POLIDUCTO RD-9 Y UNIONES PLÁSTICAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ABRAZADERAS, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	12.00	\$ 186.66	\$ 2,239.92	0.00	12.00	12.00	\$ -	\$ 2,239.92	\$ 2,239.92
3006 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	1.00	\$ 11,593.54	\$ 11,593.54	0.00	1.00	1.00	\$ -	\$ 11,593.54	\$ 11,593.54

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNNDIZ CAMACHO

R.F.C: RECJ710922712

1 Y
FINIQUITO

NO. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE S.L.P.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

NO. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNNDIZ CAMACHO

PERIODO EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21

HOJA: 4 DE 4

AVANCE

FINISCO FINANCIERO

100.00% 100.00%

PRESUPUESTO DE CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO			AVANCES		
						ANTERIOR	ESTE	ACUMULADO	ANTERIOR	IMPORTE ESTE	ACUMULADO
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	2.00	\$ 12,793.30	\$ 25,586.60	0.00	2.00	2.00	\$ -	\$ 25,586.60	\$ 25,586.60
8027 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES DE PEAD PARA POZO DE VISITA CON REJILLA ABIERTA.	PZA	3.00	\$ 3,591.37	\$ 10,774.11	0.00	3.000	3.00	\$ -	\$ 10,774.11	\$ 10,774.11
C	PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO										
1003 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE COMPACTADA AL 95% DE SU PWSM POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE COLOCACIÓN, TENDIDO, PAPEO,	M3	59.76	\$ 746.66	\$ 44,620.40	0.00	57.11	57.11	\$ -	\$ 42,641.75	\$ 42,641.75
4090 05	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'c= 250 KG/CM2.	M2	298.82	\$ 486.99	\$ 145,522.35	0.00	285.57	285.57	\$ -	\$ 139,069.73	\$ 139,069.73
1000 10	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN A BASE DE ASFALTO OXIDADO	ML	554.14	\$ 40.65	\$ 22,525.79	0.00	527.13	527.13	\$ -	\$ 21,427.83	\$ 21,427.83
8898 23	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBROS.	M2	1607.38	\$ 11.20	\$ 18,002.66	0.00	1607.38	1607.38	\$ -	\$ 18,002.66	\$ 18,002.66
CONCEPTO FUERA DE CATALOGO											
IMPORTE DE CONTRATO SIN I.V.A.						\$ 825,777.75				\$ 811,285.35	\$ 811,285.35

JUAN CARLOS RESÉNNDIZ CAMACHO

CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ

RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO

R.F.C. REC/10922712

1 Y

FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO

FONDO:

PERIODO EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21

AVANCE FINANCIERO

100.00%

HQIA:

PRESUPUESTO DE CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		TOTAL EJECUTADO		1 DE 3	
						FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
A	ALCANTARILLADO SANITARIO										
1245 11	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE ESTABLECIENDO REFERENCIAS.	ML	183.70	\$ 15.46	2,840.00	183.70	2840.00	183.70	2840.00	\$ -	\$ -
1000 21	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.	ML	533.60	\$ 52.70	28,120.72	527.13	27779.75	527.13	27779.75	-\$ 6,070.00	-\$ 340.97
1000 05	RUPTURAR Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.	M3	46.01	\$ 166.55	7,662.97	42.84	7135.00	42.84	7135.00	-\$ 3.17	-\$ 527.97
9000 A5	ACARRIADO TER.M DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CAMIÓN DE VOLTEO. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA. TRANSITO NORMAL. INCLUYE CARGA.	M3	69.02	\$ 65.77	4,539.45	64.26	4226.38	64.26	4226.38	-\$ 4.76	-\$ 313.07
9002 A5	ACARRIADO KILOMETROS SUBSECUENTES AL TRO. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CAMIÓN DE VOLTEO. EN CAMINO ZONA URBANA. TRANSITO NORMAL.	M3/KM	276.06	\$ 14.14	3,903.49	257.04	3634.55	257.04	3634.55	-\$ 19.02	-\$ 268.94
1100 03	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO HUCA EN SECO, EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN CAMIÓN.	M3	380.51	\$ 64.51	24,546.70	416.30	26855.40	416.30	26855.40	\$ 35.79	\$ 2,308.70
7845 02	ARINE DE TALUDES Y FONDO A MANO EN CEPAS PARA AJUAMIENTO DE TUBERÍA PARA DRENAJE.	ML	183.70	\$ 41.22	7,572.11	183.70	7572.11	183.70	7572.11	\$ -	\$ -
1140 03	BOMBEO DE AGHQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P.	HR	24.00	\$ 236.69	5,680.56	24.00	5680.56	24.00	5680.56	\$ -	\$ -
1130 02	PLANTILLA ARIZONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA)	M3	14.97	\$ 468.74	7,017.04	14.70	6890.48	14.70	6890.48	-\$ 0.27	-\$ 126.56
8039A 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, 12" DE DIÁMETRO.	ML	183.70	\$ 478.73	87,942.70	183.70	87942.70	183.70	87942.70	\$ -	\$ -
PH-12"	REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL SANITARIO A UNA CARGA DE 10.5 kgf/cm ² , hidrostática, 6 0.3 kgf/cm ² , neumática), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	183.70	\$ 63.82	11,723.73	183.70	11723.73	183.70	11723.73	\$ -	\$ -
CLE-130	RECONEXIÓN A LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 3,636.38	14,545.52	4.00	14545.52	4.00	14545.52	\$ -	\$ -
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (ACOSTILLADO DE ARENA).	M3	64.08	\$ 472.85	30,300.23	78.96	37336.24	78.96	37336.24	\$ 14.88	\$ 7,036.01

JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ
RESIDENDE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C.: REC110922712

1 Y

FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

FONDO:

PERIODO EST.: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021.

FECHA: 13-abr-21

AVANCE FINANCIERO

100.00% FINANCIERO 100.00%

HOJA:

PRESUPUESTO DE CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		AVANCES		2 DE 3	
						FISCO	FINANCIERO	FISCO	FINANCIERO	FISCO	FINANCIERO
1131 06	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. (REOLUTA)	M3	45.70	\$ 470.63	21,507.79	87.26	41067.17	87.26	41067.17	\$ 41.56	\$ 19,559.38
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	134.41	\$ 117.26	15,760.92	164.86	19331.47	164.86	19331.47	\$ 30.45	\$ 3,570.55
9900 05	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	669.40	\$ 65.77	44,026.44	562.01	36963.40	562.01	36963.40	\$ 107.39	\$ 7,063.04
9900 05	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1RO., DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	2677.60	\$ 14.14	37,861.26	2,248.04	31787.29	2,248.04	31787.29	\$ 429.56	\$ 6,073.97
DE-5A	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", INCLUYE: EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, ARNE DE TALUDES Y FONDO, PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE ARENA DE 15CM SOBRE EL LOMO DE TUBO, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO, TEE DE INSERCIÓN, CONEXIÓN A TUBERIA DE 12", ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y LIMPIEZA GENERAL.	PZA	25.00	\$ 4,144.88	103,622.00	22.00	91187.36	22.00	91187.36	\$ 3.00	\$ 12,434.64
6005 01	REGISTRO DE TRANSICIÓN CON MURO DE TABICÓN DE CONCRETO 14 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO DE 6.40 X 0.60 Y HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	25.00	\$ 3,429.55	85,738.75	22.00	75450.10	22.00	75450.10	\$ 3.00	\$ 10,288.65
CO-TA	RECONEXIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON FOLIOCTO RD-9 Y UNIONES PLÁSTICAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ABRAZADERAS, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	12.00	\$ 186.66	2,239.92	12.00	2239.92	12.00	2239.92	\$ -	\$ -
3060 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	1.00	\$ 11,593.54	11,593.54	1.00	11593.54	1.00	11593.54	\$ -	\$ -
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	2.00	\$ 12,793.30	25,586.60	2.00	25586.60	2.00	25586.60	\$ -	\$ -
8017 04	SUMINISTRINO E INSTALACION DE BROCALES DE PEAD PARA POZO DE VISITA CON REJILLA ABIERTA.	PZA	3.00	\$ 3,591.37	10,774.11	3.00	10774.11	3.00	10774.11	\$ -	\$ -

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C: REC710922712

1 Y FINQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
 CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
 FONDO:
 PERIODO EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21
 AVANCE
 FINCIERO 100.00%
 FINANCIERO 100.00%
 HOJA:

PRESUPUESTO DE CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. 1		AVANCES		3 DE 3		
						FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	DIFERENCIAS
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.												
C	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO											
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE COMPACTADA AL 95% DE SU PYSM POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE COLOCACIÓN, TENDIDO, PAFEO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADA.	M3	59.76	\$ 746.66	44,520.40	57.11	42641.75	57.11	42641.75	-\$ 2.65	-\$ 1,978.65	
4030 05	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'c= 250 KG/CM2	M2	298.82	\$ 486.99	145,522.35	285.57	139069.73	285.57	139069.73	-\$ 13.25	-\$ 6,452.62	
1000 10	CAUFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN A BASE DE ASFALTO OXIDADO	M/L	554.14	\$ 40.65	22,525.79	527.13	21427.83	527.13	21427.83	-\$ 27.01	-\$ 1,097.96	
8898 23	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBROS.	M2	1607.38	\$ 11.20	18,002.66	1,607.38	18002.66	1,607.38	18002.66	\$ -	\$ -	
					IMPORTE DE CONTRATO S/I.V.A.	\$ 825,777.75	\$ 811,285.35	\$ 811,285.35	\$ 811,285.35	-\$ -	14,492.40	
					I.V.A. (16%)	\$ 132,124.44	\$ 129,805.66	\$ 129,805.66	\$ 129,805.66	-\$ -	2,318.78	
					IMPORTE DE CONTRATO C/I.V.A.	\$ 957,902.19	\$ 941,091.01	\$ 941,091.01	\$ 941,091.01	-\$ -	16,811.18	

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

1 Y
FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

FECHA: 13-abr-21

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

FONDO:



AVANCE
FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%

No. ESTIMACION


PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

HOJA:

REPORTE FOTOGRAFICO

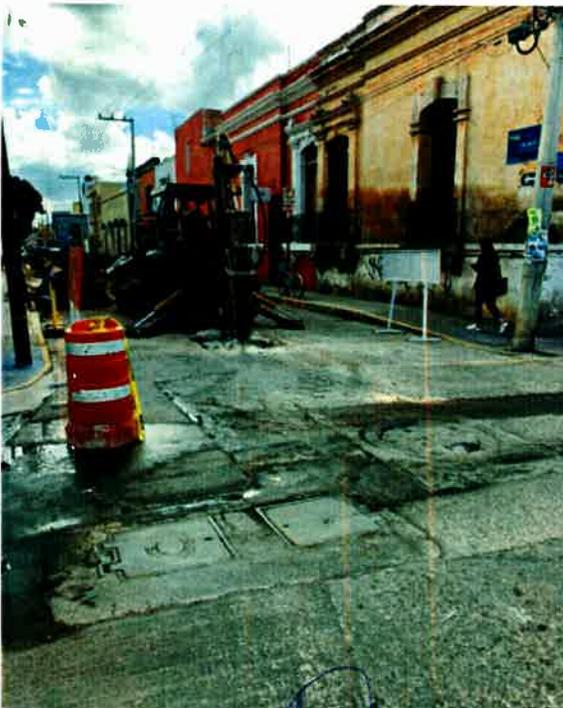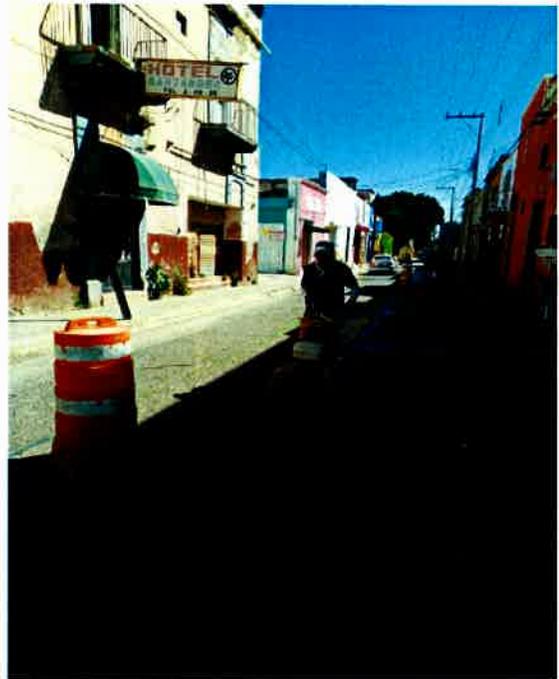


JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA


ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

1 Y
FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
FONDO:
PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21
AVANCE
FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%
HOJA:

REPORTE FOTOGRAFICO



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

1 Y
FINIQUITO



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
FONDO:

FECHA: 13-abr-21
AVANCE
FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%
HOJA:

No. ESTIMACION

PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

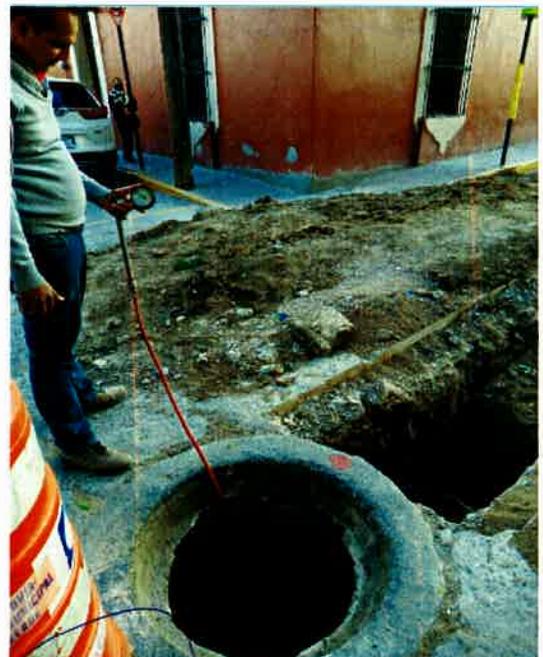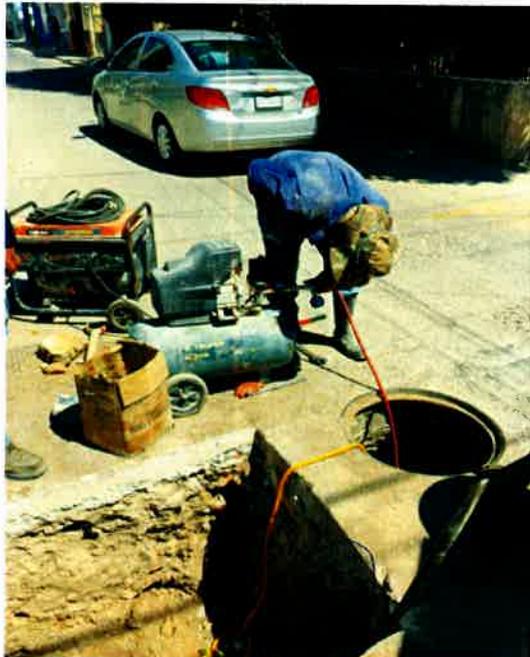

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

1 Y
FINIQUITO



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
FONDO:

FECHA: 13-abr-21
AVANCE
FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%
HOJA:

No. ESTIMACION

PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

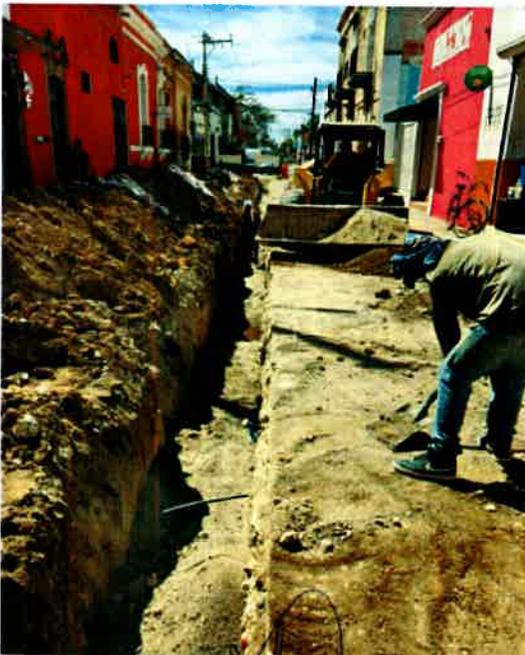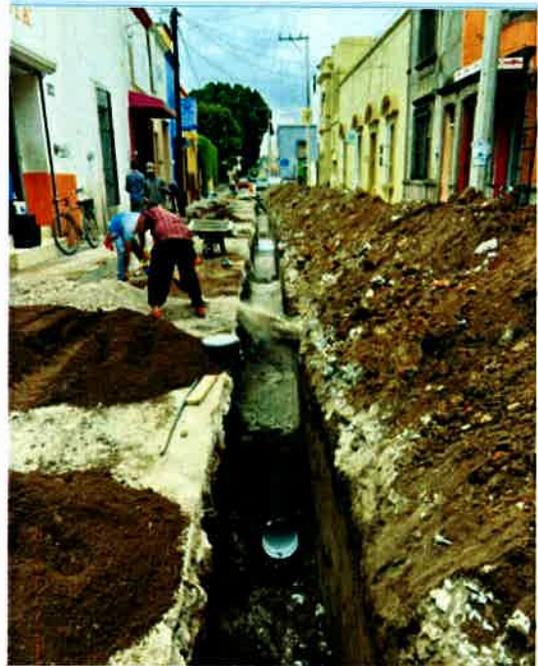

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

1 Y
FINIQUITO


OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
FONDO:

FECHA: 13-abr-21
AVANCE
FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%
HOJA:

No. ESTIMACION

PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

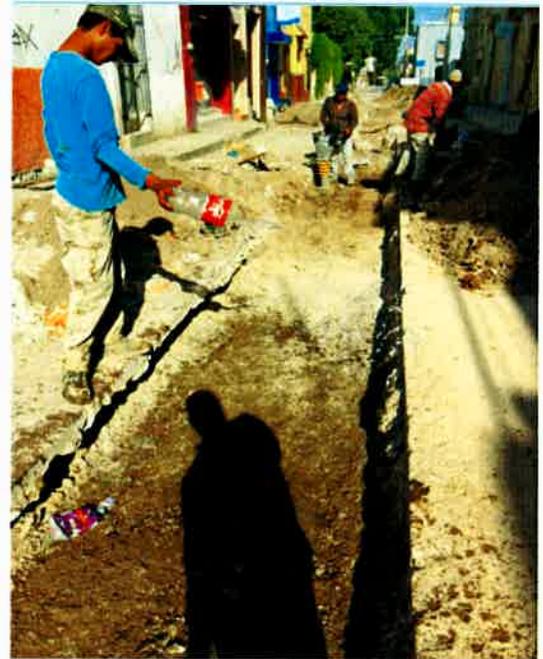

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

1 Y
FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

FONDO:

PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21

AVANCE

FISICO


100.00%

FINANCIERO


100.00%

HOJA:

REPORTE FOTOGRAFICO

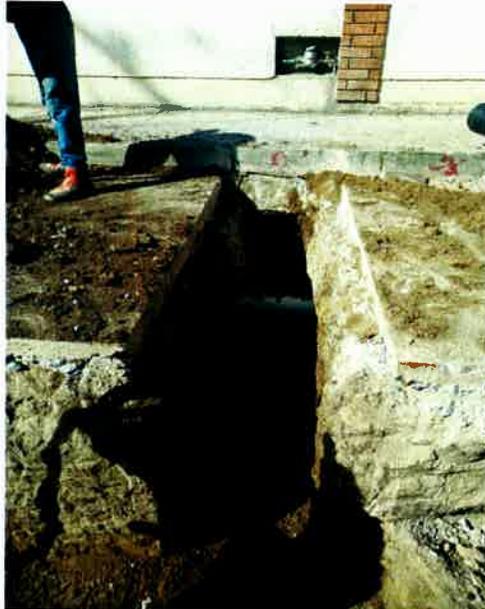


JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA


ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

**1 Y
FINIQUITO**




No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
FONDO:

PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21
AVANCE
FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%
HOJA:

REPORTE FOTOGRAFICO

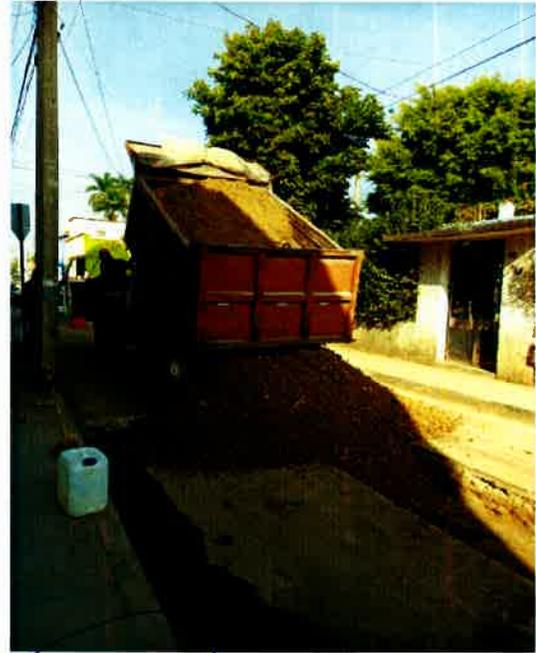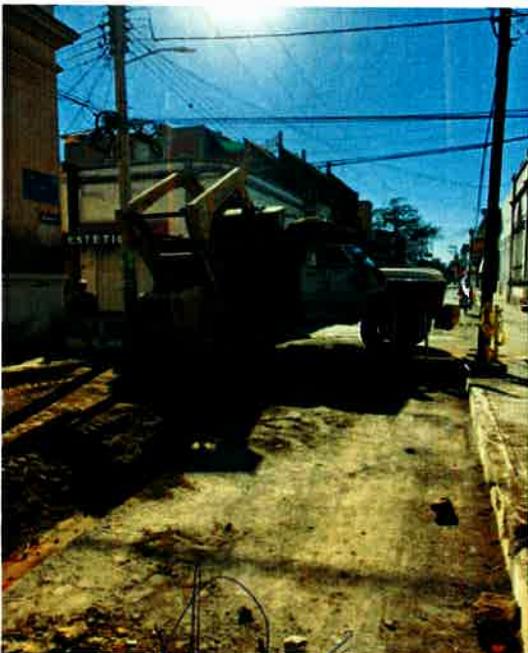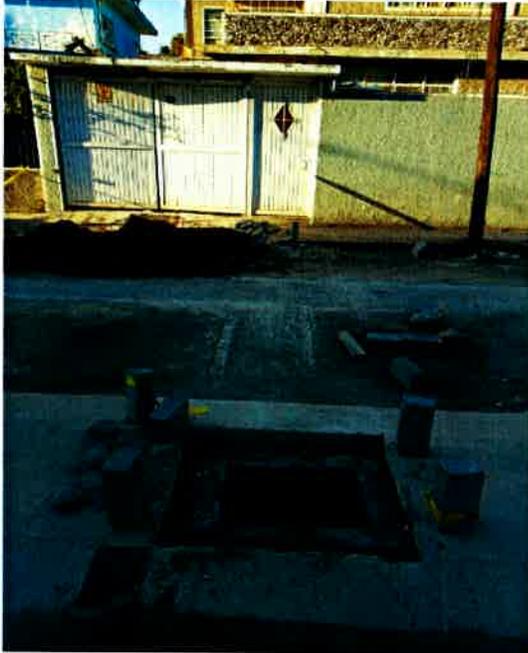

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA


**1 Y
FINIQUITO**

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
FONDO:
PERIODO DE EST: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21
AVANCE
FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%
HOJA:

REPORTE FOTOGRAFICO

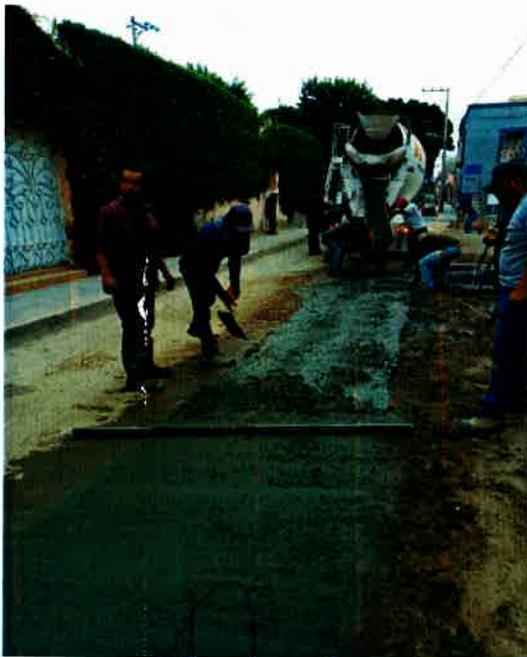

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C: REC710922712

1 Y FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

FECHA: 13-abr-21

No. ESTIMACION

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
 CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
 PERIODO DE ESTIMACION: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

HOJA 1 DE 4

GENERADORES DE OBRA

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					TOTAL	
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA			
REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES.										
1245 11	TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE DRENAJE		0+000-0+183.70							183.7 ML
1000 21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO		0+000-0+183.70							527.13 ML
1000 05	RUPTURAS Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS		0+000-0+183.70		Sup. =	285.57	x	0.15		42.84 M3
9000 A5	ACARRICO 1ER KM. DE MATERIAL. PRODUCTO DE DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA, TRANSITO NORMAL, INCLUIVE CARGA.		0+000-0+183.70		VOL DEMOLICION =	42.84		X 1.5 ABUND.		64.26 M3
9002 A5	ACARRICO KILOMETROS SUBSECUENTES AL 1RO. DE MATERIAL. PRODUCTO DE DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO ZONA URBANA, TRANSITO NORMAL.		0+000-0+183.70		IGUALA =	64.26	X	4		257.04 M3
1100 03	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA EN SECO, EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN CAMION.		0+000-0+183.70		SE ANEXA CUADRO AUXILIAR DE NUMEROS GENERADORES					416.30 M3
7845 02	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO EN CEPAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA PARA DRENAJE		0+000-0+183.70		183.7					183.70 ML
1140 03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIAMETRO Y 12 H.P.		SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2021							24.00 HRS
1130 02	PLANTILLA APRONADA AL 85% PROCCION EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA)		0+000-0+183.70		183.7		0.80	0.1		14.70 M3

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
 CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ
 RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C: REC1710922712

1 Y FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

FECHA: 13-abr-21

No. ESTIMACION

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
PERIODO DE ESTIMACION: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

HOJA 2 DE 4

GENERADORES DE OBRA

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	
8039A 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR USO. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FÁBRICA, 12" DE DIÁMETRO.		0+000-0+183.70	183.7			183.70 ML
PH-12"	REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL SANITARIO A UNA CARGA DE 0.5 kgf/cm ² , hidrostática, y 0.3 kgf/cm ² , neumática), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		0+000-0+183.70	183.7			183.70 ML
CLE-130	RECONEXIÓN A LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		0+000-0+183.70				4.00 PZA
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. (ACOSTILLADO DE ARENA).		0+000-0+183.70				78.96 M3
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. (REOLTA).		0+000-0+183.70				87.26 M3
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.		0+000-0+183.70				164.86 M3
9000 05	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.		0+000-0+183.70				562.01 M3
9002 05	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1RO. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.		0+000-0+183.70				2,248.04 M3

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C.: REC1710922712

1 Y FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
 CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
 PERIODO DE ESTIMACION: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 13-abr-21

HOJA 3 DE 4

GENERADORES DE OBRA

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	
DE-SA	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", INCLUIE: EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, ARME DE TALUDES Y FONDO, PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE ARENA DE 15CM SOBRE EL LOMO DE TURBO, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO, TEE DE INSERCIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE 12",	LADO	CAD.		LADO	CAD.	22.00 PZA
		NORTE	0+008.5		SUR	0+052.2	
		NORTE	0+026.2		SUR	0+057.7	
		NORTE	0+054.15		SUR	0+070.20	
		NORTE	0+058.6		SUR	0+094.5	
		NORTE	0+092.7		SUR	0+107.0	
		NORTE	0+118.6		SUR	0+107.4	
		NORTE	0+128.9		SUR	0+117.1	
		NORTE	0+144.1		SUR	0+139.8	
		SUR	0+169.6		SUR	0+141.20	
		SUR	0+028.6		SUR	0+156.0	
		SUR	0+033.2		SUR	0+178.30	
6005 01	REGISTRO DE TRANSICIÓN CON MURO DE TABICÓN DE CONCRETO 14 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE HIERRO DE 0.40 X 0.60 Y HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	NORTE	0+008.5		SUR	0+052.2	
		NORTE	0+026.2		SUR	0+057.7	
		NORTE	0+054.15		SUR	0+070.20	
		NORTE	0+058.6		SUR	0+094.5	
		NORTE	0+092.7		SUR	0+107.0	
		NORTE	0+118.6		SUR	0+107.4	
		NORTE	0+128.9		SUR	0+117.1	
		NORTE	0+144.1		SUR	0+139.8	
		SUR	0+169.6		SUR	0+141.20	
		SUR	0+028.6		SUR	0+156.0	
		SUR	0+033.2		SUR	0+178.30	
							22.00 PZA

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO
 CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
 RESIDENTE DE OBRA



JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

R.F.C: RECJ710922712

1 Y FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

FECHA: 13-abr-21

No. ESTIMACION

PERIODO DE ESTIMACION: 19 DE FEBRERO A 13 DE ABRIL DE 2021

HOJA 4 DE 4

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

GENERADORES DE OBRA

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	
CO-TA	RECONEXIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON BOLDUCTO RD-9 Y UNIONES PLÁSTICAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ABRAZADERAS, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		0+000-0+183.70				12.00 PZAS
3060 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD.		0+000-0+183.70	EN CADENAMIENTO	0+134.80		1.00 PZA
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.		0+000-0+183.70	EN CADENAMIENTO	0+042.95 Y 0+183.70		2.00 PZA
8017 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES DE PEAD PARA POZO DE VISITA CON REJILLA ABIERTA.		0+000-0+183.70	0+042.95, 0+134.80 Y 0+183.70			3.00 PZAS
C	PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO						
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE COMPACTADA AL 95% DE SU PSM POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE COLOCACION, TENDIDO, PASEO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADA.		0+000-0+183.70	285.57	X	0.20M ESPESOR	57.11 M3
4030 05	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F=C= 250 KG/CM2.		0+000-0+183.70	SE ANEXA CROQUIS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO			285.57 M2
DZA19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y CONFORMACION.		0+000-0+183.70	183.7	X	8.75	1,607.38 M2

JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

CONTRATISTA

ING. SALVADOR ALJANDRO ALVAREZ MÉNDEZ


RESIDENTE DE OBRA

PLAN A



CALLE 5 DE MAYO (TRAMO MOCTEZUMA A REYES)




DETALLE DE DESCARGA



DETALLE DE LA ZANJA TIPO PARA DESCARGA DOMICILIARIA




PERFIL

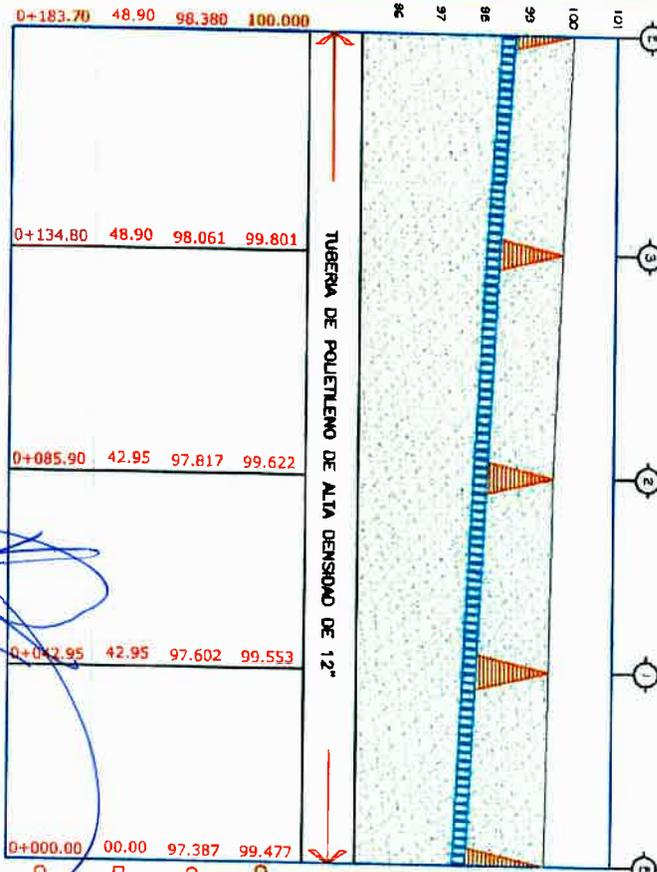


ZANJA TIPO



DETALLE DE REGISTRO SOBRE BANQUETA SIN ESCALA

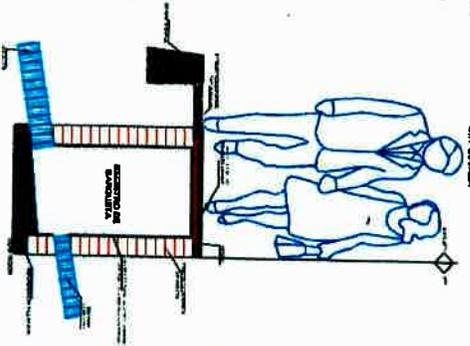


POZO DE VISITA COMUN

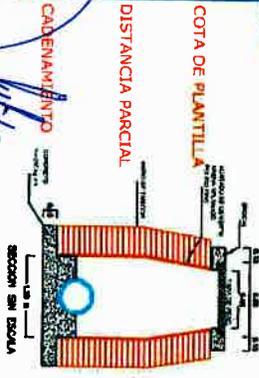

COTA DE BIROCAL
COTA DE PLANTILLA
DISTANCIA PARCIAL
CADENAMIENTO

0+183.70	48.90	98.380	100.000
0+134.80	48.90	98.061	99.801
0+085.90	42.95	97.817	99.622
0+032.95	42.95	97.602	99.553
0+000.00	00.00	97.387	99.477

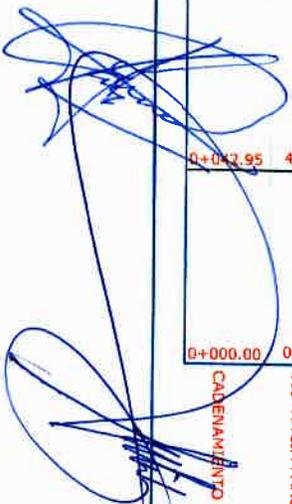

CONSTITUYENTES

PROYECTO S.T.P.

DATOS DE PROYECTO

Nombre del Proyecto: ...

Ubicación: ...

Fecha de Ejecución: ...

Escala: ...

Proyecto: ...

Autores: ...

Revisado: ...

Aprobado: ...

SEMIOLOGIA

— Línea de alcantarillado

— Línea de agua

— Línea de gas

— Línea de electricidad

— Línea de telefonía

— Línea de cable de fibra óptica

— Línea de drenaje

— Línea de riego

— Línea de irrigación

— Línea de saneamiento

— Línea de alcantarillado

— Línea de agua

— Línea de gas

— Línea de electricidad

— Línea de telefonía

— Línea de cable de fibra óptica

— Línea de drenaje

— Línea de riego

— Línea de irrigación

— Línea de saneamiento

NOTAS

1. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
2. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
3. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
4. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
5. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
6. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
7. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
8. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
9. Se debe mantener la zona de protección de la obra.
10. Se debe mantener la zona de protección de la obra.

REVISOR

Nombre: ...


Fecha: ...

PROYECTANTE


Nombre: ...

Fecha: ...

P L A N T A
CALLE 5 DE MAYO (TRAMO MOCTEZUMA A REYES)

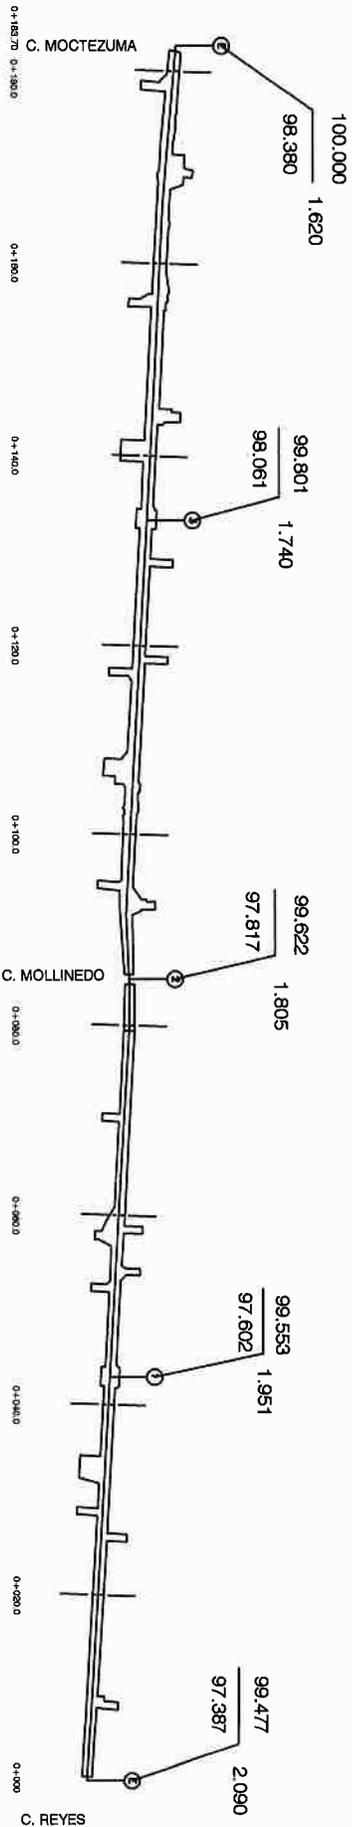

PERFIL DE PAVIMENTO Y PLANTILLA DE LÍNEA DE DRENAJE

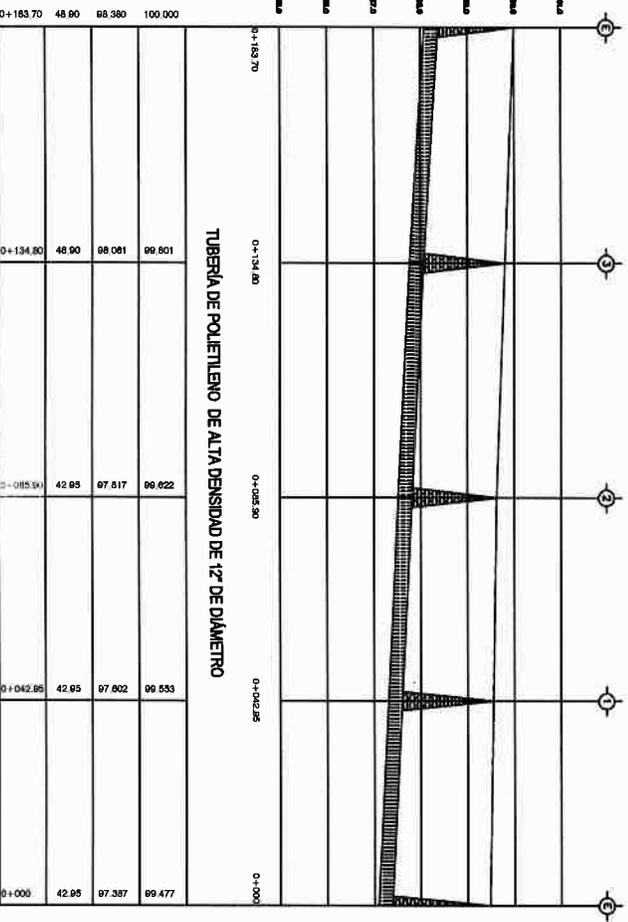

ESTACION	COTA DE BROCAL	COTA DE PLANTILLA	DISTANCIA PARCIAL	CADENAMIENTO
0+163.70	99.801	96.622		
0+134.80	48.90	97.602	42.95	
0+085.50	42.95	97.602	42.95	
0+000	42.95	97.387	42.95	

[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVERDE S.L.P.

PROYECTO: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE MAYO DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE REYES


PLANO: **PLANTA Y PERFIL DEFINITIVOS.**

COORDINADOR: CABECERA MUNICIPAL	PROYECTISTA: ING. SALVADOR A. ALVAREZ MENDOZA	CRUCADO: ING. J. SAMUEL VILLEDA SANCHEZ	FECHA: 1-1
FECHA: 1-1	PROYECTISTA: RIVERDE, S.L.P., Abril 2021	CRUCADO: 1-100	FECHA: JUN/2021


[Handwritten signature]

P L A N T A

CALLE 5 DE MAYO (TRAMO MOCTEZUMA A REYES)

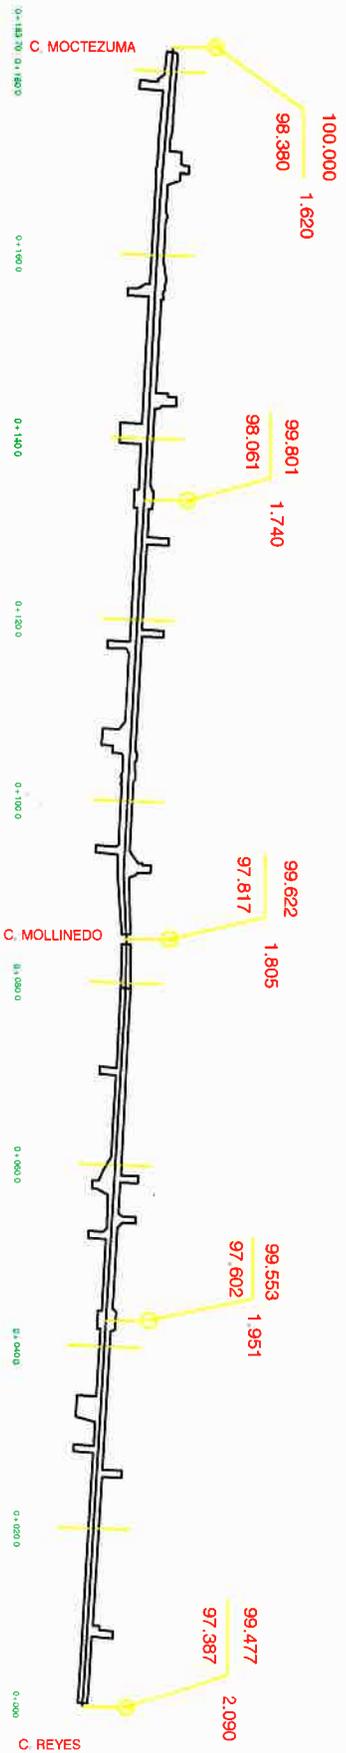

PERFIL DE PAVIMENTO Y PLANTILLA DE LÍNEA DE DRENAJE

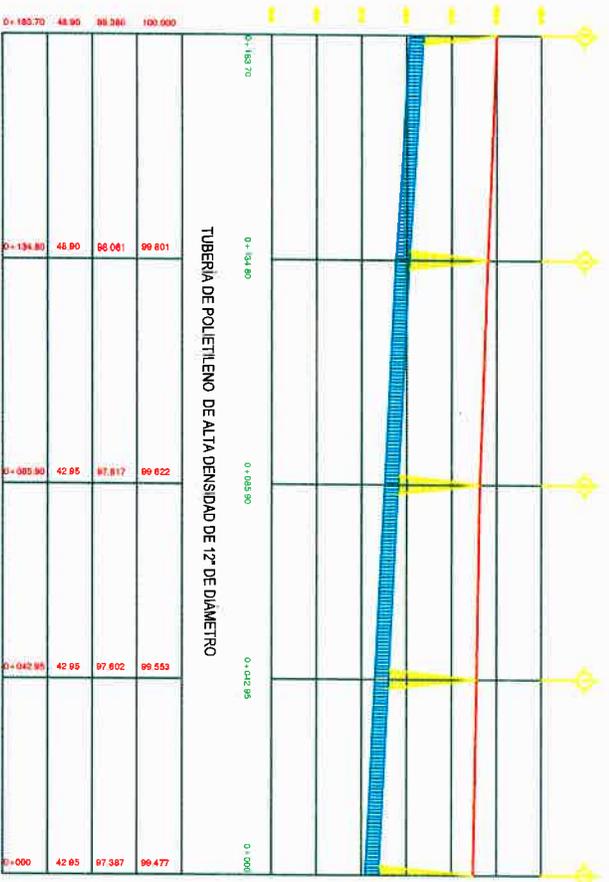

0+143.70	48.90	98.380	100.000
0+134.80	48.90	98.061	99.801
0+085.90	42.95	97.817	99.622
0+042.95	42.95	97.602	99.553
0+000.0	42.95	97.387	99.477

COTA DE BROCAL
 COTA DE PLANTILLA
 DISTANCIA PARCIAL
 CADENAMIENTO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE REYES

PLANTA Y PERFIL DEFINITIVOS

PROYECTO	CLIENTE	AUTORIA	FECHA
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE REYES	MUNICIPIO DE RIOVERDE	ING. SALVADOR A. ALVAREZ MENDOZA	11/04/2021
PROYECTO	CLIENTE	AUTORIA	FECHA
PLANTA Y PERFIL DEFINITIVOS	MUNICIPIO DE RIOVERDE	ING. J. SAMUEL VALDEA SANCHEZ	15/05/2021
ESCALA	FECHA	FECHA	FECHA
1-1	11/04/2021	15/05/2021	15/05/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES"
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDEZ CAMACHO

FECHA: 13 de abril de 2021


COMPACTACION DE CAPAS EN CEPAS DE LÍNEA DE DRENAJE

Fecha del sondeo	Capa/ Material	No. Cala	Ubicación	Espesor del sondeo (cm)	Tara + mat	Tara + mat seco	W mat. seco	ω en el lugar	Arena inicial	Cono arena	Arena final	W arena en la cala	Y arena	Vol. Cala (cm ³)	W mat. Hum.	Y mat. hum.	Y mat. seco	Y max. Proctor Estandar	Grado de compactación (%)
					(gr)	(gr)	(gr)	(%)	(gr)	(gr)	(gr)	(gr)	(Kg/m ³)	(cm ³)	(gr)	(Kg/m ³)	(Kg/m ³)	(Kg/m ³)	(Kg/m ³)
CAPA DE MATERIAL DE BANCO																			
27-feb-21	Riolita	1	0+020	20	139.40	136.50	116.14	2.5%	5000.0	1380.0	1420.0	2200.0	1340.0	1641.8	2610.0	1589.7	1551.0	1810.0	85.7%
27-feb-21	Riolita	2	0+055	20	177.30	172.50	172.50	2.8%	5000.0	1380.0	1380.0	2240.0	1340.0	1671.6	2690.0	1609.2	1565.6	1810.0	86.5%
18-mar-21	Riolita	3	0+110	20	161.10	149.80	149.80	7.5%	5000.0	1380.0	1270.0	2350.0	1340.0	1733.7	3010.0	1716.3	1596.0	1810.0	88.2%
19-mar-21	Riolita	4	0+160	20	156.30	148.20	127.84	6.3%	5000.0	1380.0	940.0	2680.0	1340.0	2000.0	3370.0	1685.0	1584.6	1810.0	87.5%

CAPA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN																			
03-mar-21	Última	5	0+010	20	168.10	161.50	141.14	4.7%	5000.0	1380.0	1510.0	2110.0	1340.0	1574.6	2720.0	1727.4	1650.2	1720.0	95.9%
03-mar-21	Última	6	0+075	20	149.70	142.20	142.20	5.3%	5000.0	1380.0	960.0	2660.0	1340.0	1985.1	3470.0	1748.0	1660.5	1720.0	96.5%
25-mar-21	Última	7	0+160	20	160.20	154.80	134.44	4.0%	5000.0	1380.0	1240.0	2380.0	1340.0	1776.1	3050.0	1717.2	1650.9	1720.0	96.0%
26-mar-21	Última	8	0+100	20	152.10	148.20	148.20	2.6%	5000.0	1380.0	1360.0	2260.0	1340.0	1686.6	2930.0	1737.3	1692.7	1720.0	98.4%


CAPA DE MATERIAL BASE HIDRÁULICA																			
06-mar-21	BASE	9	0+016	20	161.90	152.60	152.60	6.1%	5000.0	1380.0	1350.0	2270.0	1340.0	1694.0	3850.0	2272.7	2142.1	2250.0	95.2%
06-mar-21	BASE	10	0+064	20	159.70	150.30	150.30	6.3%	5000.0	1380.0	1460.0	2160.0	1340.0	1611.9	3760.0	2332.6	2195.3	2250.0	97.6%
02-abr-21	BASE	11	DESCARG.	20	155.70	147.30	147.30	5.7%	5000.0	1380.0	1540.0	2080.0	1340.0	1552.2	3640.0	2345.0	2218.5	2250.0	98.6%
02-abr-21	BASE	12	0+090	20	141.90	132.60	132.60	7.0%	5000.0	1380.0	1150.0	2470.0	1340.0	1843.3	4300.0	2332.8	2179.9	2250.0	96.9%

Notas:
La ubicación de las calas fueron determinadas mediante el procedimiento de números aleatorios que dicta la norma correspondiente.
Comentarios:
Los porcentajes de compactación cumplen con el mínimo requerido en el proyecto, comparados a sus PVSM Asfalto estandar y modificado correspondientes.


 REVISÓ Y APROBO
 Ing. Josue Samuel Villeda
 Responsable Técnico
 Ced.P. J.C. : 8148393
 Ced.P. M.I : 5676320

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REVES"
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO

REPORTE FOTOGRAFICO

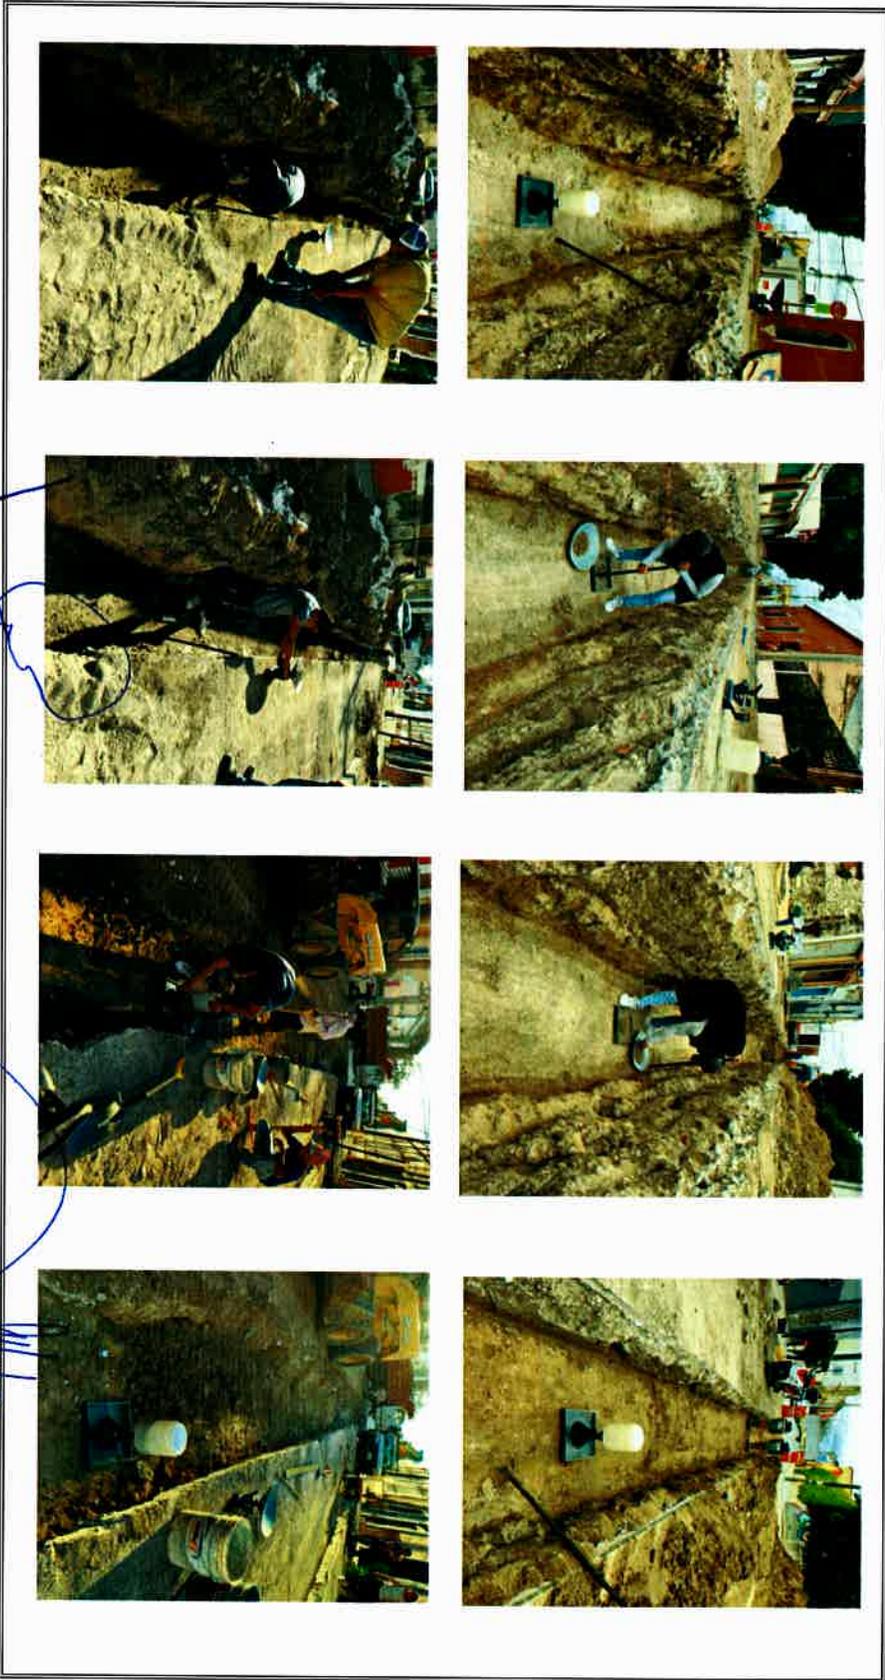


REVISO Y APROBO
Ing. Josué Samuel Villeda
Responsable Técnico.
Ced. P. I.C. : 81.48393
Ced. P. M.I. : 5676320

**OBTENCIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN EN CAMPO
NIT-SCT-IM-MIMP-4-01-011**

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES"
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.
No. CONTRATO: SASAR-OP-01-2021
CONTRATISTA: JUAN CARLOS RESÉNDIZ CAMACHO

FECHA: 13 de abril de 2021

COMPACTACIONES BASE HIDRÁULICA

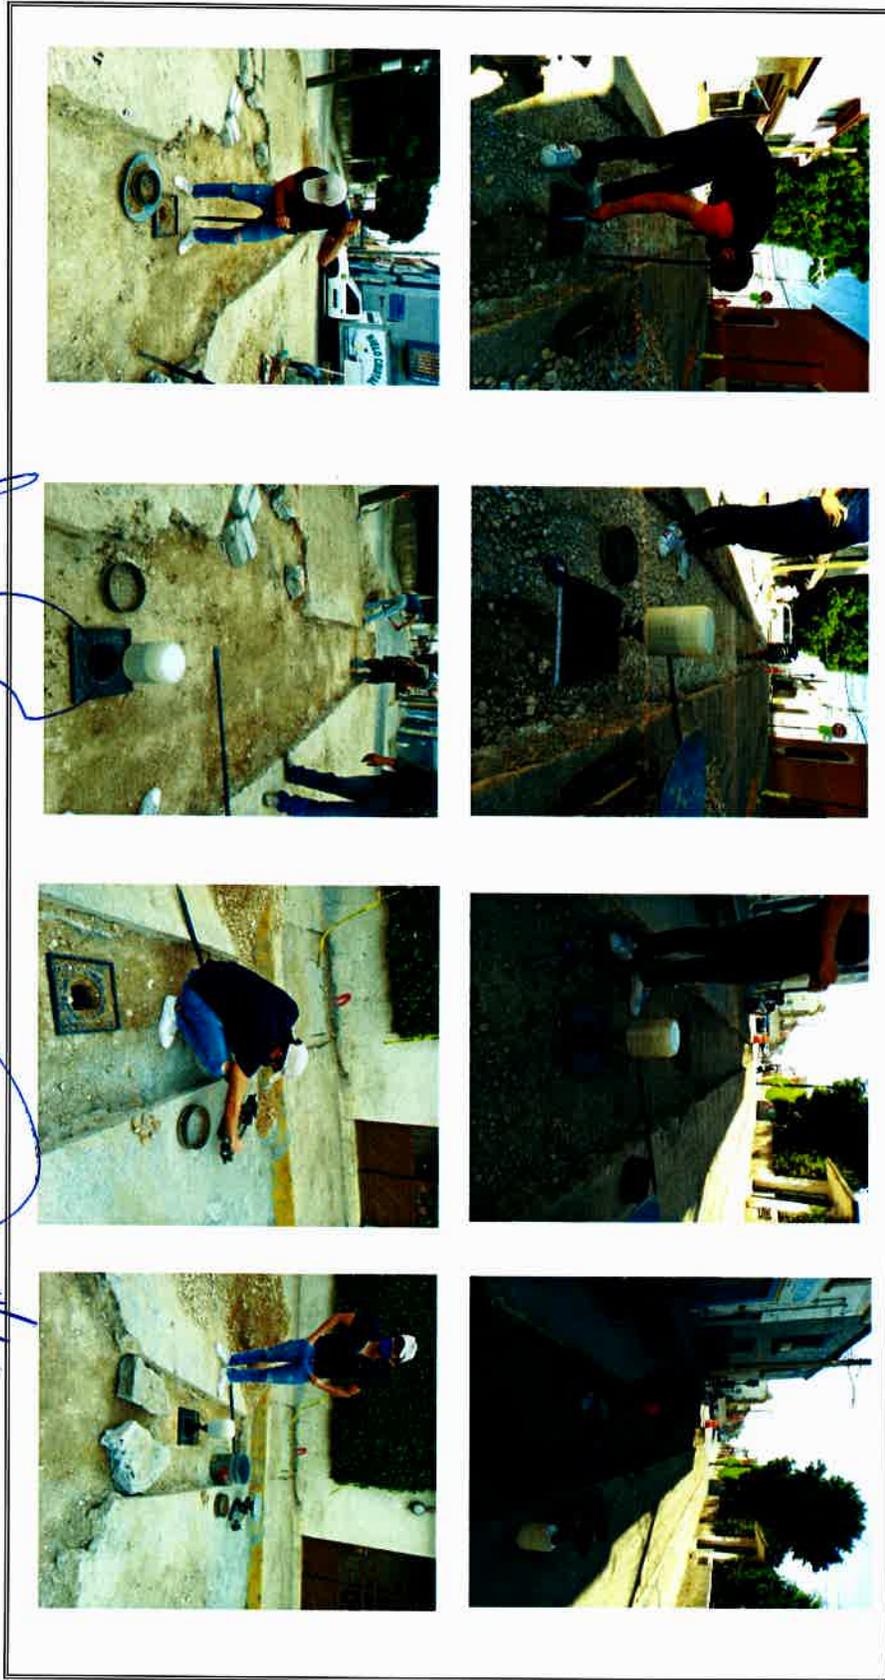

REVISÓ Y APROBÓ

Ing. Joshua Samuel Villalada
Responsable Técnico,
Ced.P. I.C.: 81488393
Ced.P. M.I.: 56768320

FRANCISCO I. MENDOZA SUR No. 713. COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
TELÉFONO (487)8791036. CEL. (6147)614036 villalad@j@gmail.com

ASUNTO: TERMINO DE OBRA.

RIOVERDE, S.L.P. A 13 DE ABRIL DE 2021

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES.

ENCARGADO DE DESPACHO.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO
DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

PRESENTE:

AT'N: ING. SALVADOR ALEJANDRO ÁLVAREZ MÉNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA
SASAR.


Por medio de la presente y con relación a la obra: **REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES” UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.”**, mediante el contrato SASAR-OP-01-2021 de fecha 20 de Febrero de 2021.

Me permito comunicarle que con esta fecha los trabajos han sido concluidos al 100%

Por lo anterior, solicito tenga a bien a autorizar los trámites administrativos necesarios para dar por recibida la obra y proceder a la liquidación del contrato y finiquito.

Atentamente

C. Juan Carlos Reséndiz Camacho



PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 13 de Abril de 2021

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

ANTE: EL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

PARA GARANTIZAR POR: C. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO, CON DOMICILIO EN: CALLE AV. UNIVERSIDAD No. 305, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P., C.P. 79617, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RECJ7109227I2. LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR, DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. SASAR-OP-01-2021, de fecha 20 DE FEBRERO DE 2021. que celebran por una parte EL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P., y por otra C. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO relativo a la realización de los trabajos consistentes en: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. ZONA CENTRO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$941,091.01 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, la cantidad a garantizar es el 10% del total que corresponde a la cantidad de \$94,109.10 (NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS 10/100 m.n.) INCLUYE I.V.A., ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE EL DIA 13 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022, FECHA EN LA QUE QUEDARA CANCELADA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA ASEGURADORA QUE LA EXPIDE, EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, acepta expresamente someterse al procedimiento establecido por los artículos 279, 282, 291 Y 178, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



MANUEL CARDENAS CAMPOS

T:06AM-nl:HS6Cn+-Y:2m10F7J0z:luebsvLQWOUpaYzWfDSYF2qMYKNN+cL6LKWVW5G62YveWmVndDIO2RZ95NivxIK5Ab0vct7455G6z72MH9E7dMEABDMRVp2V9w02IOYAPwAAAY-HLZHSILSLSrskKvUJPEU123eAF8:PKUUNINGzpqQ1Y
 E:ubal1bc-Ci:Pr3kkmVWT4WY5wDntzKkHDC70BONgXwSOKX7hsfcmV72c2Vw/4A+fcol.VXOjgeicmGlgZEez07Ly/xqW049JzdzQmXOeh3PZ-iglBOU7Zkz9h08ed2j7xFlHP3amkXVYvz6IA==
 Serie Certificado: 00000100009900011903, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

**LÍNEA DE VALIDACIÓN
A1ED 3XUN 21**



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Rioverde, S. L. P., A14 DE ABRIL DE 2021.

ASUNTO: RECEPCIÓN DE OBRA.

**C. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO.
CONTRATISTA.
PRESENTE:**

ACUSE

Por medio del presente me permito informar en relación a los trabajos que consisten en la "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" bajo número de contrato No.SASAR-OP-01-2021, en el cual su monto real ejecutado fue de \$ 941,091.01 PESOS (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.), dichos trabajos han sido valorados físicamente por el residente de obra: **Ing. Salvador Alejandro Álvarez Méndez**, encontrándose concluida el cien por ciento, de acuerdo a los lineamientos que le fueron solicitados en el proyecto.

Por tal motivo le solicito sea entregada ante esta dependencia **LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS** equivalente al **10%** del monto total ejercido y a una vigencia de **18 meses** como se estableció en el contrato, esto con la finalidad de dar continuidad al procedimiento antes mencionada y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Dicha fianza deberá estar elaborada con fecha: **13 DE ABRIL DE 2021.**

Así mismo le manifiesto que las fianzas de cumplimiento del contrato citado quedan liberadas al momento de entregar la garantía de vicios ocultos la cual permanecerá como garantía de los trabajos.

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE:


C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES.
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO OPERADOR.



RECIBI:

29/ABRIL/2021

c.c.p. Archivo.

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMPECEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

RIOVERDE, S. L. P., A 27 DE ABRIL DE 2021.

ACUSE

**A QUIEN CORRESPONDA.
PRESENTE:**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO BAJO CONTRATO NO. **SASAR-OP-01-2021**, CORRESPONDENCIA A LOS COMPROMISOS QUE CONSISTENTES DE LA "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES" MANIFIESTO QUE DESDE EL INICIO DEL CONTRATO Y HASTA LA FECHA NO SE HA DADO NINGÚN TIPO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADOS DEL INSTRUMENTO ANTES CITADO, POR PARTE DEL CONTRATISTA:

C. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO.

SIN MÁS DE MOMENTO ENVÍO UN AFECTUOSO SALUDO Y QUEDO A SU ENTERA DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O CLORACIÓN.

ATENTAMENTE

JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES.
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO OPERADOR.
DIRECCIÓN GENERAL



Recibí:
[Handwritten signature]
27/Abr/2021

C.C.P - ARCHIVO.
