

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CODORNICES ESTE DIA SE DEFINIERON LOS EJES DE REFERENCIA Y SE MARCARON NIVELTAS DE REFERENCIA PARA EL TRAZO Y NIVELACION PARA EL DESPLANTE DE LA GUARNICION PERIMETRAL ESTO PARA DEFINIR EL AREA EN DONDE

CROQUIS:

SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTA OBRA.

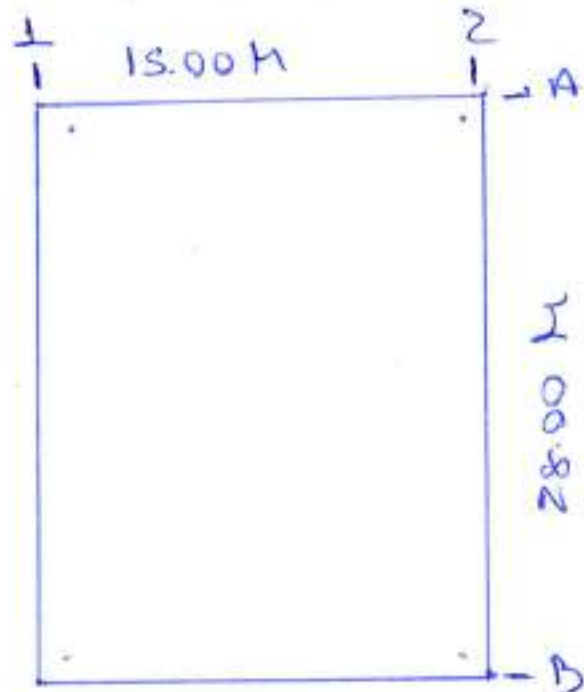

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTE DIA SE REALIZAN TRABAJOS DE FORZADO DE GUARNICION DE CONCRETO $F_c 150^{kg/cm^2}$ DE SECCION TRAPEZOIDAL DE $15 \times 20 \times 40$ CMS ESTO EN EL EJE (2-A-B) ADEMAS EN EL EJE (1-A-B) SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE ZUNZA ESTO PARA ALOJAR LA GUARNICION

CROQUIS:

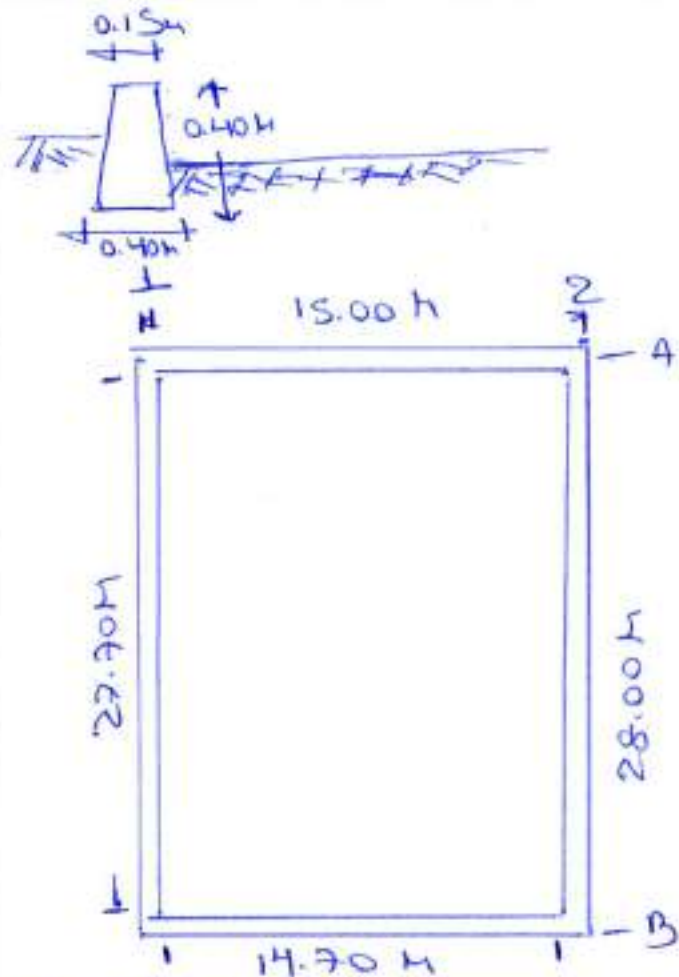

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO BASE HIDRAULICA, LA CUAL SE COMPACTA POR MEDIOS MECANICOS (BOIMABINA) EN CADA DE 20 CMS, ESTO EN EL AREA DEFINIDA CON LA QUENCION DE CONCRETOS

CROQUIS:

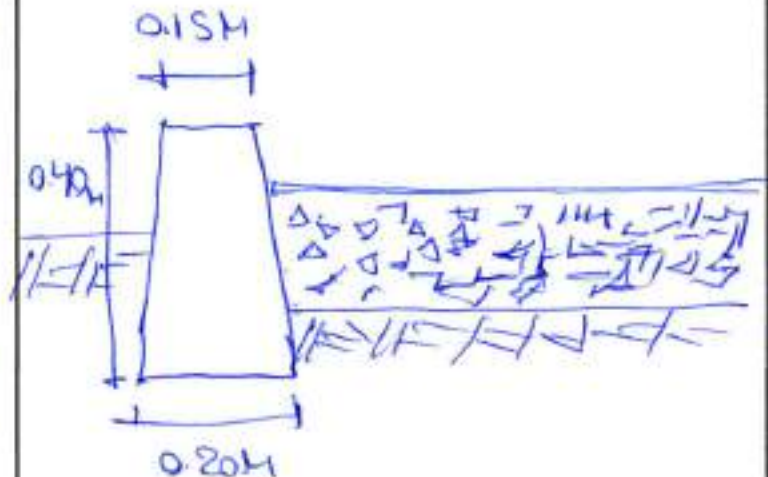

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EL DIA DE HOY SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA HAGILITAR EL PISO DE 10CMS DE ESPESOR EN DONDE SE COLOCA MALLA PARA PISO 6-6-10-10 PARA REFORZAR EN DONDE SE APLICA UN ACABADO FINO PULIDO

CROQUIS:

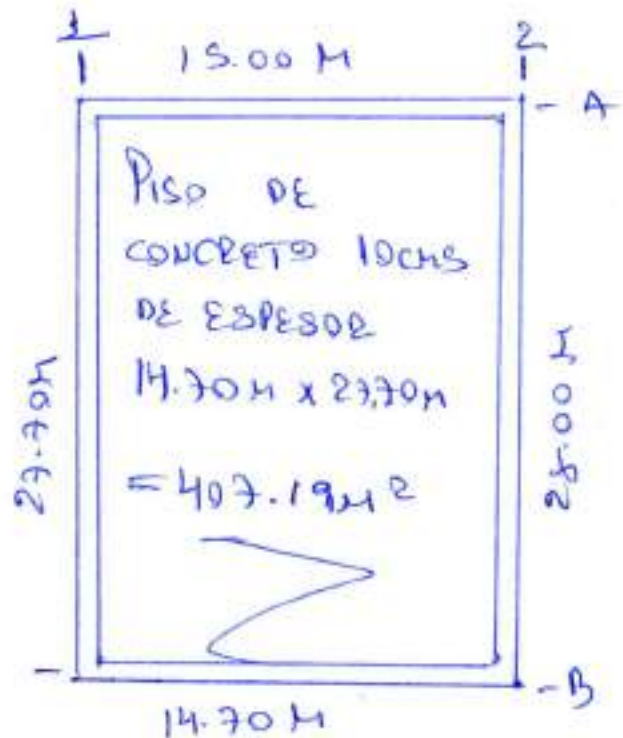

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE REALIZAN CORTES CON CORTADORA PARA JUNTAS FRIAS LAS CUALES SE SELLAN CON COCA DE PATA Y SELLADOR

CROQUIS:

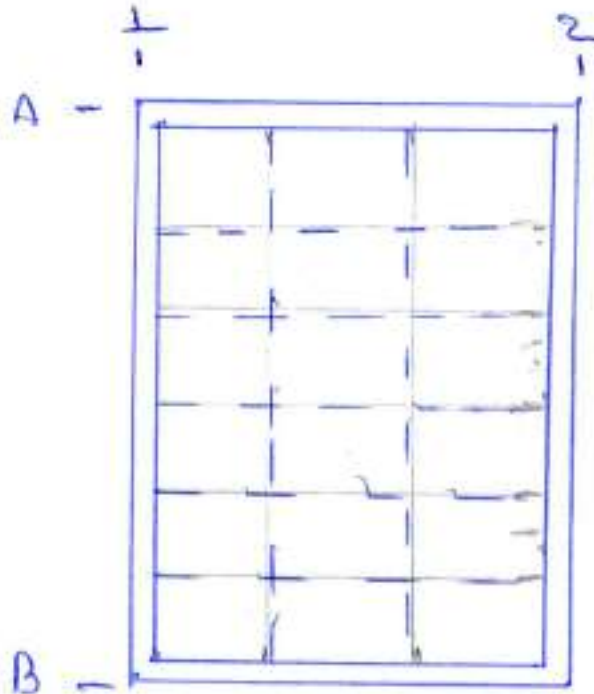

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RIVERA MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

EN ESTA FECHA SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL EL CUAL ESTA HABILITADO CON TUBO DE DIAMETRO DE 3" CEDA 40 ADEMAS SE SUMINISTRAN Y COLOCAN LOS TABLES DE POLICARBONATO DE 12MM DE ESPESOR DE MEDIDAS 1.20M x 1.80M

CON UN MARCO DE ANCHO DE 1x1 —



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

SE REALIZO EL TRAZO DE LINEAS PARA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL ESTAS LINEAS TIENEN UN ANCHO DE 5 CENTIMETROS TAMBIEN YA ESTAN SUMINISTRADOS 2 POSTES DE 2.70 m DE ALTO



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRATISTA
