

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE DAN OFICIALMENTE INICIADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE SARABIA EN DONDE SE ENTREGO EL TRAZO DE LA LINEA DE PROYECTO AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, ADEMAS SE MARCARON NIVELETAS PARA EL CONTROL DE NIVELES DE EXCAVACION

CROQUIS:

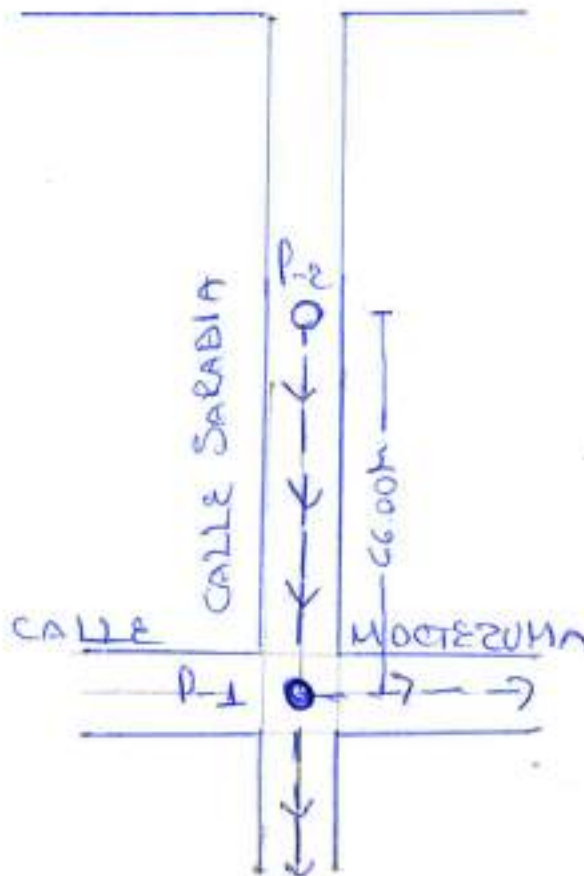

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

  
TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

\_\_\_\_\_  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:   
MUNICIPIO:   
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:


### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.   
OBRA Y/O ACCION:   
METAS:  UNIDAD:   
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:   
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

### NOTAS:

Se CONTINUA con los TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS con MAQUINA RETRO EXCAVADORA DE PUNTO MARTILLO, EL MATERIAL DONDE SE REALIZA LA EXCAVACION SE CONSIDERA MATERIAL TIPO III O TIPO "C" ROCA FIRSA. EN ESTA FORMA SE UBICARON LAS DESCARGAS DE DRENAJE

### CROQUIS:

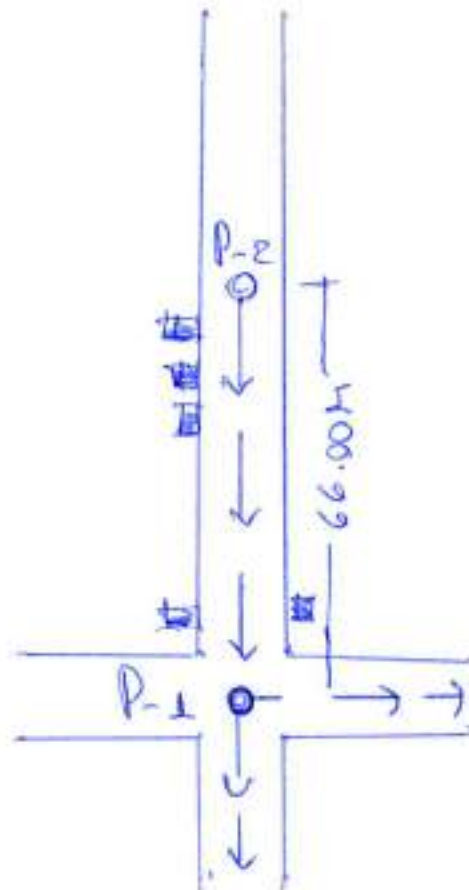

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III, EN ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA, ADENAS SE REALIZA EL AFINE DE FONDO DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES TAMBIEN SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISO DE VISITA DE MURO DE TABICON DE CONCRETO SOLIDO 9X13X28CM.

CROQUIS:

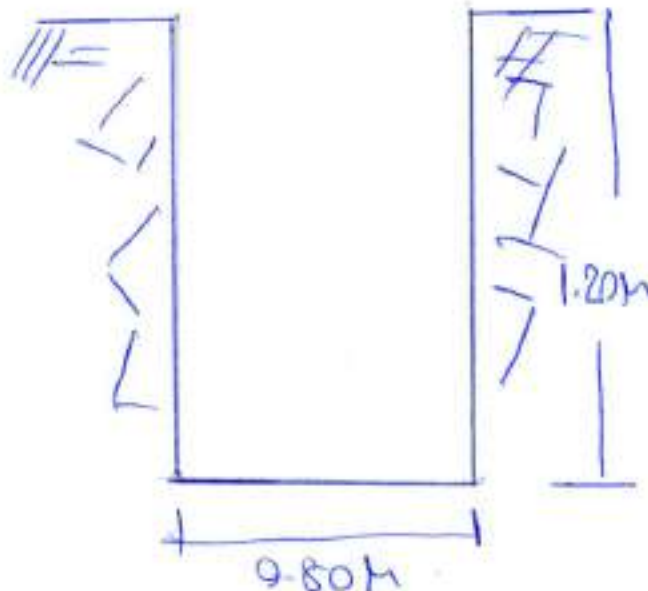

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:   
MUNICIPIO:   
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:


### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.   
OBRA Y/O ACCION:   
METAS:  UNIDAD:   
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:   
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL TIPO III, SE AFINE DE FONDO DE ZANJA, ADEMAS SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA (P-2) Y CON LOS REGISTROS DE DRENAJE DOMICILIARIOS (SOLO SE COLARON LAS PLANTILLAS DE CONCRETO)

CROQUIS:

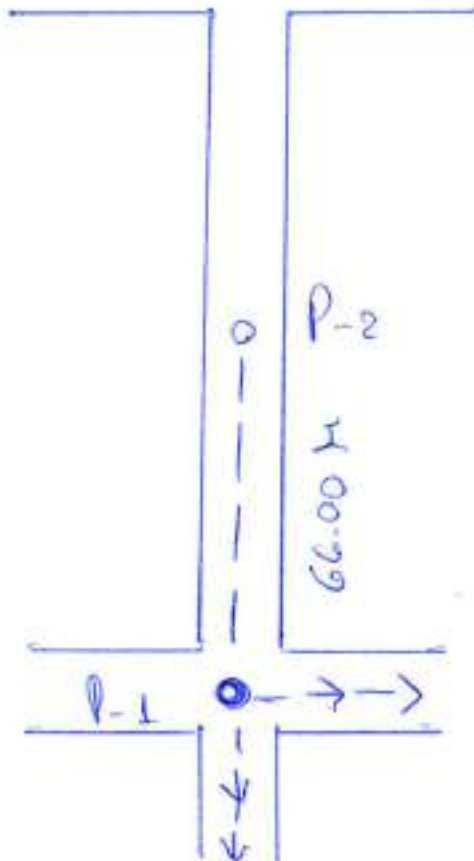

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZAUSA DOZ MEDIOS METRICOS. EL MATERIAL TIPO III, ESTA EXCAVACION YA TIENE UN 50% DE AVANCE CON RESPECTO A LA LONGITUD DE LA LINEA DE DRENAJE PROYECTADA. EN ESTAS 33 MTS YA SE REALIZO EL AFINE DE FONDO DE ZAUSA PARA DEFINIR LA PENDIENTE EN PRANTILLO

CROQUIS:

Y ASI PODER COLOCAR LA TUBERIA -



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
