

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA


CONTRATO NO.
OBRA Y/O ACCION:
METAS: UNIDAD:
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

Se dan por iniciados los trabajos para la obra "Rehabilitación de parque Publico del Barrio de San Antonio" el día 15 de agosto del 2022.

Se comenzo con la demolición del piso de concreto en los pasillos de la plaza.

CROQUIS:

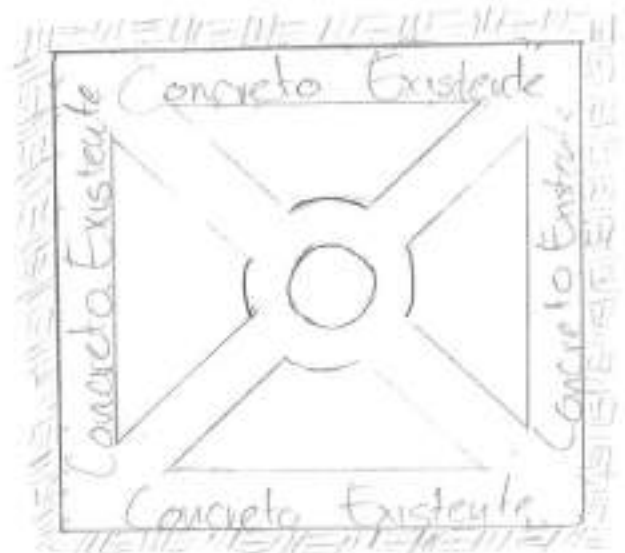


ING. DANIEL TOMAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. SAUL MATA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

En el presente día de Supervisión se puede observar que se realizó el retiro de bancos existentes, así como el retiro de los postes de luminaria, Además de el acarreos de material producto de la demolición de los pisos.

CROQUIS:

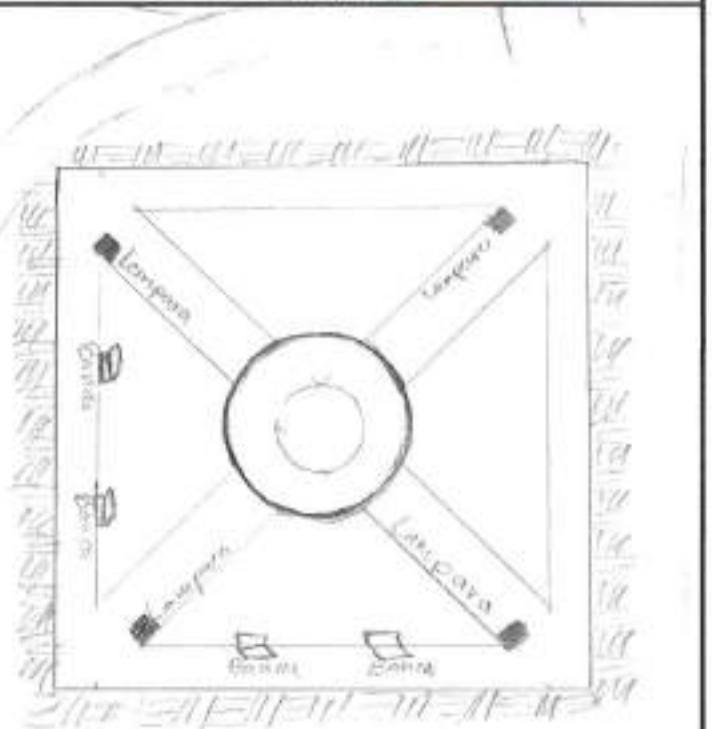


ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. MAXIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


INS. SAUL MATA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En el presente día de trabajos, se llevo a cabo el trazo y nivelación del area de andador y explanada, para establecer ejes y referencias del proyecto.

CROQUIS:

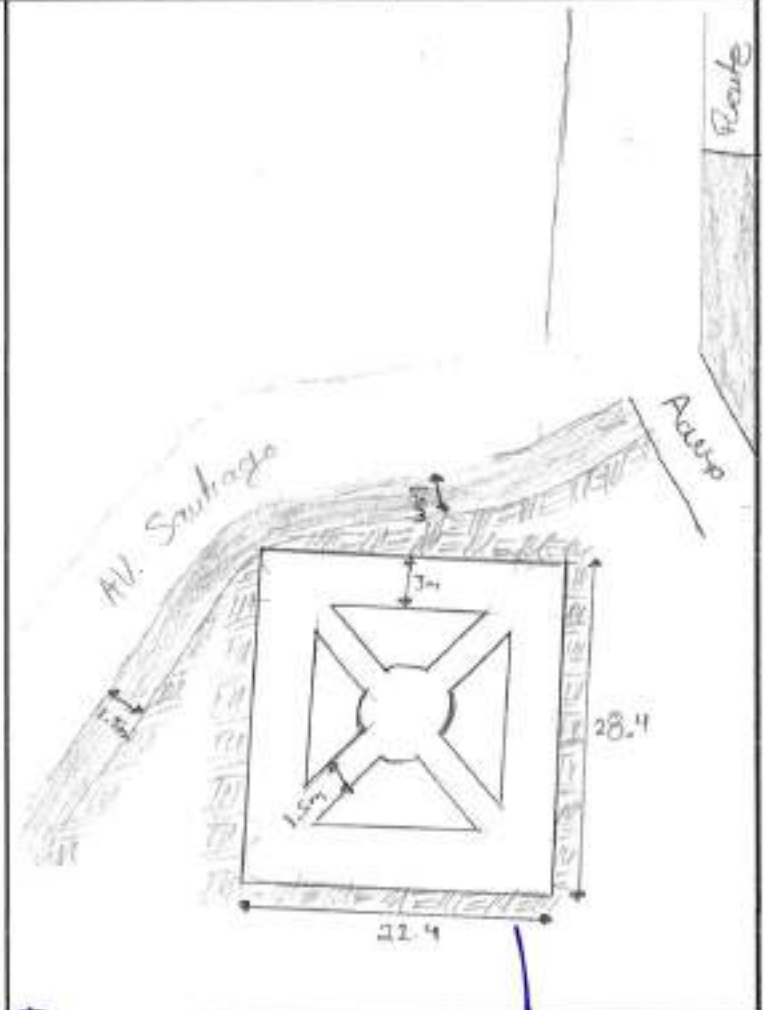

ING. DANIEL TOBAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NANCY EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SAUL MATA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

Para este día se había iniciado con los trabajos de excavación en el área para andador peatonal, realizado por medios mecánicos y manuales, a si mismo se comenzó la excavación para posillos de la explanada y el acarreo del material producto de la misma.

CROQUIS:

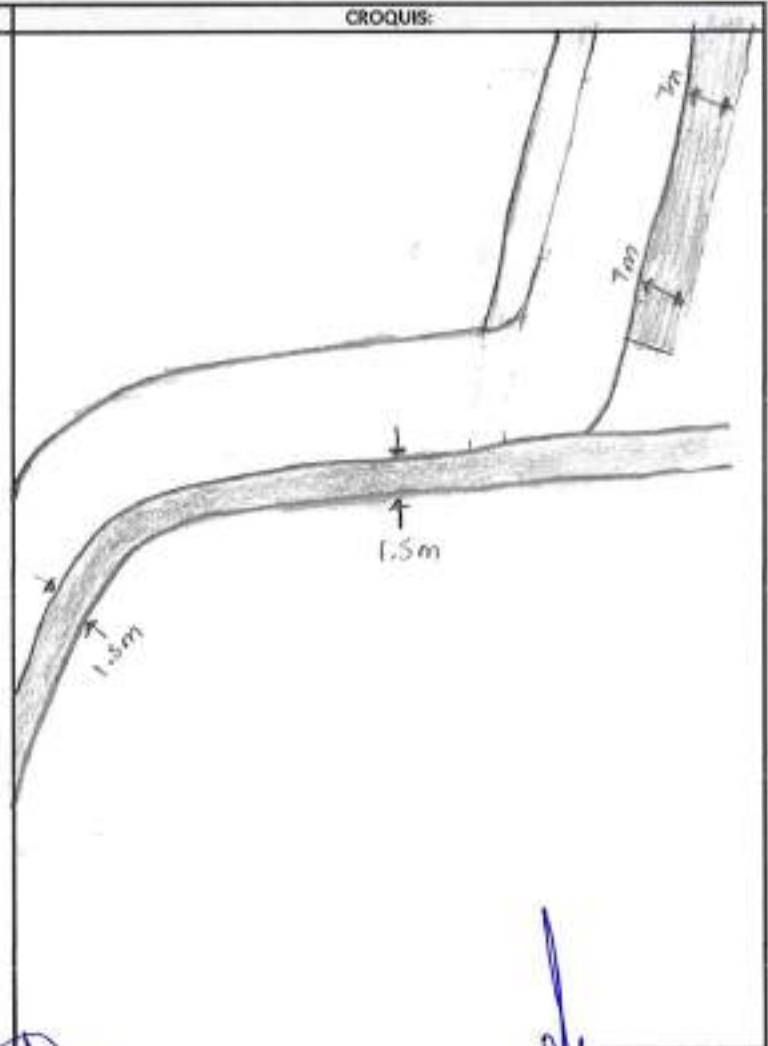


ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


INS. SAUL VINTA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Para la presente visita se tienen realizados los trabajos de suministro y relleno en el area de andador así como su compactación.

Se comienza con la cimbra para guarnición del andador para una seccion de 15x20x40.

CROQUIS:


ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. MANÁ EMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. SAUL MAYA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

En el día de esta supervisión se realizó el colado de la guarnición para el andador peatonal de sección $15 \times 20 \times 40$ armado con acero de refuerzo ($F_c 150 \text{ kg/km}^2$).
Además se comenzó con la cimbra para el mismo andador.

CROQUIS:

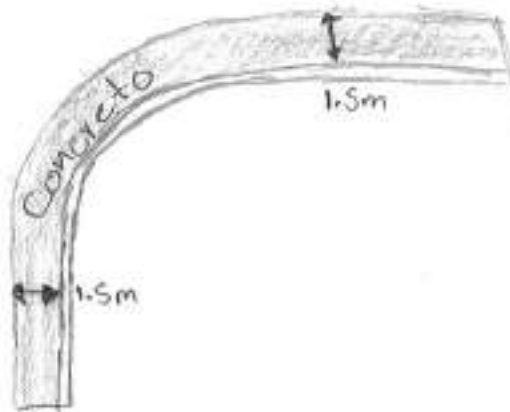


ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MERA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. SAUL NATTA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se Coló con concreto estampado F'c=150Kg/cm² de 10cm de espesor con malla electrosoldada 6X6-10/10 en color ladrillo.

CROQUIS:


ING. DANIEL TORRES GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. SAUL MARTA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
