

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VADO EN LA AV. SANTIAGO EN EL BO. DE SANTIAGO EN DONDE SE REALIZO EL TRAZO Y NIVELACION DESARDO ESOS DE REFERENCIA Y NIVELETAS DE TERMINADO DE CONCRETO.

CROQUIS:

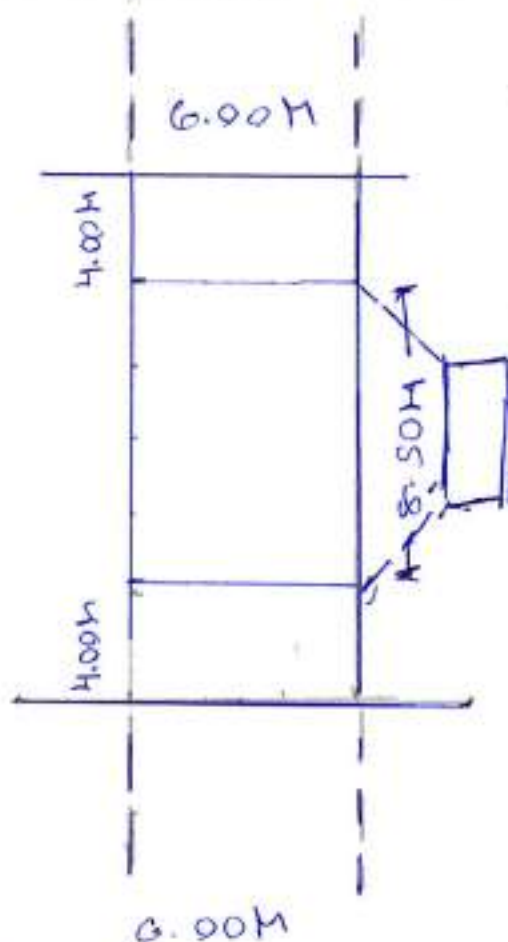

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se continuaron con los trabajos de construcción de vado, en donde antes de realizar la excavación de rampas de acceso y salida del vado se colocó la señalética necesaria para desviar el tráfico vehicular hacia la calle paralela a la Av. Santiago la cual es conocida como Calle Morelos y así

CROQUIS:

SUSPENDER EL TRAFICO EN LA AV. SANTIAGO LIBERANDO EL AREA EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE REALIZO EL TERZO Y NIVELACION PARA UBICAR LAS TRES COLUMNAS LAS CUALES SE HABITARAN CON CONCRETO CICLOPEO LAS QUE PERMITIRAN DESPLANTAR EL CUERPO DEL VADO, ADEMAS SE INICIO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LAS RAMPA DE ACCESO Y SALIDA.

CROQUIS:

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CILINDROS METALICOS, PARA HABILITAR LOS DOS MUROS O COLUMNAS UBICADAS A LOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL VADO, EN DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO CICLOPEO, ESTOS MUROS SE CIMENTAN CON LAS MEDIDAS Y CON EL NIVEL DE TERMINADO MARCADO EN ESTE PROYECTO.

CROQUIS:

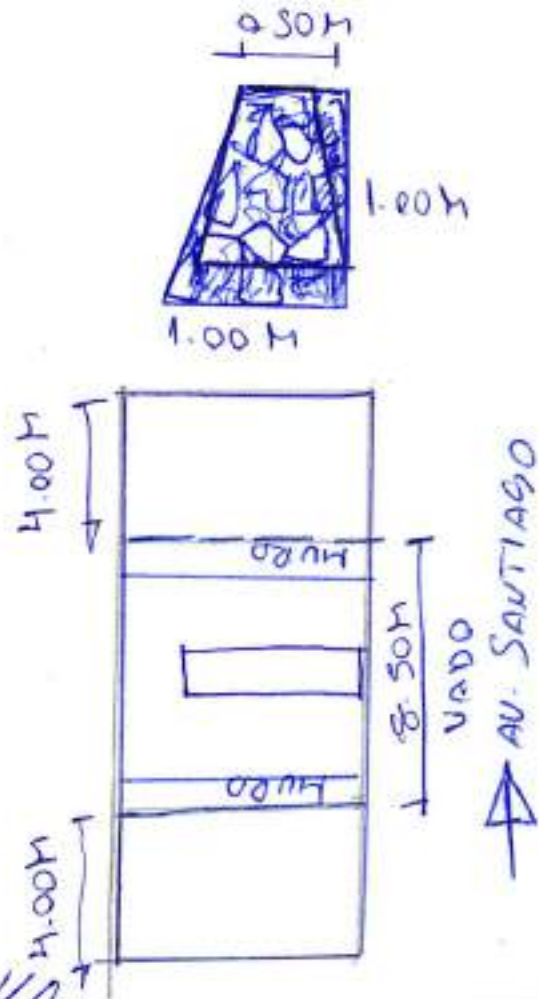

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En este día se observa que ya están terminados los tres muros de concreto ciclo pedo, uno a cada extremo del vado y otro al centro los cuales se contemporan para contener el cuerpo del vado, además se realizó trabajos de compactación de terreno natural en las rampas de acceso y salida del

CROQUIS:

VADO, POR MEDIOS MECANICOS (BARRINA)

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
