

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO UBICADO ENTRE LA COMUNIDAD DE CORRAL QUEMADO Y LA COMUNIDAD DE PALOS CHAVALOS EN TRAMOS AISLADOS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN SON LAS DE LIMPIEZA Y TAZO ESTA OBLECIENDO ESTOS Y BANCOS DE NIVEL DE REFERENCIAS

CROQUIS:

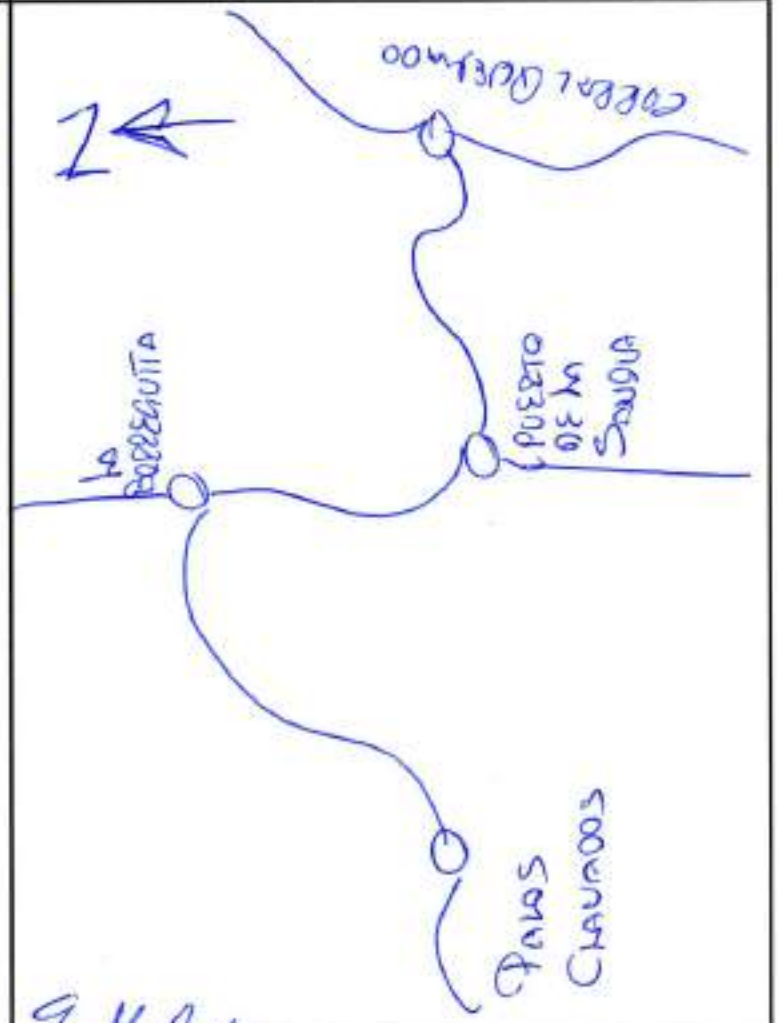

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:


SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO UBICADO DEL CAMINO ENTRE LA COMUNIDAD DE CORRAL QUEMADO Y EL LUGAR CONOCIDO COMO PUERTO DE LA SANDIA, ADEMAS

CROQUIS:

SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE ABUNDAMIENTOS DE BANCO PARA RECUPERAR MATERIAL ESTE BANCO DE MATERIAL ESTA UBICADO EN EL PUERTO DE LA SANDIA SOLO EN LOS TRAMOS QUE ESTAN DAÑADOS POR EL TRANSITO



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE AMONAJAMIENTO Y CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ESTE ACARreo SE REALIZA EN EL TRAMO UBICADO DEL CAMINO ENTRE LA COMUNIDAD DE CORRAL QUEMADO Y EL PUESTO DE LA SANDIA, TAMBIEN SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL

CROQUIS:

EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PUESTO DE LA SANDIA Y EL LUGAR CONOCIDO COMO LA BARRIGUITA SON EN TRAMOS AISLADOS

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: Palos Chavados

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 17-MARZO-23 FOLIO: 04

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO. HSC-1233-FH-AD/UD/02/0A-01-23

OBRA Y/O ACCION: "REHABILITACION DE CAMINO DE CORRAL QUEMADO A PALOS CLAVADOS"

METAS: 2 UNIDAD: KM

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 10 DE MARZO DE 2023


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 31 DE MARZO DE 2023

NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE MANEJO EN EL TRAMO DE CAMINO UBICADO ENTRE PUERTO DE LA SAUDIA Y LA BOBREGUITA, ADEMAS SE REALIZA LA COLOCACION DE ESTE MATERIAL POR MEDIO DE LOS TRAZOS DE TENDIDO Y NIVELACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS EN PROMEDIO CON

CROQUIS:

MAQUINA FOTO CON FORMADORA SAHO EN LOS TRAZOS NECESARIOS

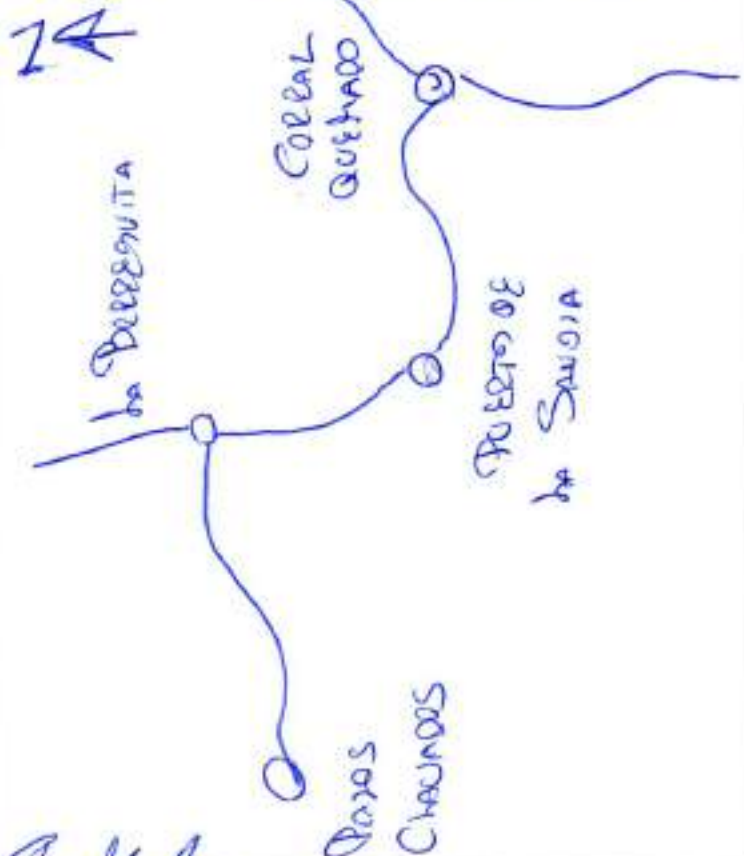

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE Y REVULSION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCUNFORMADO EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA DORREGUITA Y LA COMUNIDAD DE PALOS CHUAQUOS EN TRAMOS AISLADOS ADMAS SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ABUNDAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO Y CON EL TRABAJO DE CARGA Y

CROQUIS:

ACERDADO DE ESTE MATERIAL DE BANCO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PUERTO DE LA SANDIA Y LA DORREGUITA



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO SOBRE EL CAMINO ESTO POR MEDIO DE EL TEJIDO Y NIVELADO CON MAQUINA ROTOCORTADORA DE ESTE MATERIAL CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS DE ESPESOR, ESTO EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PUERTO DE LA SAUGIA Y LA BORREGUITA SOLO EN LOS TRAMOS CONTIGUOS

CROQUIS:

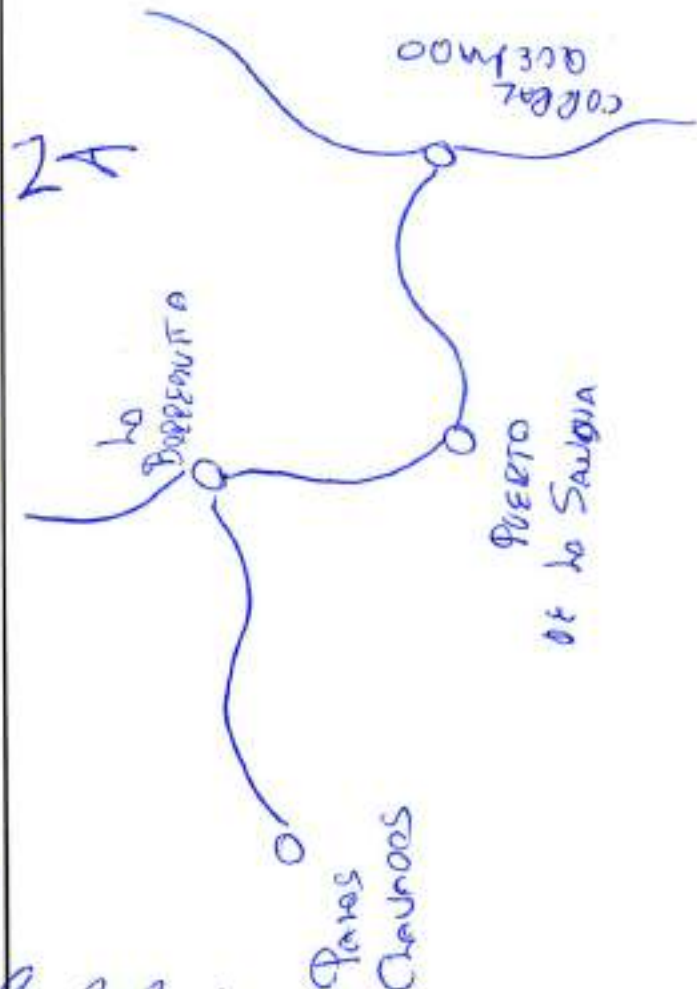

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ACABADO DE MATERIAL DE BANCO EN EL TRAMO DE CAMINO UBICADO ENTRE LA BOBREGUITA Y LA COMUNIDAD DE PATIOS CHAVADOS, ADEMÁS SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO CON UN ESPESOR DE 10 CMS DE PROMEDIO.

CROQUIS:

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:

UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO SOBRE ESTE CAMINO, POR MEDIO DE EL TRUJADO Y NIVELADO DE ESTE MATERIAL CON MOTOCONTO RINADERA CON UN ESPESOR DE 10 CMS ESTO EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA BOBREGUITA Y LA COMUNIDAD DE PALOS CHAUADOS

CROQUIS:

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: PARAS CLAVADOS

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

31-MARZO-23 09

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO. HSC-1833-FE-001/06/09/0A-01-23

OBRA Y/O ACCION: "REHABILITACION DE CAMINO DE CORRAL QUEMADO A PALOS CLAVADOS"

METAS: 2 UNIDAD: Km

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 10 DE MARZO DE 2023


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 31 DE MARZO DE 2023

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS CONTEMPLADO EN ESTA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO CORRAL QUEMADO A PALOS CLAVADOS, EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TBAZO, CORTE Y REVIVIFICACION DE TERRENO NATURAL A FUNDAMENTO

CROQUIS:

Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO, ACARreo DE MATERIAL EN CAMION Y LA COLOCACION DE ESTE MATERIAL CON UN ESPESOR DE 10 CM S. EN PROMEDIO. EN TROCOS AISLADOS



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
