

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE TERMINO CON LA EXCAVACION PARA ABRIR CASOS EN ANDADOR, ESTE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ES CARGADO Y ACARRIADO FUERA DE EL AREA DE LOS TRABAJOS.

SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EL DESPLANTE DE LA GUARNICION Y EL APROCHE CON MATERIAL

CROQUIS:

DE BANCO, ESTA GUARNICION DEFINE O SEPARA EL ANDADOR DE LA PLAZA PRINCIPAL



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE SUBBASE HIDRAULICA. ESTE MATERIAL ES COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS CON BARRINA COMPACTADORA EN EL AREA DE BANQUETAS EN EL LADO NORTE DEL ANDADOR, ESTO YA ES POSIBLE YA QUE EL

CROQUIS:

PERSONAL DE TELMEX YA REALIZO LAS MODIFICACIONES Y TENDIDO DE DUCTOS EN BANQUETAS PARA LOS SERVICIOS DE TELEFONIA EN VIVIENDAS EXISTENTE

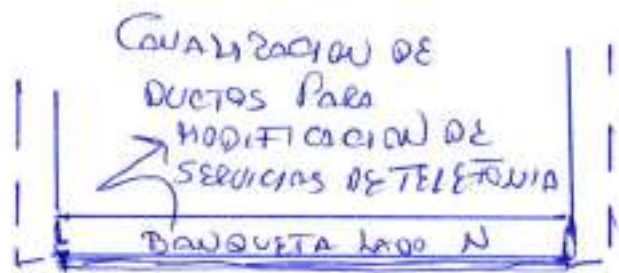

AREA ANDADOR

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOJO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

### NOTAS:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE FORZADO DE CURADON DE FORMA TRAPEZOIDAL (13, 20, 40 CHS) REFORZADA CON ARMEX 15-20-3/8 CONCRETO FC=150 kg/cm<sup>2</sup>, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA PARTE SUPERIOR DEL ANDADOR;

### CROQUIS:

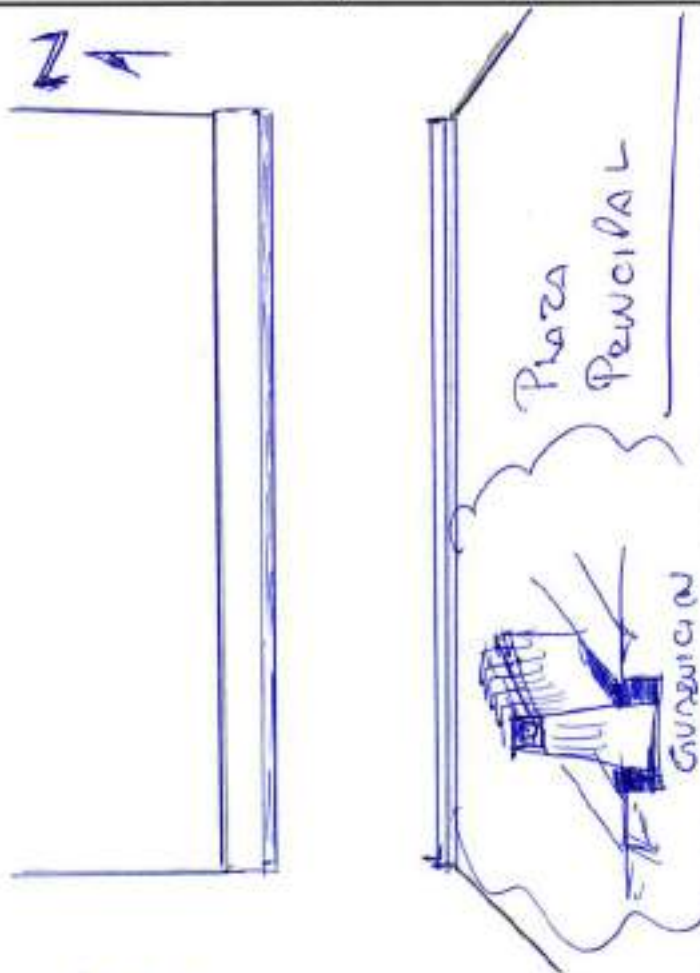

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TCP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

### NOTAS:

EN ESTA FECHA SE TERMINO CON EL FORZADO DE GUARNICION DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE SECCION (15x20x40) CONCRETO  $F_c=150 \text{ kg/cm}^2$ , ESTA GUARNICION SE REFORZADA CON UN ARMEX CADEÑA 15-20-3/8 ESTO EN AMBOS LADOS (NORTE Y SUR DE EL ANDADOR)

### CROQUIS:

TAMBIEN SE REALIZAN TRABAJOS DE ARDACHE DE GUARNICION Y COMPACTACION DE ARDACHE (MATERIAL DE BANCO) EN LOS COSTADOS DE LA GUARNICION

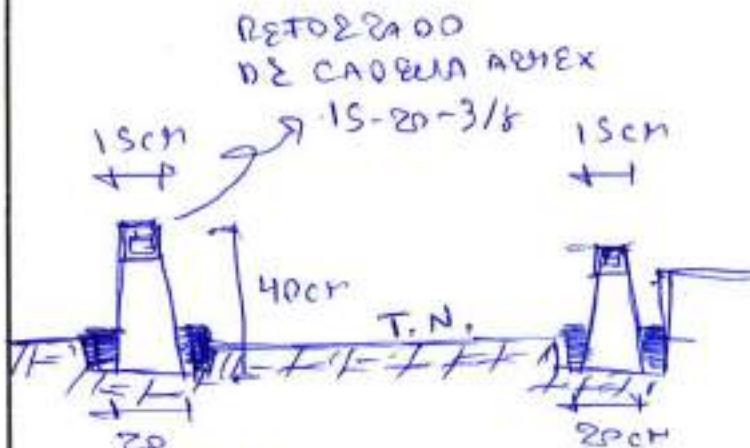

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  
SUPERVISOR DE OBRA

ARO. EMMANUEL FLORES ZARATE  
SUPERINTENDENTE DE OBRA
