

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

El día de hoy se dio comienzo con los trabajos de corte en camino rural Puerto de la Sandia- Agua fría

CROQUIS:

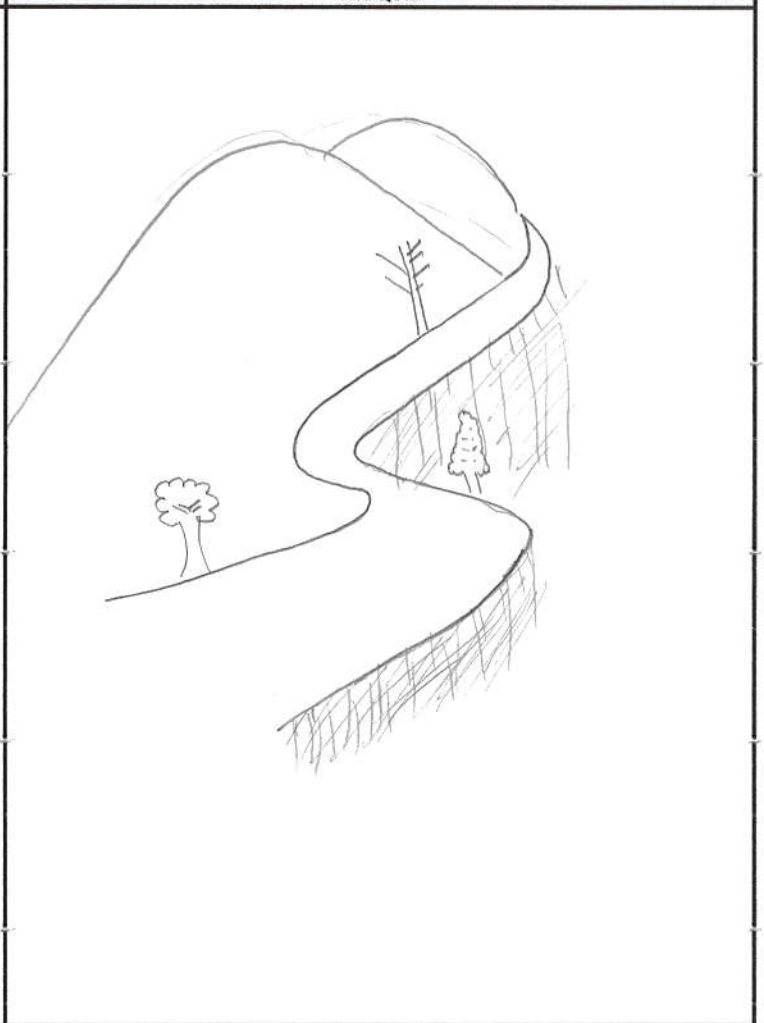

ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

El día de hoy se comenzó con los trabajos de corte de material en el camino rural Puerto de la Sandia - Agua fría creando conetas en laterales donde se considere necesario.

CROQUIS:

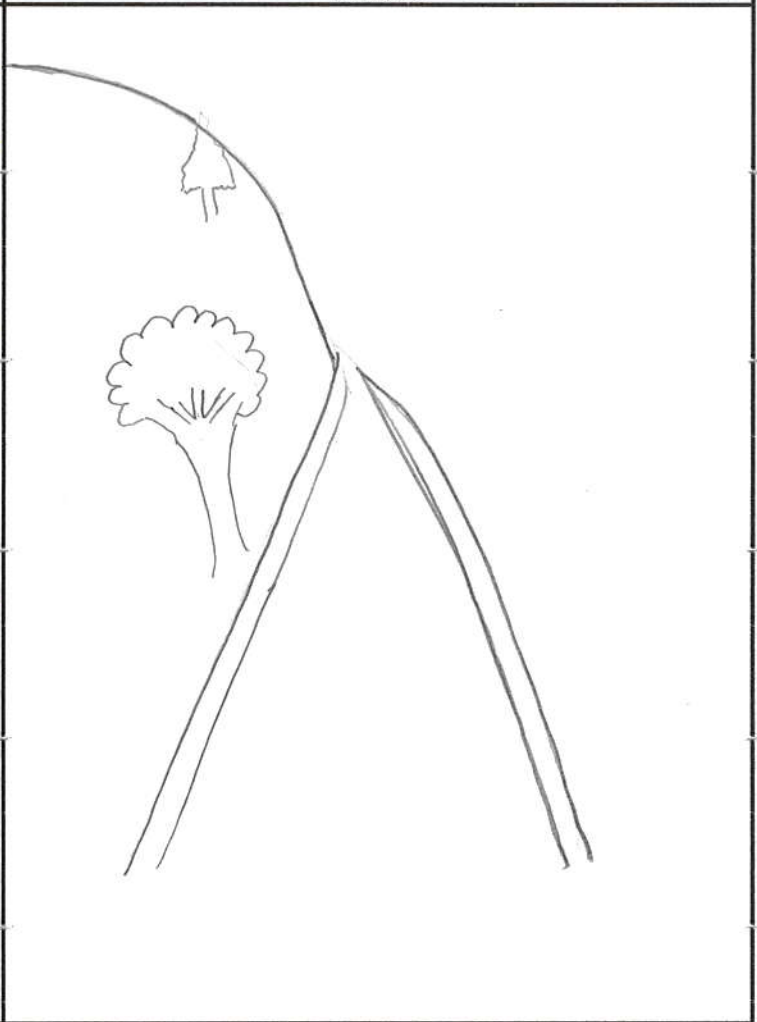

ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Continuando con los trabajos de corte se procedio con el desmonte q los costados del camino asi tambien como la señalización del lugar donde se almacenaria el material merte de banco.

CROQUIS:


ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA


SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se inicio con acarreo de material inerte de banco en camion los primeros 1000 m desde el area especificada en un lomo rido pronunciado.

CROQUIS:



ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se continuo con el acarreo de material inerte de banco en camion hasta una distancia de 2500 m desde el area especificada en lomerio pronunciado.

CROQUIS:

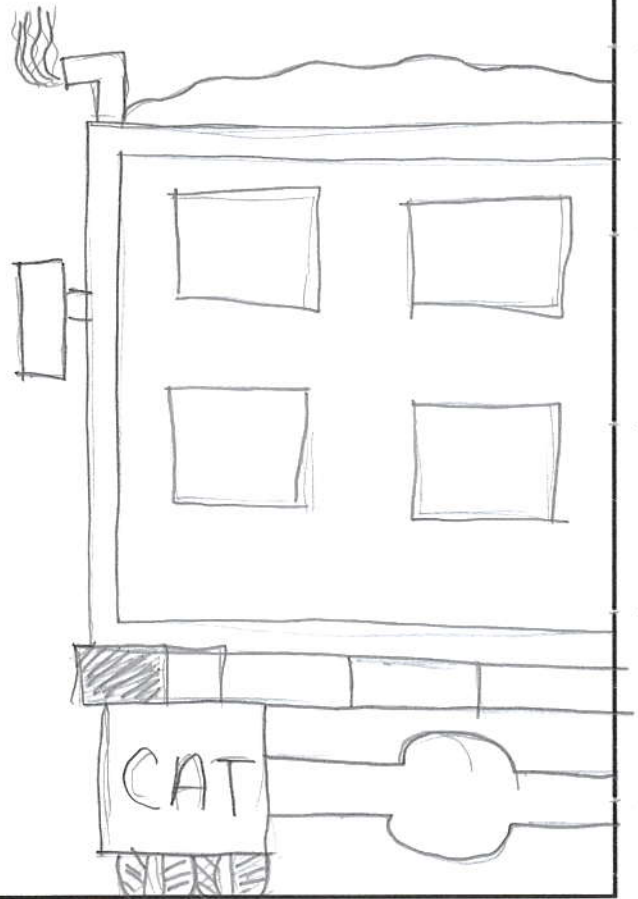

ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Al terminar con el acarreo del material se procedio con el tendido, papeo y acomodado con motoniveladora del material inerte de banco con un espesor promedio de 10 cm.

CROQUIS:

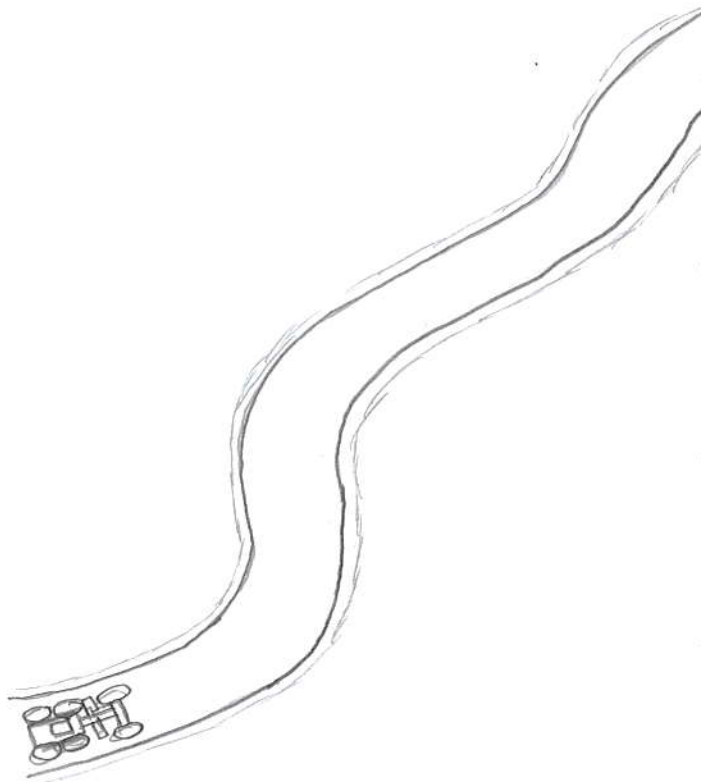

ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Concluyendo con los trabajos se procedio a colocar una placa abstriva a la obra de Vinil autoadherible con base metalica de PTR.

CROQUIS:

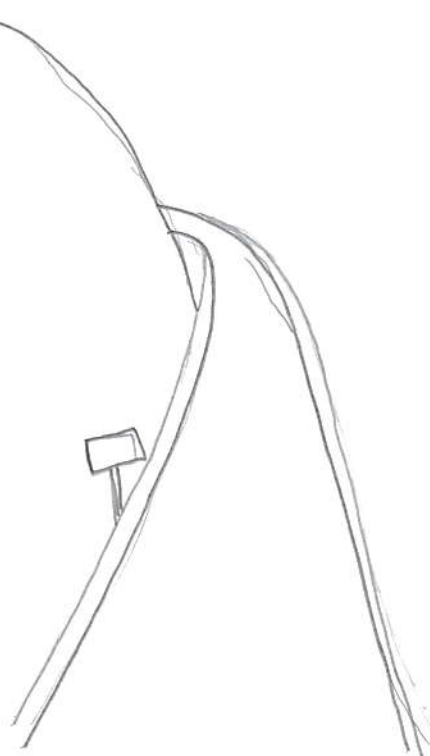

ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
