


OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.	
UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.	
No. DE CONTRATO:	AO-EST-245800009-4-2023	
CONTRATISTA	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	
FONDO:	FISM	
IMPORTE DE CONTRATO:	\$	1,464,099.39
ANTICIPO:	\$	439,229.82
MONTO EXCEDENTE:	\$	-
FECHA ENTREGA EST.:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
No. DE ESTIMACION:	2	
No. ESTIMACION C/LETRA:	DOS	
RESIDENTE:	LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.	
COORDINADOR O.P.M.:	ING. DANIEL MEZA MARTINEZ.	
COORDINADOR D.S.M.:	ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ.	
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ.	
FECHA DE INICIO:	13/06/2023	
FECHA DE TERMINO:	28/08/2023	
PERIODO DE ESTIMACION 1:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA DE ESTIMACION



2	UBICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
No. ESTIMACION	UBICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
No. CONTRATO:	UBICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
CONTRATISTA:	UBICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
FONDO:	UBICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
PERIODO EST:	UBICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
No. ESTIMACION		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
No. CONTRATO:		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
CONTRATISTA:		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
FONDO:		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	
PERIODO EST:		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE IESUS, CERRITOS, S.L.P.	

RESUMEN DE ORDENES DE CAMBIO		AMPLIACION AL CONTRATO INICIAL	
IMP. ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO	ORDENES DE CAMBIO
ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
O.C. No.	O.C. No.	O.C. No.	
TOTALES DE O.C.	\$	\$	

RESUMEN DE ORDENES DE CAMBIO		AMPLIACION AL CONTRATO INICIAL	
IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO: \$		1,464,099.39	
ANTICIPO DEL 30 %: \$		439,229.82	
IMPORTE DE CONTRATO ACTUALIZADO: \$		1,464,099.39	
IMPORTE DE LA PRESENTE ESTIMACION: \$		350,004.58	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO S/I.V.A: \$		105,001.37	
SUMA: \$		245,003.21	
I.V.A. 16 %: \$		39,200.51	
SUB-TOTAL: \$		284,203.72	
RETENCION DEL 5 AL MILLAR: \$		1,750.02	
RETENCION DEL 2 AL MILLAR: \$		700.01	
TOTAL A PAGAR NETO: \$		281,753.69	

ESTADO DE CUENTA		(DEL IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO)	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR: \$	579,508.31	PRESENTE ESTIMACION: \$	406,005.31
TOTAL ESTIMADO: \$	985,513.62	IMPORTE POR ESTIMAR: \$	478,585.77
AMORTIZADO ANTERIOR EN ESTE ESTIMACION: \$	121,801.59	TOTAL AMORTIZADO: \$	295,654.08
TOTAL AMORTIZADO: \$	143,575.74	ACUM. POR RET. HASTA ESTIM. ANTERIOR: \$	8,835.08
ACUM. POR RET. HASTA ESTIM. ANTERIOR: \$	3,497.03	TOTAL DE RETENCIONES DEL CONTRATO: \$	2,450.03
TOTAL DE RETENCIONES DEL CONTRATO: \$	5,947.06	RETENCION DEL 5 AL MILLAR: \$	1,750.02
TOTAL RETENIDO: \$	2,888.02	RETENCION DEL 2 AL MILLAR: \$	700.01

AUTORIZO

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ.
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL


LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. DANIEL MEZA MARTINEZ.
 COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS.

LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN.
 RESIDENTE DE OBRA

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, E		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	FOTOSINOS Y FCO. VILLAS, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		AVANCE	
No. CONTRATO:	AG-EST-24589009-4-2023		FÍSICO	FINANCIERO	
CONTRATISTA:	G. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		87.31%	77.12%	
FONDO:	FISM		HOJA:	1	DE 1

DATOS DE CONTRATACION				PERIODO DE ESTIMACION								
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	No. DE ESTIMACION	FECHA DE ESTIM.	DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023								
13/06/2023	28/08/2023	DOS	15 DE AGOSTO DEL 2023	DATOS DEL ANTICIPO								
No. DE CUENTA	RESUMEN DE PARTIDAS	ORDENES DE CAMBIO	PRESUPUESTO DE CONTRATO	ESTIMADO ANTERIOR	IMPORTE ESTA ESTIMACION	ESTIMADO ACUMULADO	IMPORTE POR EJECUTAR	IMPORTE DEL ANTICIPO	AMORT. ACUMULADO	AMORT. DEL ANTICIPO	IMPORTE POR AMORTIZAR	AVANCE %
	a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g=a-f	h	j	i	k=i-h	i/f/a
1	\$ 1,464,099.39	\$	\$ 1,464,099.39	\$ 579,508.31	\$ 406,005.31	\$ 985,513.62	\$ 478,585.77	\$ 439,229.82	\$ 121,801.69	\$ 296,664.08	\$ 143,676.74	87.31%
IMPORTE TOTALES C/IVA:				\$ 1,464,099.39	\$ 406,005.31	\$ 985,513.62	\$ 478,585.77	\$ 439,229.82	\$ 121,801.69	\$ 296,664.08	\$ 143,676.74	87.31%

ELABORÓ: 

CONTRATISTA: C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

REVISÓ: LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN

RESIDENTE: LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN

OBSERVACIONES:

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DÍAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FGO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FGO. VILLA EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE	
No. CONTRATO:	AD-EST-29590909-4-2023		FISICO	FINANCIERO	
CONTRATISTA:	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		67.31%	77.12%	
FONDO:	FISM		HOJA:	1	DE 1
PERIODO EST:	DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023				

PRESUPUESTO POR CONTRATO									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO		IMPORTE	
						ANTERIOR	ESTE	ANTERIOR	ESTE
PRELIMINARES									
1	Trazo y nivelación de la línea de drenaje sanitario estableciendo plantas de retención y ejes, incluye mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1016.00	\$ 10.10	\$ 10,342.88	1016.00	0.00	10,342.88	\$ 10,342.88
2	Excavación en material tipo II (apertura de coja) medido en bancas según secciones constructivas, incluye excavación a mano y/o a máquina, mano de obra, maquinaria y equipo, elementos, despoles, carga y acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	218.16	\$ 599.41	130,707.29	218.16	0.00	130,707.29	\$ 130,707.29
3	Compactación por medio de mecánicas de terreno natural al 90% de su pvm, incluye incorporación de humedad óptima del material, nivelación y refino de la superficie, retiro de material retenido por fugas y/o lluvia y reposición de material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	727.20	\$ 36.47	26,520.98	727.20	0.00	26,520.98	\$ 26,520.98
4	Suministro y colocación de bala hidráulica 1/2 a finos, compactada al 95% de su pvm por medio de mecánicas, incluye material, mano de obra, nivelación, acarreo del material, incorporación de humedad óptima del material, tendido, compactado, afilado, sobre espatores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	109.08	\$ 532.83	58,099.28	109.08	109.08	58,099.28	\$ 58,099.28
PAVIMENTOS									
5	Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 trazo 1/2" de 15 cm de espesor, curado con membrana base agua con espatores, incluye colado, vibrado, cimbrado metálico de primera, longitudinal sin machihembrar en frontales, acabado texturizado con rallador de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	682.40	\$ 613.51	416,869.82	682.40	351.10	218,464.71	\$ 218,464.71
6	Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2, trazo 1/2" de 15 cm de espesor curado con membrana base agua con espatores, incluye colado, vibrado, cimbrado metálico de primera longitudinal sin machihembrar en frontales, acabado texturizado con rallador de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, acabado estampado color uside, molde desmoldante.	M2	80.80	\$ 633.52	51,188.42	80.80	0.00	51,188.42	\$ 51,188.42
7	Corta y sellado de juntas de dilatación a cada 3.00 m o según se ajuste en campo con una profundidad de 5 cm y 5mm de espesor, colado en ambos sentidos con sellador autosealante, material de respaldo con tira de polietileno flexible, incluye trazo, materiales, mano de obra, equipo de corte y disco diamante, borbido y limpieza de la junta con disco de desbaste, cinta a presión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M/L	404.00	\$ 41.21	16,648.84	404.00	0.00	16,648.84	\$ 16,648.84



2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCC. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCC. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE	
	No. CONTRATO:	AD-EST-24590009-4-2023		FISCO:	77.12%
	CONTRATISTA:	G. ALFONSO GERARDO MARTINEZ BANCHEZ			
	FONDO:	FISM			
No. ESTIMACION	PERIODO EST:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023		HOJA:	1 DE 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FINICO			IMPORTES			
						ANTERIOR	ESTE	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTE	ACUMULADO	
AVANCES												
BANQUETAS Y BARRANDONES												
0	Construcción de banquetas y rampas peatonales y cocheros de concreto simple f'c=150 kg/cm ² kma 3/4" de 10 cm de espesor, acabado escabillado, incluye cortes a cada 2m, cimbrado, cobado, reglado, curado, desmoldado, retiro de material saturado por lluvia y/o lluvia, reposición de material repallado del material existente en el talón de la banqueta y el paramento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	244.00	\$355.43	\$ 86,724.92	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	
0	Quomición de concreto simple f'c=150 kg/cm ² kma 3/4", R.M, tación trapezoidal 15x20x40 cm, incluye, cimbrado metálico, cobado, acabado escabillado y junta de dilatación @ 3 m con celotex aislado acabado aparente, arista exterior redondeada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	192.00	\$297.16	\$ 57,052.80	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	
10	Suministro y colocación de pintura color amarilla de tráfico comax o similar (no diluible) en guarnición, incluye limpieza de la zona del trabajo con aceite mineral refinado con agua, acarreo, flete, mano de obra, pintura para tráfico a dos metros, despendido y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	42.24	\$82.18	\$ 3,471.28	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	
AGUA POTABLE												
11	Excavación en capa por medio mecánicos en terreno tipo III incluye, acarreo interno y exterior a bancos propuestos por el contratista y autorizados por la supervisión, cines de taludes y fondos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, arena de 10 cm de espesor, para cajer y nivelar tuberías, incluye cargo, acarreo y descarga del material, acarreo del material, cines, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	36.36	\$430.28	\$ 15,644.25	0.00	36.36	36.36	\$ -	\$ 15,644.25	\$ 15,644.25	
12	Suministro, colocación y prueba de tubería de pvc hidráulico RD-26 de 2", incluye mano de obra calificada, acarreo y manobras de los materiales, for requerimientos del organismo operador de agua potable tanto en línea con en tomos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	101.00	\$87.64	\$ 8,851.64	0.00	101.00	101.00	\$ -	\$ 8,851.64	\$ 8,851.64	
13	Acosillado de arena hasta 15 cm por encima de lama de tubo, incluye: cargo, acarreo y descarga del material, acarreo del material, cines, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	9.00	\$470.66	\$ 4,276.30	0.00	9.00	9.00	\$ -	\$ 4,276.30	\$ 4,276.30	

X

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIBRÍDICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE	
	No. CONTRATO:	AO-EST-24690009-4-2023		FISICO	FINANCIERO
	CONTRATISTA:	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		67.31%	77.12%
	FONDO:	FIM		HOJA:	1 DE 1
	PERIODO ESTI:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023			

PRESUPUESTO POR CONTRATO														
No.	CONCEPTO	URBADO	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO			IMPORTE					
						ANTERIOR	ESTE	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTE	ACUMULADO			
14	Tapa de tubería de 2.00 mts con tubería de polietileno de alta densidad con fibra de aluminio de 12", incluye conexión, mano de obra calificada, accesorios y membras de los materiales, abrazadera de toma con salida de 1/2", 3 adaptadores de aluminio Pa al Pa 1/2", 40 cm de tubo de pvc sanitario de 4". Tapa registro de banquetas, llave de Banqueta de Pa al Pa renourado, demolicion de muro, relleno del mismo y conexiones a medidor existente, excavaciones, cama de arena de 10 cm de espesor, relleno con material producido de la excavacion, carga y acarreo del material sobrante, todo de acuerdo al proyecto, los trabajos deberán cumplir con las especificaciones del organismo operador de agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	19.00	\$1,448.12	\$	27,476.28	0.00	19.00	19.00	\$	27,476.28	\$	27,476.28	27,476.28
15	Relleno compactado por medio mecanico en capas de 20 cm, utilizando material producido de la excavacion seleccionado, incluye carga, acarreo y descarga del material y compactado al 90% de su PVS.M.	M3	19.00	\$108.47	\$	2,060.93	0.00	18.00	19.00	\$	2,060.93	\$	2,060.93	2,000.93
16	Caja de ventilación 120x1,000x60 m (int) de tabicon 13 cm juntas con mortero cemento arena 1:4 acabado pulido, plantilla de concreto Fc=50 kg/cm2 de 10 cm de espesor, Incl. Cuadro de 40x40 cms de grava de 3/4" al centro de caja de ventilación, losa armada de 19 cm con varilla de 3/8" @ 10 cm en ambos sentidos, concreto Fc=250 kg/cm2, contramuro canal de 4", marco y tapa de hierro vaciado, voladizo compuerta de 3" de diametro vantage tipo, cuerpo brida, 2 empesques de neopreno 2", 2 extremidades pvc hidraulico de 2", familia de 3/8x1/2" con tuercas y rondenes, incluye excavacion y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$18,128.19	\$	18,128.19	0.00	1.00	1.00	\$	18,128.19	\$	18,128.19	18,128.19
DRENAJE														
17	Excavacion en capa por medios mecanicos en terreno tipo III, incluye accesorios internos y externos a bancos propuestos por el contratista y autorizados por la supervisión afine de toludas y fondos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	80.80	\$430.28	\$	34,765.01	00.80	0.00	80.80	\$	34,765.01	\$	34,765.01	34,765.01
18	Suministro y colocación de plantilla o cama de arena de 10 cm de espesor, para sujeción y nivelar tubería, incluye carga, acarreo y descarga del material, acomodo del material, afine, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.08	\$471.15	\$	3,806.89	6.08	0.00	6.08	\$	3,806.89	\$	3,806.89	3,806.89
19	Suministro, colocación y prueba de tubería de polietileno de alta densidad de 12" para red de alcantarillado sanitario, incluye: limpieza de zanja, liga o empalme, entre pozo y tubo de pvc, pruebas de hermeticidad, bombeo de lechigue, corras, juntas del tubo, anillos de hule, engrapante vegetal, conexión a pozo de visita, mano de obra calificada, accesorios, los requerimientos del organismo operador de agua potable y membras de los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	80.80	\$613.17	\$	49,644.14	80.80	0.00	80.80	\$	49,644.14	\$	49,644.14	49,644.14

X

OBRA:		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FGO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FGO. VILLA EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:		16 DE AGOSTO DEL 2023	
UBICACIÓN:		CERRITOS, S.L.P.		AVANCE			
No. CONTRATO:		AO-EST-245890008-4-2023		FISICO		FINANCIERO	
CONTRATISTA:		C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		67.31%		77.12%	
FONDO:		FIM		HOJA:		1 DE 1	
PERIODO EST:		DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023					
No. ESTIMACION							

PRESUPUESTO POR CONTRATO												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FISICO			IMPORTES		ACUMULADO	
						ANTERIOR	ESTE	AGUILADO	ANTERIOR	ESTE		
20	Acostillado de arena hasta 15 cm por encima del lomo de tubo, incluye acarreo y descarga del material, acomodo del material, afina, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Descarga domiciliar de drenaje con tubería de polietileno de alta densidad de 6", incluye excavación con profundidad hasta 1.50 m, afina de talud y fondo, plantilla de arena de 15 cm de espesor y acostillado de 15 cm sobre el bano de tubo, relleno de material de banco (mezcla 60% relleno y 40% grava arena) en una capa de 20 cm, relleno de material producto de excavación compactado por medios mecánicos al 95% de su PVSJ (tubo de 6" de PVD y Tee o bota de linarcan, incluye el acarreo del material producto de excavación.	PZA	10.30	\$470.00	\$ 9,120.10	10.30	0.00	10.30	9,120.10	\$	9,120.10	
21	Relleno compactado por medios mecánicos, en capas de 20 cm, utilizando material producto de la excavación seleccionada, incluye cargo, acarreo y descarga del material y compactado al 90% de su PVSJ.	M3	10.00	\$5,733.30	\$ 57,333.30	10.00	0.00	10.00	57,333.30	\$	57,333.30	
22	Contrucción de registro domiciliario de drenaje a base de tablon de concreto solidado 9x13x28 cm a 909, aplomado pulido, seccion interior 40x60x100 cm largo-anchura-profundidad. Incluye excavación, acarreo de material producto de excavación, relleno, mano y contrarresto de 60x40 cm a base de ángulo de 3" x 1/4", anclado en concreto f'c=150 kg/cm2, tapa de concreto 75 cm x 95 cm por 8 cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, con circunferencia de verilla de 316" (ø 10 cm) plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, aplomado pulido en cara interior con mortero cemento arena 1:4 así como la conexión de la descarga de 6", incluye forjado de medio con la base de lóncó, acabada pulido de la misma, excavación y relleno.	PZA	53.33	\$108.47	\$ 5,794.71	53.33	0.00	53.33	5,794.71	\$	5,794.71	
23	Pozo de visita tipo comun hasta 2.00 mts de profundidad, diámetros interiores de 1.20 mts en la base y 0.60 mts en la parte superior; a base de muro de tablon a tizon, juntado con mortero cemento arena 1:4 y aplomado pulido con el mismo mortero el interior, plantilla de 15 cm de espesor con concreto f'c=250 kg/cm2, forjado medio con, escalones de polipropileno reforzados con acero ø 40 cm, brocal/tapa pozo de visita PAD-H25 (litro con logo asen) diametro de 0.60 m. Incluye: excavación de la misma en cualquier tipo de material y profundidades, corte de tubería de paso, rellenos compactados al 90% de su PVSJ, con material de banco (mezcla 60% relleno y 40% grava arena), bombeo de eschiques, prueba de hermeticidad, retiro de material no utilizabla fuera de la obra a bancos autorizados por la supervisión.	PZA	2.00	\$15,653.04	\$ 31,306.08	2.00	0.00	2.00	31,306.08	\$	31,306.08	
26	Limpieza gruesa y fina durante y al final de los trabajos, incluye materiales, mano de obra, equipo de limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1016.00	\$6.47	\$ 6,573.52	1.57	0.00	1.57	6,573.52	\$	6,573.52	
PREMIO PUESTO TOTAL SIN IVA					\$	1,292,154.65						
IVA:					\$	201,944.74						
TOTAL:					\$	1,494,099.39						
IMPORTE ESTIMADO					\$	489,576.13					\$	849,560.71
IVA:					\$	79,832.18					\$	135,932.91
TOTAL:					\$	569,408.31					\$	985,513.62

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIBRÁTICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.			FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.			AVANCE	
No. CONTRATO:	AO-EST-24680009-4-2023			FISICO	67.31%	FINANCIERO
CONTRATISTA:	G. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ			77.12%		
FONDO:	FISM			HOJA: 1 DE 1		
PERIODO EST:	DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023					

PRESUPUESTO POR CONTRATO							
No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	
						ANTERIOR	ESTE
							AGUILLADO

G. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRATISTA
 LEAO. RICARDO GALVAN GALVAN.
 RESIDENTE:

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCES		
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-4-2023		FISICO	FINANCIERO	
	CONTRATISTA:	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		67.31%	77.12%	
	FONDO:	FISM				
No. ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023		HOJA:	1	DE 1

GENERADORES DE OBRA

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		DIMENSIONES				SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD
		EJE	TRAMO	ANCHO	ALTURA	LONGITUD	FZA			
4	Suministro y colocación de base hidráulica 1 1/2 a finos, compactada al 95% de su psvm por medios mecánicos, incluye material, mano de obra, nivelación, acarreo del material, incorporación de humedad óptima del material, tendido, compactado, afinado, sobre espesores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0+000	0+020	7.20	0.15	20.00		21.60	109.08	M3
		0+020	0+040	7.20	0.15	22.00		21.60		
		0+040	0+060	7.20	0.15	20.00		21.60		
		0+060	0+080	7.20	0.15	20.00		21.60		
		0+080	0+091	7.20	0.15	11.60		11.28		
		0+091	0+101	7.20	0.15	10.60		10.80		
5	Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 tma 1 1/2" de 15 cms de espesor, curado con membrana base agua con aspersor, incluye colado, vibrado, cimbra metálica de primera, longitudinal sin machiembrar en fronteras, acabado texturizado con rallador de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0+000	0+020	7.20		20.00		144.00	351.20	M2
		0+020	0+040	7.20		20.00		144.00		
		0+040	0+060	7.20		20.00		144.00		
		0+060	0+080	0.00		20.00		0.00		
		0+080	0+091	0.00		11.00		0.00		
		0+091	0+101	0.00		3.90		0.00		
11	Excavación en cepa por medios mecánicos en terreno tipo III incluye, acarreo internos y externos a bancos propuestos por el contratista y autorizados por la supervisión, afine de taludes y fondos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, arena de 10 cm de espesor, para alojar y nivelar tubería, incluye carga, acarreo y descarga del	0+000	0+020	0.60	0.50	20.00		7.20	36.36	M3
		0+020	0+040	0.60	0.50	20.00		7.20		
		0+040	0+060	0.60	0.50	20.00		7.20		
		0+060	0+080	0.60	0.50	20.00		7.20		
		0+080	0+091	0.60	0.50	11.60		3.96		
		0+091	0+101	0.60	0.50	10.00		3.60		
12	Suministro, colocación y prueba de tubería de pvc hidráulico RD-26 de 2", incluye mano de obra calificada, acarreo y maniobras de los materiales, los requerimientos del organismo operador de agua potable tanto en línea con en tomas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0+000	0+020			20.00		20.00	101.00	ML
		0+020	0+040			20.00		20.00		
		0+040	0+060			20.00		20.00		
		0+060	0+080			20.00		20.00		
		0+080	0+091			11.00		11.00		
		0+091	0+101			10.00		10.00		
3	Acostillado de arena hasta 15 cm por encima de lomo de tubo, incluye: carga, acarreo y descarga del material, acomodo del material, afine, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0+000	0+020	0.60	0.15	20.00		1.80	9.09	M3
		0+020	0+040	0.60	0.15	20.00		1.80		
		0+040	0+060	0.60	0.15	20.00		1.80		
		0+060	0+080	0.60	0.15	20.00		1.80		
		0+080	0+091	0.60	0.15	11.00		0.99		
		0+091	0+101	0.60	0.15	10.00		0.90		

J

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
	UBICACION:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCES		
	No. CONTRATO:	AO-EST-245880009-4-2023		FISICO	FINANCIERO	
	CONTRATISTA:	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		67.31%	77.12%	
	FONDO:	FISM				
No. ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023		HOJA:	1	DE 1

GENERADORES DE OBRA

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		DIMENSIONES				SUBTOTAL	TOTAL	UNIDAD	
		EJE	TRAMO	ANCHO	ALTURA	LONGITUD	PZA				
14	Toma domiciliar a 2.00 mts con tubería de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2", incluye: conexión, mano de obra calificada, acarreo y maniobras de los materiales, abrazadera de toma con salida de 1/2", 3 adaptadores de aluminio Pe al Pe 1/2", 40 cm de tubo de pvc sanitario de 4". Tapa registro de banquetta, llave de banquetta de Pe al Pe ranurado, demolición de muro, resane del mismo y conexiones a medidor existente, excavaciones, cama de arena de 10 cm de espesor, relleno con material producto de la excavación, carga y acarreo del material sobrante, todo de acuerdo al proyecto, los trabajos deberán cumplir con las especificaciones del organismo operador de agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0+000	0+020					4	4.00	19.00	PZA
		0+020	0+040					4	4.00		
		0+040	0+060					4	4.00		
		0+060	0+080					4	4.00		
		0+080	0+091					3	3.00		
15	Relleno compactado por medios mecanicos en capas de 20 cm, utilizando material producto de la excavación seleccionado, incluye carga, acarreo y descarga del material y compactado al 90% de su PVS.M.	0+000	0+020	0.50	0.35	20.00		4.20	21.21	M3	
		0+020	0+040	0.50	0.35	20.00		4.20			
		0+040	0+060	0.50	0.35	20.00		4.20			
		0+060	0+080	0.50	0.35	20.00		4.20			
		0+080	0+091	0.50	0.35	11.00		2.31			
		0+091	0+101	0.50	0.35	10.00		2.10			
16	Caja de valvulas de 1.20x1.00x0.60 m (int) de tabicon 13 cm junteado con mortero cemento arena 1:4 acabado pulido, plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, incl. Cuadro de 40x40 cms de grava de 3/4" al centro de caja de valvula, losa armada de 15 cm con varilla de 3/8" @ 10 cm en ambos sentidos, concreto f'c=250 kg/cm2, contramarco canal de 4", marco y tapa de fierro vaciado, valvula compuerta de 2" de diametro vastago fijo, cuerpo bridado, 2 empaques de neopreno 2", 2 extremidades pvc hidraulico de 2", tornillo de 5/8x21/2" con tuercas y rondanas, incluye excavacion y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0+000	0+020					0.00	1.00	PZA	
		0+020	0+040					0.00			
		0+040	0+060					0.00			
		0+060	0+080					0.00			
		0+080	0+091					0.00			
		0+091	0+101					1			1.00




C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.
RESIDENTE:

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.			AVANCE	
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-4-2023			FISICO	FINANCIERO
	CONTRATISTA:	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ			67.31%	77.12%
No. ESTIMACION	FONDO:	FISM			HOJA:	1 DE 2
	PERIODO DE EST:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023				

REPORTE FOTOGRAFICO

RED DE AGUA POTABLE

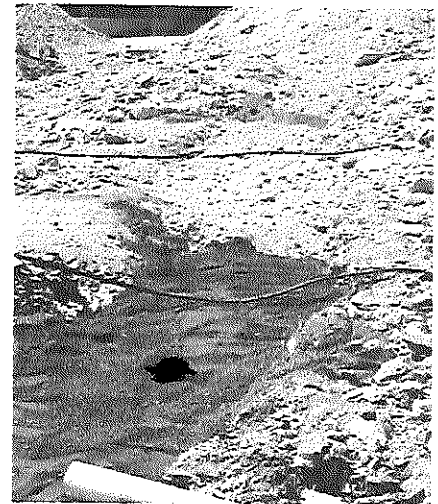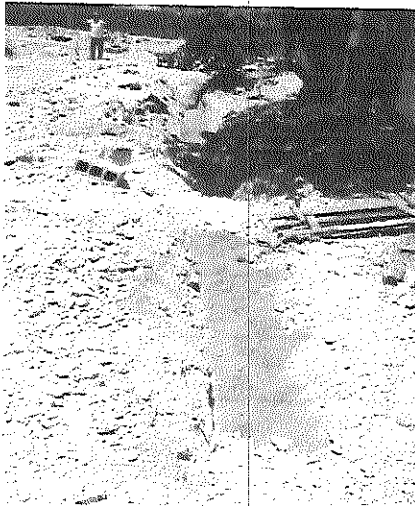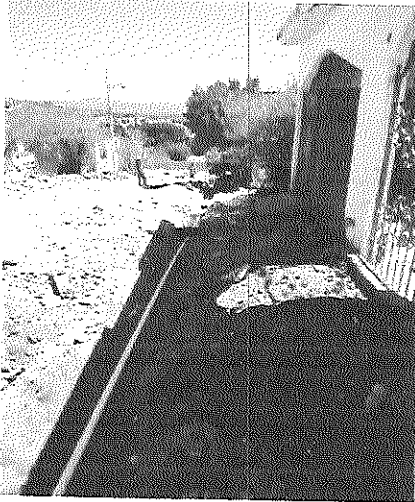

AGS
C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRATISTA



LEAO, RICARDO GALVÁN GALVÁN,

RESIDENTE:

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023			
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.			AVANCE			
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-4-2023			FISICO	FINANCIERO		
	CONTRATISTA:	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ			67.31%	77.12%		
No. ESTIMACION	FONDO:	FISM			HOJA:	1	DE	2
	PERIODO DE EST:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023						

REPORTE FOTOGRAFICO

Suministro y Colocacion de base hidráulica 1 1/2 a finos, compactada al 95% de su PVSM, por medios mecanicos.

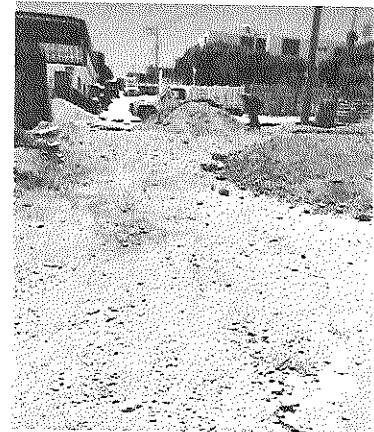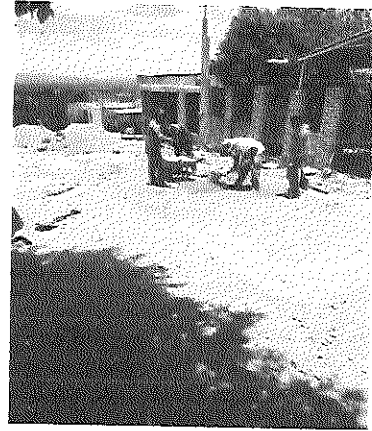

[Handwritten Signature]
C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRATISTA



LEAO, RICARDO GALVÁN GALVÁN.

RESIDENTE:

2	OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRÓN, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COLONIA PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
	UBICACIÓN:	CERRITOS, S.L.P.		AVANCE		
	No. CONTRATO:	AO-EST-245800009-4-2023		FISICO	FINANCIERO	
No. ESTIMACION	CONTRATISTA:	C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ		67.31%	77.12%	
	FONDO:	FISM		HOJA:	2	DE 2
	PERIODO DE EST:	DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023				

REPORTE FOTOGRAFICO

Suministro y Colocacion de concreto hidraulico $f_c=250$ kg/cm² de 15 cms de espesor

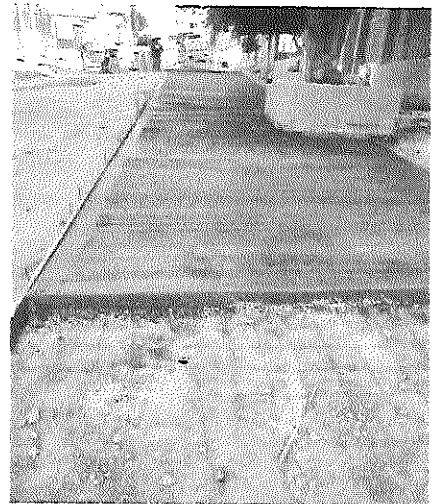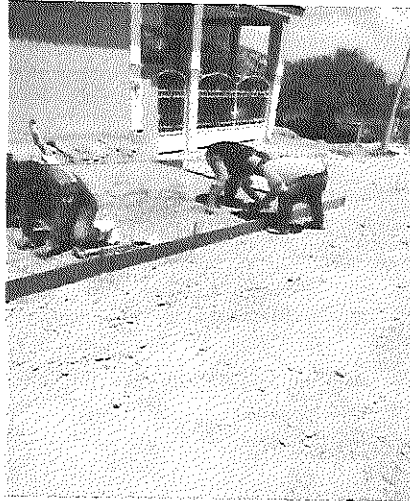

C. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRATISTA

LEAO, RICARDO GALVÁN GALVÁN.

RESIDENTE.
