

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:


En este día se dieron por iniciados los trabajos de "Ampliación de red de distribución de agua Potable en calle 5 de Mayo" en la localidad de La Trinidad, iniciando con el trazo para la colocación de la tubería así como de las tomas a colocar.

CROQUIS:

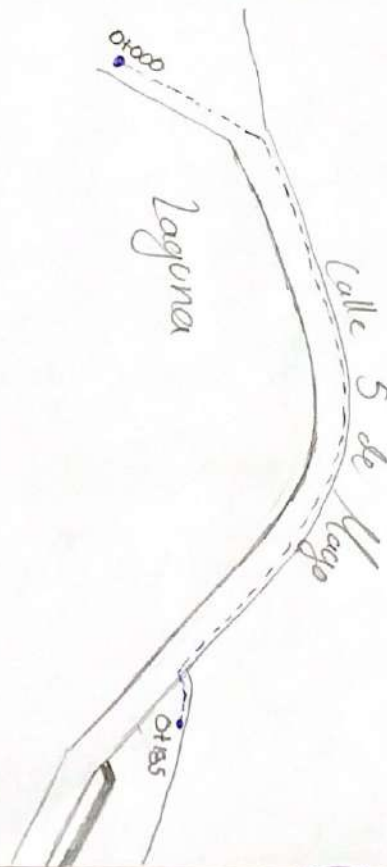


ING. MIGUEL ÁNGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


Alexander
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:


DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.
 OBRA Y/O ACCION:
 METAS: UNIDAD:
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA:
 FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En este día se realizan trabajos de excavación por medios mecánicos para terreno tipo II y realizando el afine de la misma por medios manuales. Además de sus acarreos respectivos

CROQUIS:

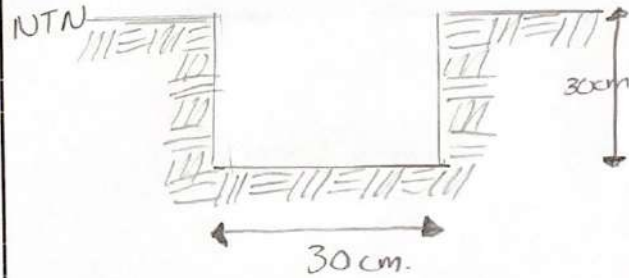

[Signature]
 ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 Y OBRAS PUBLICAS

[Signature]
 ING. NARIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO : SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA
LOCALIDAD: LA TRINIDAD

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 30 Junio 2023 FOLIO: 03


DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO. MSC-R33-FISM-AD6/SC/04/0C/06-23
OBRA Y/O ACCION: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO"
METAS: 185 ML UNIDAD: Metro lineal
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 22 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 07 DE JULIO DE 2023

NOTAS:

Para estos dias se realizan los trabajos de plantilla o cama de arena para recibir el tubo de conducción con un espesor aproximado de 10cm. para despues hacer el tendido de tubo de 2" con campana.

CROQUIS:

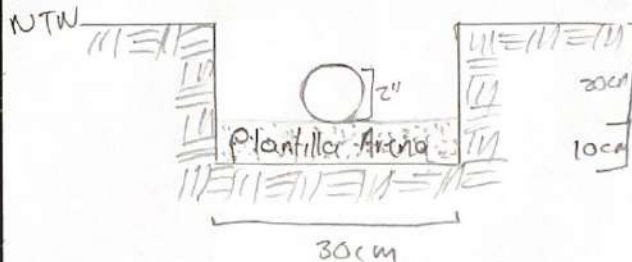

Miguel Angel Mata Mata
ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

Nahit Emmanuel Rojas Mejia
ING. NAHIT EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

Alexander V
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:



FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

Para esta fecha se realizan los trabajos de reconexión de las tomas domiciliarias ubicadas sobre la misma calle para continuar con el acostillado del tubo con arena hasta 15 cm por encima del mismo

CROQUIS:

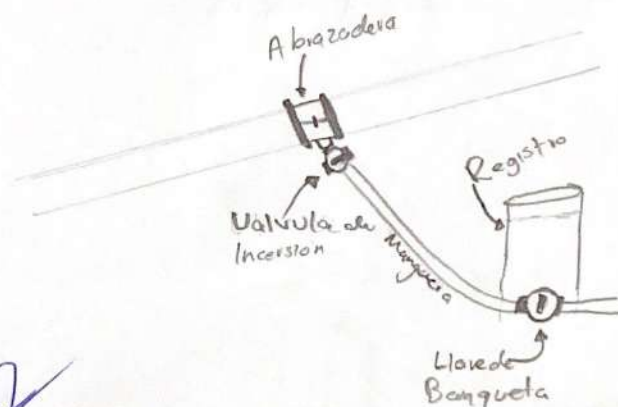


ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En este día se dan por terminados los trabajos de la obra "Ampliación de red de Distribución de agua Potable en calle 5 de Mayo" Culminando con la colocación de la placa con información alusiva a la obra.

CROQUIS:

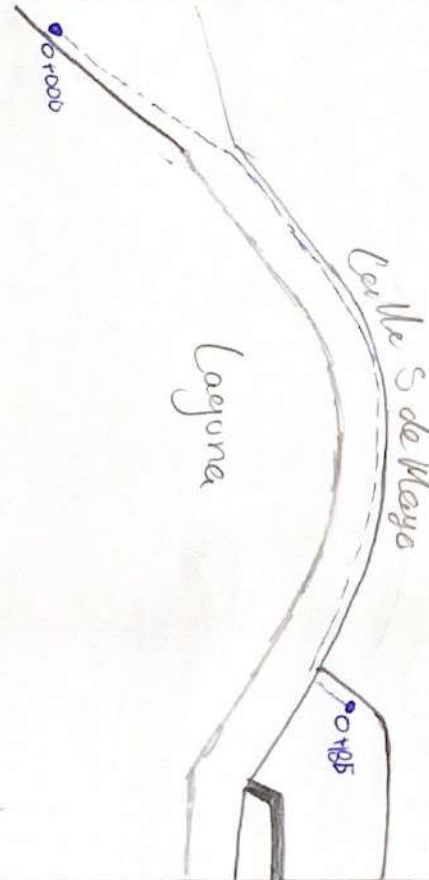

ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

ALEXANDER H.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
