



No. Contrato. IR-INFED-PC-06-2023

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IR-INFED-PC-06-2023**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **Salinas**, municipio de **Salinas de Hidalgo** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **24 de Mayo del 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **Escuela Secundaria JESUS SILVA HERZOG** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTTEL, Escuela Secundaria JESUS SILVA HERZOG, con clave de centro de trabajo 24DES0106T, Salinas, Salinas de Hidalgo, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **IR-INFED-PC-06-2023** es de **\$764,724.86**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **IR-INFED-PC-06-2023** es de **\$128.39**
- **Importe Total: \$764,853.25**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **16 de Febrero del 2023**

Fecha de terminación: **24 de Mayo del 2023**

Plazo de ejecución: **98 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **16 de Febrero del 2023**

Fecha de terminación: **24 de Mayo del 2023**

Plazo de ejecución: **98 días naturales**



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	16 Febrero al 16 Marzo del 2023	\$113,199.31	\$18,111.89	\$131,311.20	
02	17 Marzo al 11 Abril del 2023	\$236,748.79	\$37,879.81	\$274,628.60	
03	12 de Abril al 12 Mayo del 2023	\$222,895.44	\$35,663.27	\$258,558.71	
04	13 al 18 de Mayo del 2023	\$27,742.09	\$4,438.73	\$32,180.82	
05 EXCD FINIQUITO	19 al 24 de Mayo del 2023	\$8,770.62	\$9,403.30	\$68,173.92	
TOTAL		\$659,356.25	\$105,497.00	\$764,853.25	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **C. JORGE CHAVEZ GODINEZ** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Planteo.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.


- Plano General (de conjunto) del Planteo.



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., Fianza No. 2767102 de fecha 13 de Febrero del 2023.

ORGANISMO ESTATAL



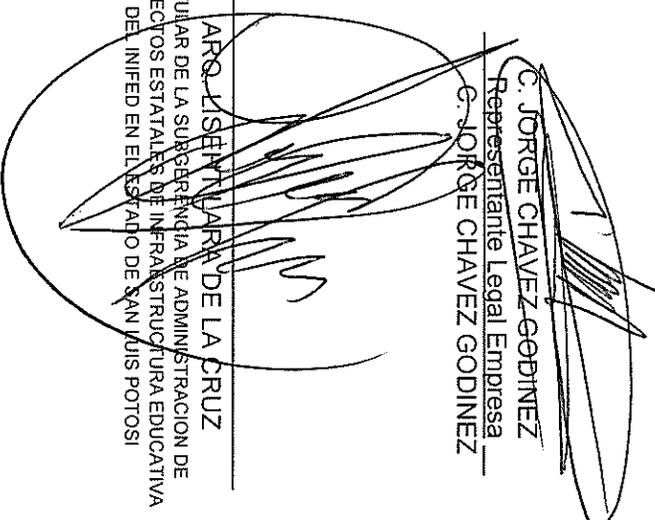
Organismo Responsable de la INFE
LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

CONTRATISTA



C. JORGE CHAVEZ GODINEZ
Representante Legal Empresa
G. JORGE CHAVEZ GODINEZ

TESTIGOS


Representante del CEPS
Santiago Reduizquez Esquivel


AROLISENTI JARA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBSARANGIA DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL INFED EN EL ESTADO DE SAN JUIS POTOSI

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IR-INFED-PC-06-2023 de fecha 24 de Mayo del 2023.





No. Contrato. IR-INIFED-PC-03-2023-C

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IR-INIFED-PC-03-2023-C.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **LA BARRANCA**, municipio de **SANTA CATARINA** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día 26 ABRIL 2023, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la **PRIMARIA MIGUEL HIDALGO** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, con clave de centro de trabajo 24DPB0012K, LA BARRANCA, SANTA CATARINA, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IR-INIFED-PC-03-2023-C es de **\$328,824.19**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IR-INIFED-PC-03-2023-C es de **\$3,182.73**
- **Importe Total: \$332,006.92**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **24 DE MAYO 2023**

Plazo de ejecución: **98 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **26 DE ABRIL 2023**

Plazo de ejecución: **69 DIAS DIAS NATURALES**

Celso Medina Medina



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	16 AL 28 DE FEBRERO 2023	\$15,936.68	\$2,549.87	\$18,486.55	
02	01 AL 31 DE MARZO 2023	\$169,108.58	\$27,057.37	\$196,165.95	
03	01 AL 14 ABRIL 2023	\$44,449.96	\$7,111.99	\$51,561.95	
04 EXCD FINIQUITO	15 AL 26 ABRIL 2023	\$56,717.65	\$9,074.82	\$65,792.47	
TOTAL		\$286,212.87	\$45,794.05	\$332,006.92	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

Celso Medina Medina.


[Handwritten signature]



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., FIANZA No. 1754798 de FECHA 13 FEBRERO 2023.

ORGANISMO ESTATAL

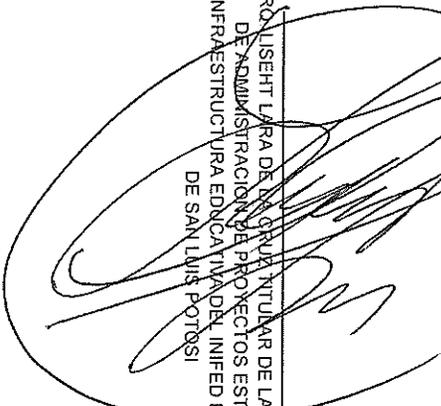

Organismo Responsable de la INFE
ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA

TESTIGOS

Celso Medina Medina
Representante del CEPS

CONTRATISTA


ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA
Representante Legal Empresa
ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA


ARQ. LISEHT LARA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBGERENCIA
DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESTATALES DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IR-INIFED-PC-03-2023-C de fecha 26 ABRIL 2023.



No. Contrato. IO-924037999-E33-2022-B

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-924037999-E33-2022-B.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de San Luis Potosí, municipio de San Luis Potosí del estado de San Luis Potosí, siendo las **10:00 horas**, del día 28 Febrero 2023, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, con clave de centro de trabajo 24MSU0011E, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E33-2022-B es de **\$2,863,819.57**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IO-924037999-E33-2022-B es de **\$20,795.87**
- **Importe Total: \$2,884,615.38**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **22 DE JULIO 2022**

Fecha de terminación: **28 OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo Diferimiento por pago tardío anticipo.

Fecha de inicio: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Fecha de terminación: **09 DICIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de diferimiento.

Fecha de inicio: **10 DICIEMBRE 2022**

Fecha de terminación: **03 ENERO 22023**

Plazo de ejecución: **25 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de diferimiento.

Fecha de inicio: **04 ENERO 2023**

Fecha de terminación: **27 ENERO 22023**

Plazo de ejecución: **23 DIAS NATURALES**



Conforme al periodo de diferimiento.
Fecha de inicio: 28 ENERO 2023
Fecha de terminación: 03 MARZO 2023
Plazo de ejecución: 35 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: 22 DE JULIO 2022
Fecha de terminación: 28 DE FEBRERO 2023
Plazo de ejecución: 221 DIAS NATURALES

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	02 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	\$209,140.72	\$33,462.52	\$242,603.24	
02 EXCD	01 AL 30 OCTUBRE 2022	\$300,051.66	\$48,008.27	\$348,059.93	
03	01 AL 15 NOVIEMBRE 2022	\$362,328.71	\$57,972.59	\$420,301.30	
04	16 AL 30 NOVIEMBRE 2022	\$381,528.85	\$61,044.62	\$442,573.47	
05 EXCD	16 AL 30 NOVIEMBRE 2022	\$344,389.03	\$55,102.24	\$399,491.27	
06	01 AL 08 DICIEMBRE 2022	\$711,007.57	\$113,761.21	\$824,768.78	
07 EXDT FIN	09 DICIEMBRE 2022 AL 28 FEBRERO 2023	\$178,290.85	\$28,526.54	\$206,817.39	
TOTAL		\$2,486,737.39	\$397,877.99	\$2,884,615.38	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **IMPROQ CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

[Handwritten signatures and initials]



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INFED
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO



POTOSÍ
MUNICIPALIDAD DE POTOSÍ

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., FIANZA No. 3658-09049-8 de FECHA 20 DE JULIO 2022.

ORGANISMO ESTATAL

Organismo Responsable de la INFE
ING. NINFA EDITH LOPEZ FLORES

CONTRATISTA

ING. JUAN JACINTO QUINTERO ZAVALA
Representante Legal Empresa
IMPROQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

AÑO. LISEHT DAVILA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL INFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IO-924037999-E33-2022-B de fecha 28 Febrero 2023.
