



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE MINA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 158.90 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PEAD 10", 1 DESCARGA, 1 REGISTRO DOMICILIARIO Y
1 POZO DE VISITA.

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-3-2024

IMPORTE: \$338,604.23

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: \$

REDUCCION: \$

CONTRATISTA: GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

FECHA DE INICIO: 4 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINO: 2 de abril de 2024

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

☐

COPIAS DEL CONTRATO

☐

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ


GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA



JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS,S.L.P

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE MINA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 158.90 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PEAD 10", 1 DESCARGA, 1 REGISTRO DOMICILIARIO Y 1 POZO DE VISITA.

CONTRATO NO: AO-EST-245800009-3-2024

IMPORTE: \$338,604.23

MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATISTA:

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

FECHA DE INICIO:

4 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINO:

2 de abril de 2024

[illegible]

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Vo. Bo.

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

1

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE MINA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-3-2024

FECHA: 04 DE MARZO DE 2024 AL 02 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Lunes, 04 de Marzo de 2024

El día de hoy se hizo entrega de los planos y puesta a disposición del lugar al contratista para el inicio de la obra.


Martes, 05 de Marzo de 2024

En la calle privada de Mina el día de hoy se comenzó con los trabajos de corte en el pavimento, trazo y nivelación de la línea de drenaje.

Miercoles, 06 de Marzo de 2024

En la visita del día de hoy se observaron trabajos correspondientes a la excavación en cega, con una zanja de 1.00 mt x 0.776 mts

Zanja para Drenaje:

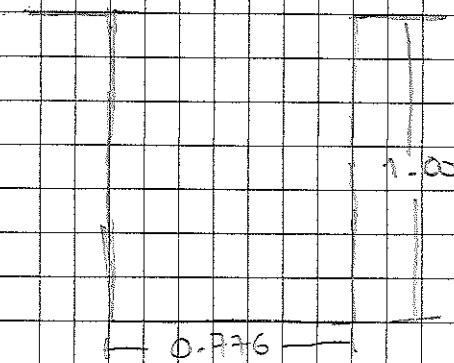

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

2

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE MINA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-3-2024

FECHA: 04 DE MARZO DE 2024 AL 02 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Viernes, 08 de marzo de 2024
En la vista del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al suministro y colocación de plantilla o cama de arena, para recibir tubería.

Lunes, 11 de marzo de 2024
El día de hoy visitando la calle privada de Mina se observaron los trabajos correspondientes a la construcción de los pozos de vista con 1.20 mts en la base y 0.60 mts en la parte superior del mismo, construido con tabicon.

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

3

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE MINA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-3-2024

FECHA: 04 DE MARZO DE 2024 AL 02 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Miercoles, 13 de marzo de 2024
Visitando la calle el día de hoy se
observo los trabajos correspondientes
al suministro y colocación de la
tubería de polietileno de alta densidad
de 10", al igual que la construcción
de registro domiciliario y descarga
domiciliaria.

Viernes, 15 de marzo de 2024
En la visita del día de hoy se
observaron trabajos correspondientes al
acostillado de arena hasta una
profundidad de 0.21 cm desde la
Cama de arena.

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

4

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PRIV. DE MINA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: AO-EST-245800009-3-2024

FECHA: 04 DE MARZO DE 2024 AL 02 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Martes, 19 de marzo de 2024


El día de hoy visitando la obra ubicada en la calle privada de mina, se realizó el trabajo correspondiente al relleno compactado por medios mecánicos en capas de 20 cm utilizando material producto de excavación.

Jueves, 21 de marzo de 2024

En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes al suministro y colocación de concreto hidráulico como reposición en la ranja con estampado.

Martes, 26 de marzo de 2024

El día de hoy se dieron por terminados los trabajos.

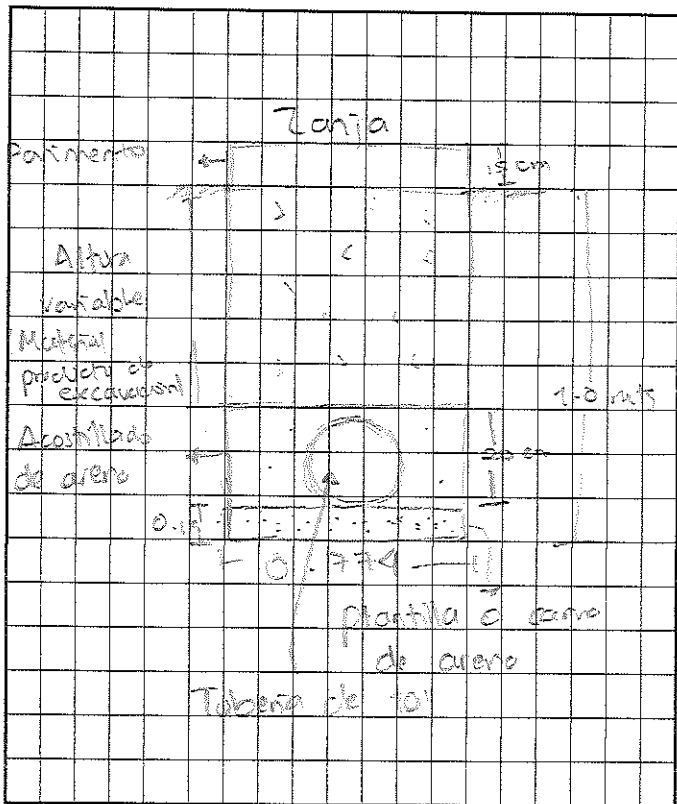

EJECUTOR

GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ
