



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA,  
S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.

MUNICIPIO: SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.  
LOCALIDAD: Cabecera Municipal  
OBRA: Construcción de drenaje sanitario en calle Santa Clara

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

27/Julio/19

Se inicio el tazo y nivelación del terreno para la introducción de tubería de 10" en las tramos que comprenda las calles Santa Clara, Santa Rosa, San Miguel y Carretera Jalpan-Rioverde



EJECUTOR

SUPERVISOR

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,  
S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO  
  
No.


**BITACORA DE OBRA 2019**

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
 LOCALIDAD: Cabecera Municipal  
 OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

28/06/19									
Se inicia con la excavación de zanja en el terreno que comprende la Calle Santa Clara, la Calle Santa Rosa y la Calle									

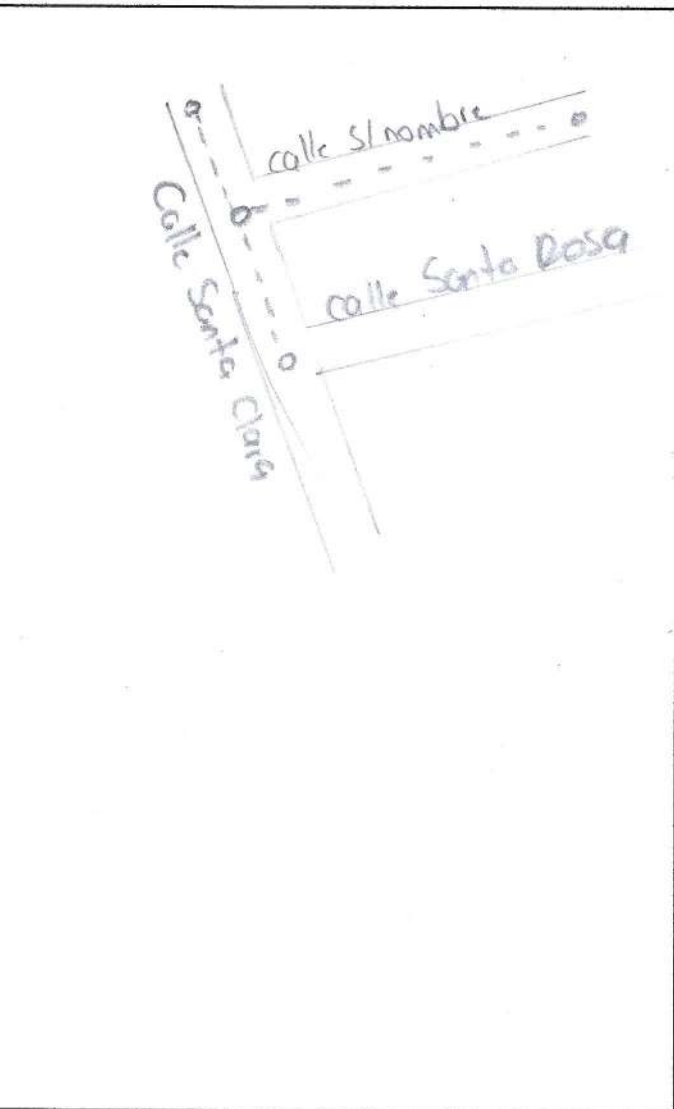

EJECUTOR  
  
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR  
  
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR  
  
NOMBRE Y FIRMA





H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO  
No.

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
LOCALIDAD: Cabecera Municipal  
OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara


DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

02/07/19

Se continuo con la excavación en zona de la Calle Santa Clara y se comenzo con el suministro y colocación de la tubería de PEAD de 10" de diametro en el trazo antes mencionado.

Carretera Jalpan - Rioverde

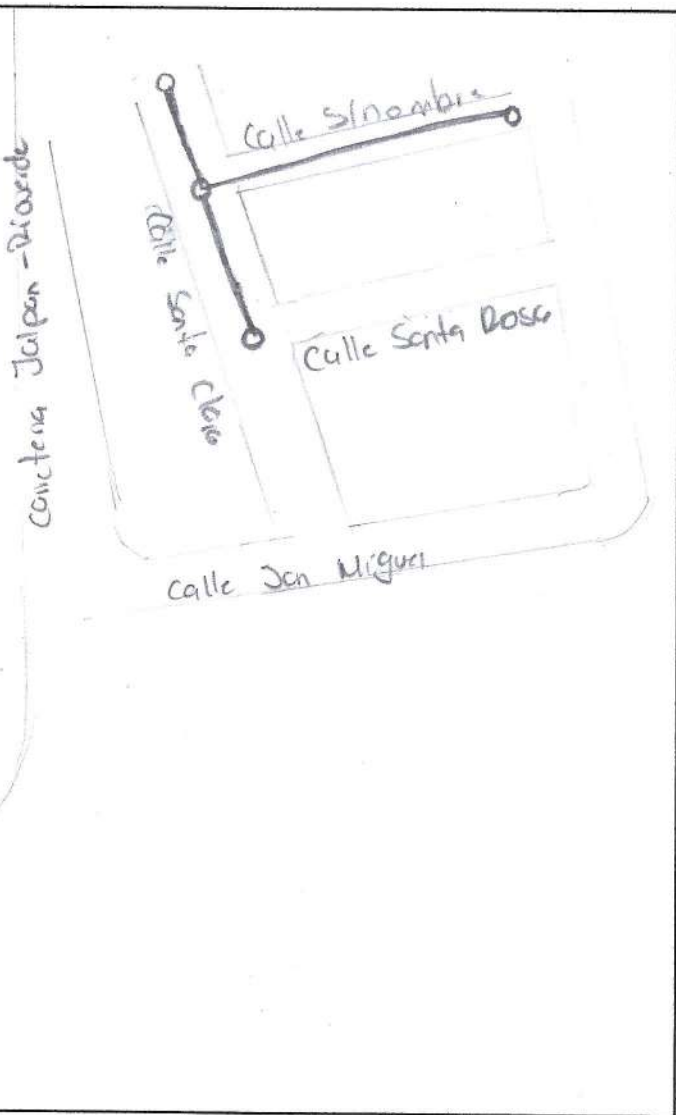

EJECUTOR

SUPERVISOR

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,  
S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019


No.

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
 LOCALIDAD: Cabeza Municipal  
 OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

05/10/19									
Se continuo con la excavacion									
en zona, asi como tambien									
con el suministro y colocacion									
de tuberias de PEAD de 10"									
de diametro y									
Se realizo prueba hidraulica									
de 3 kg/cm <sup>2</sup> en la tuberia col-									
cada del tramo de la calle Santa									
clara entre calle sin nombre y calle									
Santa Rosa y asi como tambien en									
la calle Sin nombre									

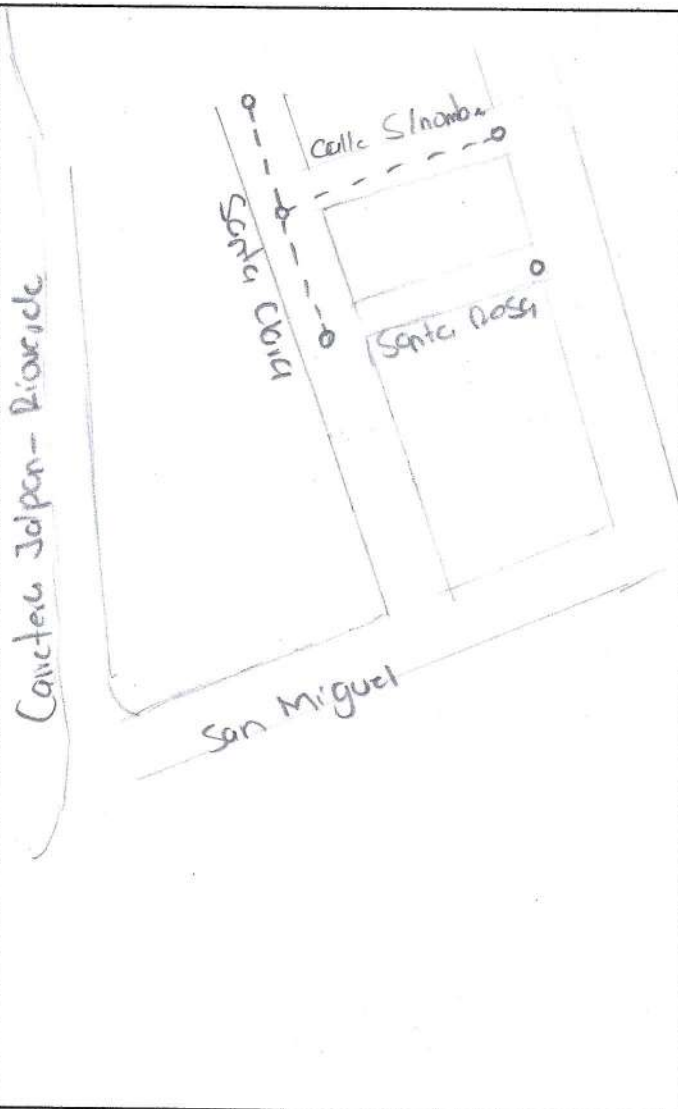

EJECUTOR  
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR  
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR  
NOMBRE Y FIRMA





H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,  
S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

**BITACORA DE OBRA 2019**

No.


MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
 LOCALIDAD: Cabecera Municipal  
 OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO**

**C R O Q U I S**

05/07/19

En esta fecha se comenzo con la construcción de zona de visita tipo cuneta hasta 1.50 y 2 m de profundidad.

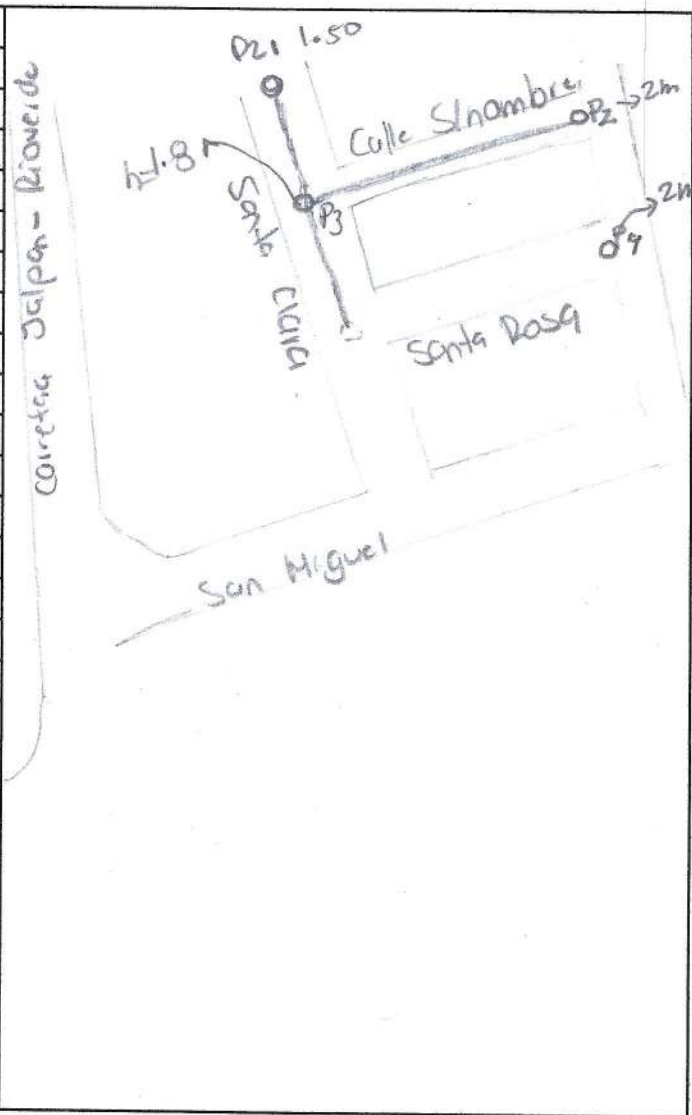

EJECUTOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,  
S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO  
  
No.

**BITACORA DE OBRA 2019**

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.  
 LOCALIDAD: Cabeza Municipal  
 OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO**      **C R O Q U I S**

09/07/19

Se continuo con la excavación en zanja en el tramo este de la calle Santa Clara entre calle Santa Rosa y la calle San Miguel.

Se realizó la prueba de hermeticidad en la calle Santa Rosa



EJECUTOR  
  
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR  
  
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR  
  
NOMBRE Y FIRMA
