



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO


No. 001

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA TRATADORA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CROQUIS
--------------------------	---------

02/Mayo/19
Con la fecha antes descrita se da apertura a la siguiente bitacora de obra.
Dando comienzo con los siguientes trabajos:
- Despalme por medios manuales del area de trabajo
- Excavacion para desahue con maquina excavadora en arroyo
Estando presentes como supervisor de obra del municipio el Ing. César Augusto de la Cruz Garcia y por parte del contratista el Ing. Rafael Sanchez Contreras

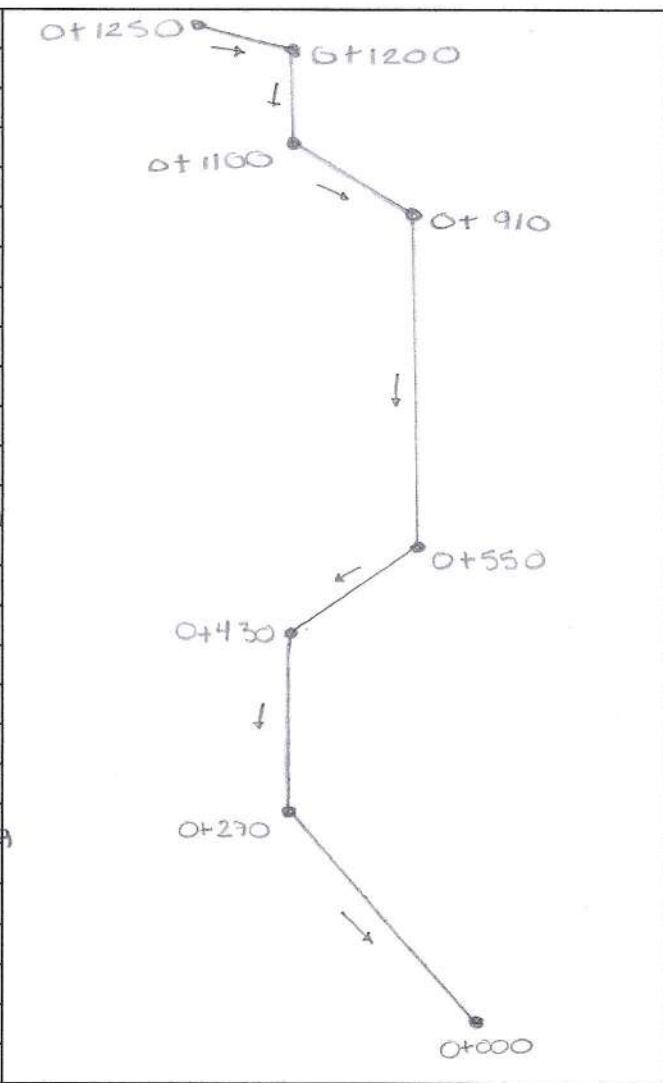

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
 [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
 [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
 [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No. 002

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA TRATADORA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES


DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CROQUIS
--------------------------	---------

09/Mayo/2019

El día de hoy se continúa con la excavación y el despolvo dentro del área de trabajo.

Hasta la fecha se han realizado el despolvo y despolvo de un total de 380 ml

No se ha presentado ninguna anomalía en el transcurso de la obra, por lo que se continúa con el despolvo del canal.

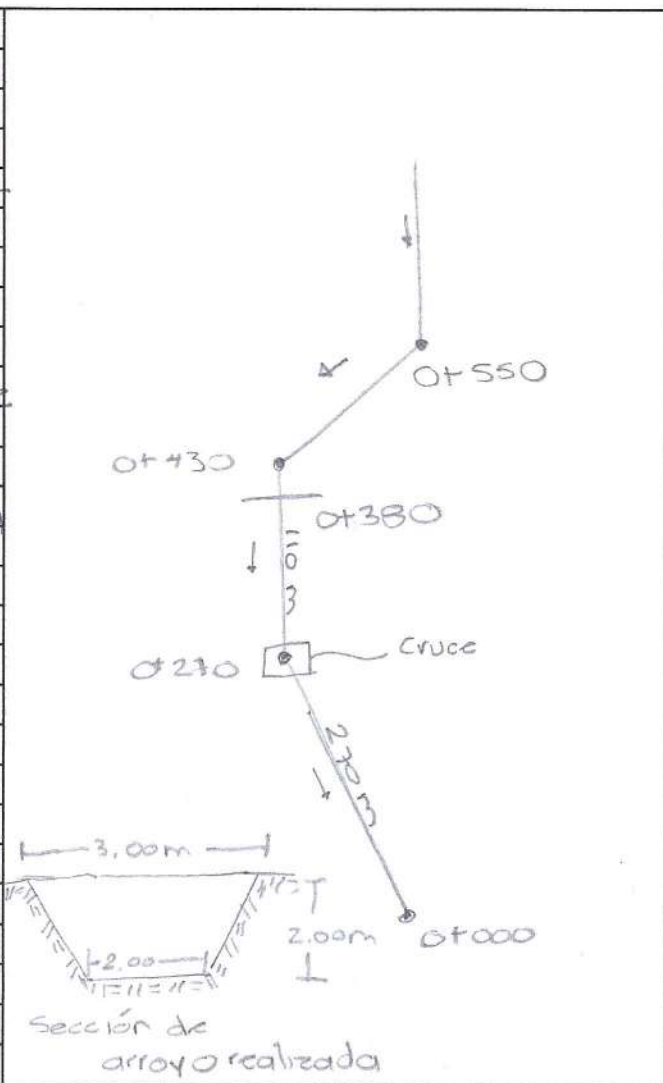

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS <i>Rosario Acosta</i> NOMBRE Y FIRMA	SUPERVISOR DE OBRA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--

SUPERINTENDENTE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA





H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO
No. 003

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
OBRA: MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA TRATADORA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO


C R O Q U I S

16/Mayo/19

Con la anterior fecha se supervisa el avance de la obra

Se lleva un avance de 679 ml generando los siguientes avances de obra

- Despalme por medios manuales un total de 2,037.00 m²
- Excavación para desolite con maquina excavadora un total de 3,395.00 m³

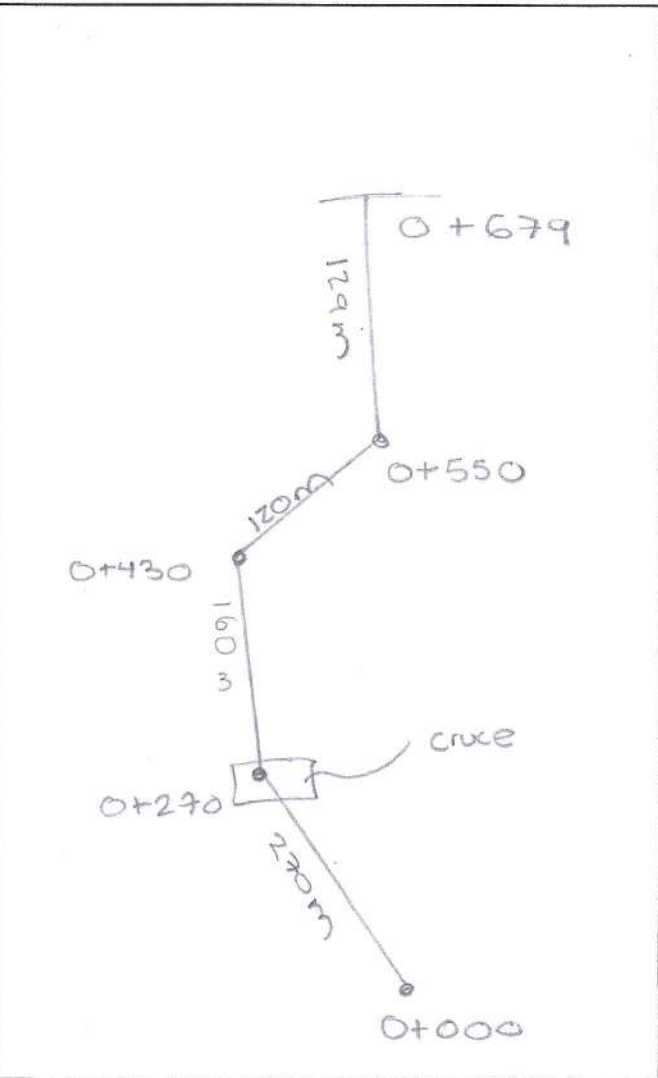

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA





H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO
No. 004

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
OBRA: MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA TRATADORA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES


DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

23/Mayo/2019

En la visita de obra del día de hoy se aprecia un avance de 750 ml.

Dentro de la excavación del arroyo se encuentra con un ramal externo el cual fue tapado para de esta manera tener un único arroyo.

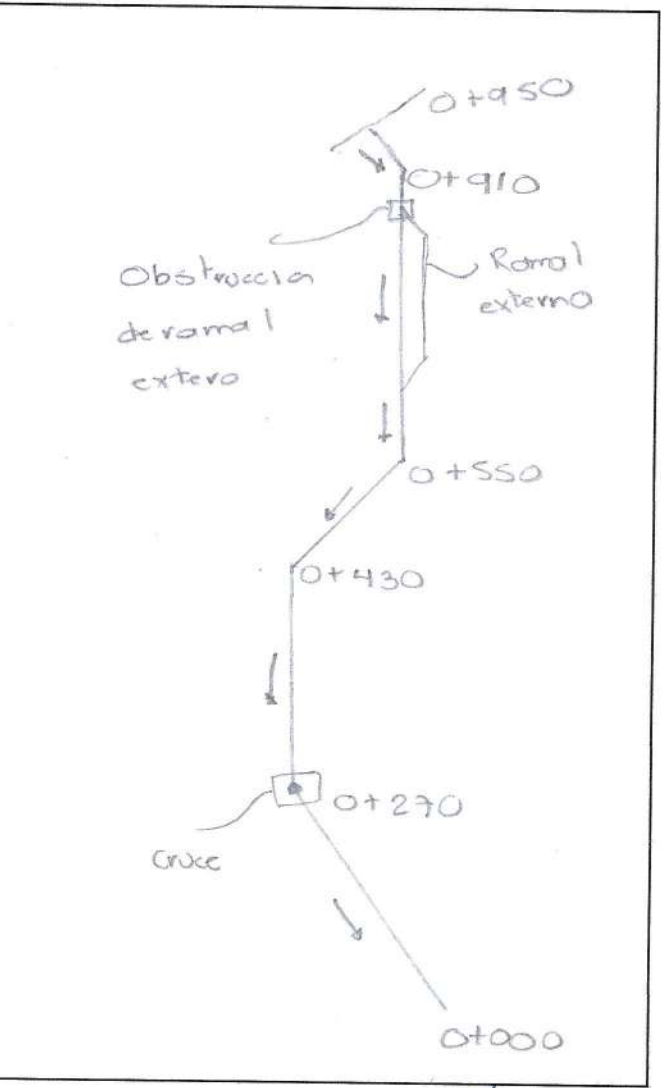

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
Rosendo Plata
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA





H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO
No. 005

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
OBRA: MANTENIMIENTO DE CANAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA TRATADORA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS


31/Mayo/2019

Durante la supervisión del día de hoy se observó un avance de aproximadamente 1200 ml, estando por concluir los trabajos establecidos en el contrato por un total de:

- 3,750m² de despalme
- 6,250m³ de excavación para desasoslar en arroyo

02/Junio/2019

Con esta fecha se dan por concluidos los trabajos de la presente obra.

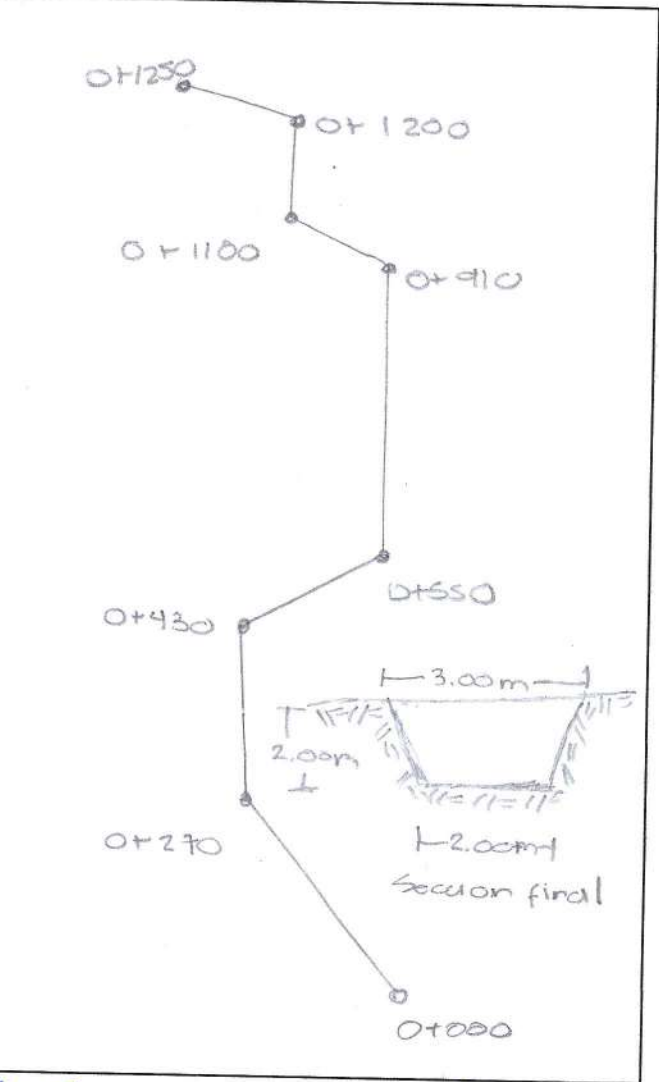

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
Rosario Arce
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

