



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

LOCALIDAD: Cabecera Municipal

OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

02/07/19

Se continuo con la excavación en zona de la Calle Santa Clara y se comenzó con el suministro y colocación de la tubería de PEAD de 10" de diametro en el dicho sitio mencionado.



EJECUTOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: Cabecera Municipal
 OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

05/10/19									
Se continuo con las excavaciones en zona, así como también con el suministro y colocación de tuberías de PEAD de 10" de diámetro.									
Se realizó prueba hidrostática de 3 kg/cm ² a la tubería colocada del tramo de la calle Santa Clara entre calle sin nombre y calle Santa Rosa, y así como también a la calle sin nombre.									



EJECUTOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.


MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
LOCALIDAD: Cabecera Municipal
OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

CROQUIS

06/07/19

Con esta fecha se comenzo con la construcción de obra de visita tipo concha hasta 1.50m 2 m de profundidad.

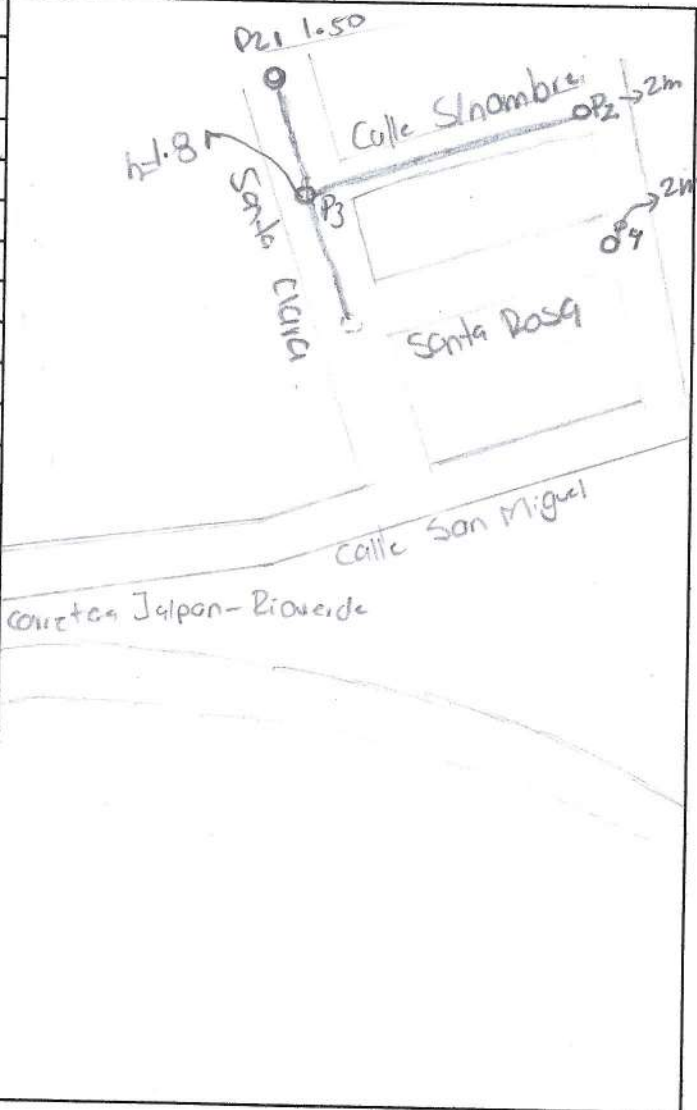

EJECUTOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO
No.


BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: **SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.**
LOCALIDAD: *Cabecera Municipal*
OBRA: *Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara*

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

09/07/19									
Se continuo con la excavación en zanja en el tiempo restante de la calle Santa Clara entre calle Santa Rosa y la calle San Miguel.									
Se realizó la prueba de permeabilidad en la calle Santa Rosa									

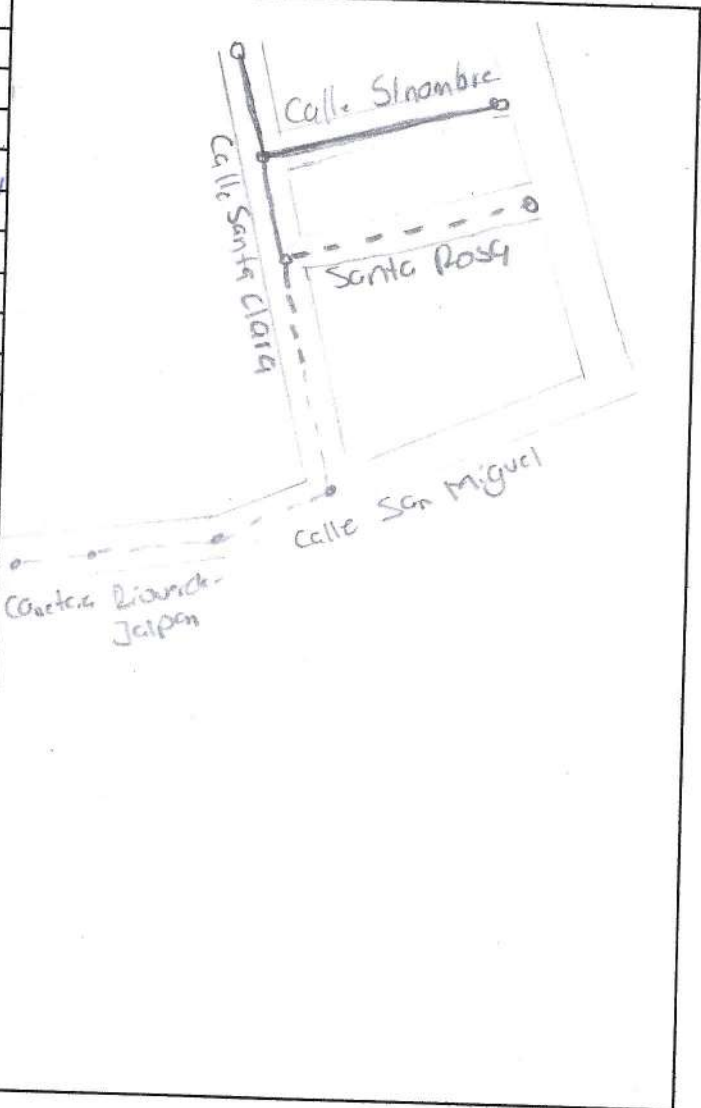

EJECUTOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.


MUNICIPIO: **SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.**
 LOCALIDAD: *Cabecera Municipal*
 OBRA: *Construcción de Drenaje Sanitario en calle Santa Clara*

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

12/ Julio/19

Se continúo con la excavación del tramo de la calle Santa Rosa a la calle San Miguel se proyecta una excavación de 4.50m aproximadamente con un tipo III a 2.5m de excavación de la zona.

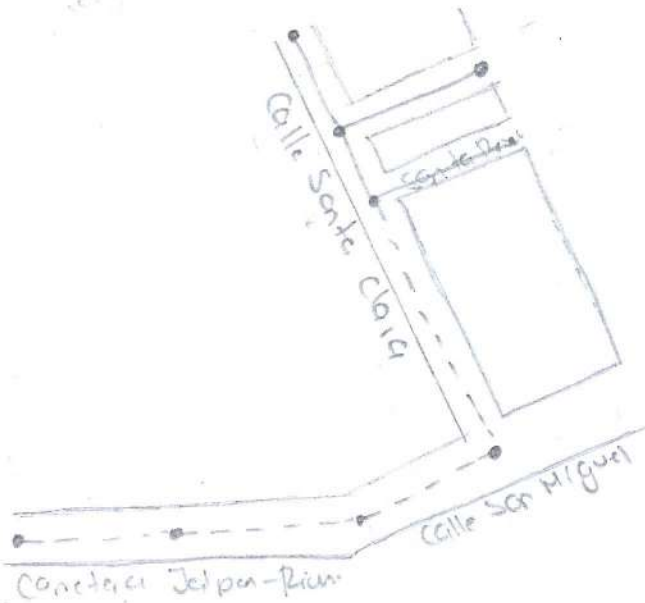

EJECUTOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.

MUNICIPIO: **SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.**

LOCALIDAD: *Cabecera Municipal*

OBRA: *Construcción de Drenaje Sanitario en calle Santa Clara*

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

16/Julio/19

Se inicia con la excavación del tramo que está ubicado a un costado de la Condesa Jalpa Rioverde con una longitud de 154.5 ml, 2 pozos de visita de 1.50 m de profundidad y otros al cadenciamiento 78.5 de 250m de profundidad.

Se han construido 10 bocanillas



EJECUTOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.


MUNICIPIO: **SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.**
 LOCALIDAD: *Cabeceza Municipal*
 OBRA: *Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara*

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

19/Julio/19

Se comenzó con el trazo y corte del terreno de la Calle San Miguel el cual se demolerán 60 m² de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, se cerrará este calle teniendo las calles Balcones Jalpon-Bouvide San Ciró y Tenochtitla como vía alterna para el tránsito.

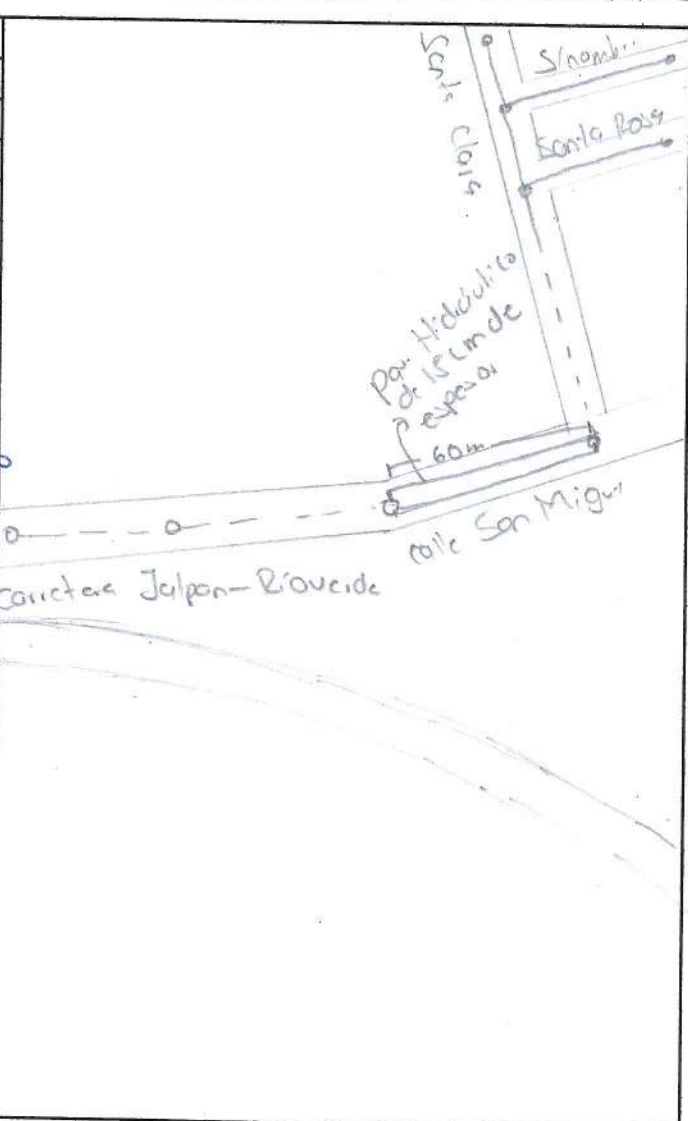

EJECUTOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO
No.

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: **SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.**
 LOCALIDAD: *Cabecera Municipal*
 OBRA: *Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara*


DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

24 Julio /19

Se continuo con la excavación del tramo que se encuentra en un costado de la Carretera Rioverde-Jalpan, se comenzó con la excavación del tramo del terreno sobre la Calle San Miguel en el cual se construye un pozo de visita de 4.50 m de profundidad.

Se realizó la prueba de hermeticidad en el tramo de la Calle Santa Rosa y San Miguel sobre calle Santa Clara.

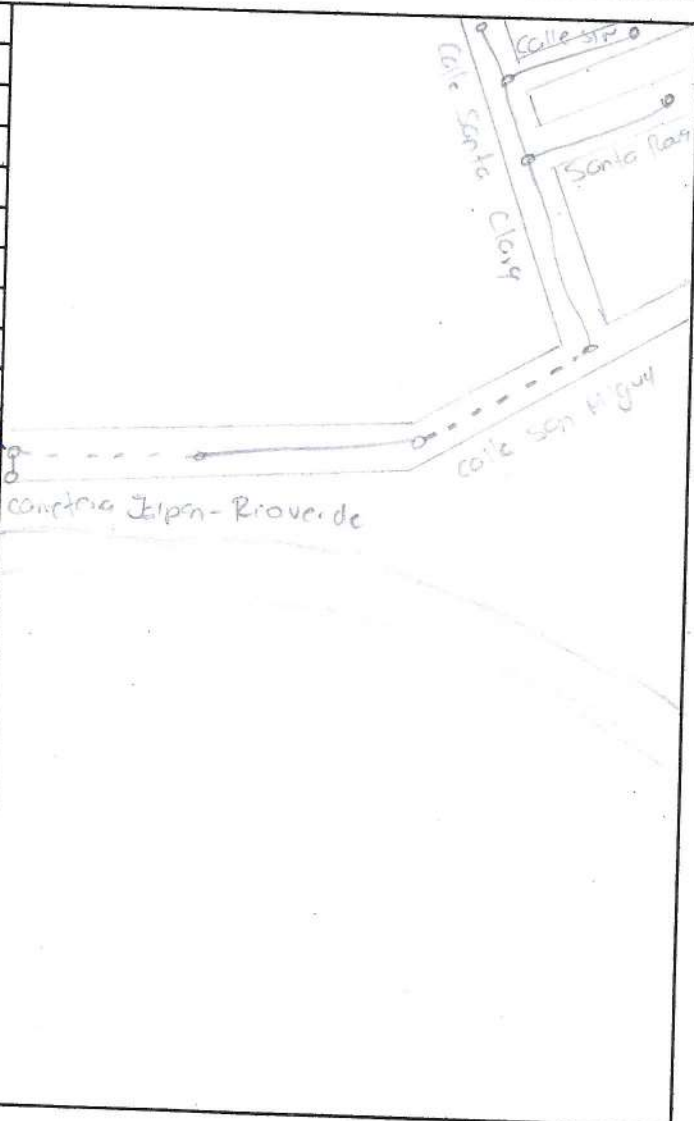

EJECUTOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No.

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
LOCALIDAD: Cabecera Municipal
OBRA: Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Santa Clara

DESCRIPCION DEL CONCEPTO


C R O Q U I S

31/ Julio / 2019

Se continuo con la excavación que esta ubicado el tramo con respecto de la carretera Rioverde - Jalpan. Se continuo con la construcción de los drenajes domiciliarios que se han construido 15 hasta el día de hoy.

Se realiza la conexión del tubo del pozo nuevo al existente ya que por la inclinación del terreno se comenzó en este tramo.

Así como también se continúa con la tubería en el tramo de la calle San Miguel entre la Calle Santa Clara y el tramo ubicado se en relación de la carretera Rioverde - Jalpan.

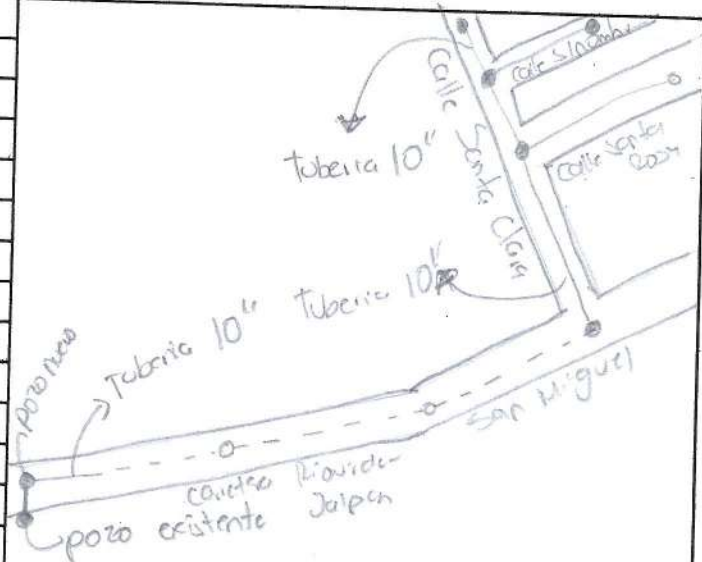

EJECUTOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA
