

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GONZALEZ CABRERA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y PINO SUAREZ.

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON LOS DE LIMPIEZA DE LA ZANJA POR MEDIOS MANUALES PARA RETIRAR ESCOMBRO Y PIEDRAS EN LA PARTE DE LA ZANJA DAÑADA ADEMAS DEL RETIRO DE LA TUBERIA COLAPSADA DE 10" DE DIAMETRO.

CROQUIS:

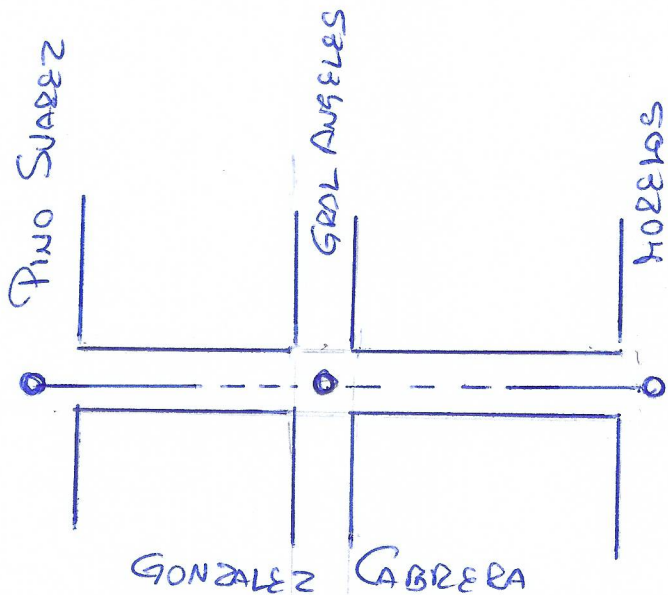

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. J JESUS HERNANDEZ GONZALEZ
SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA


ACUERDO NO.
OBRA Y/O ACCION:
METAS: UNIDAD:
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE TERMINO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS PARA AFINE DE FONDO Y TALUDES DE ZANJAS

ADEMAS SE INICIO CON EL TEJIDO Y NIVELADO DE LA PANTALLA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 10CM PARA RECIBIR TUBERIA EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE G. ANGELES Y LA CALLE MORELOS

CROQUIS:

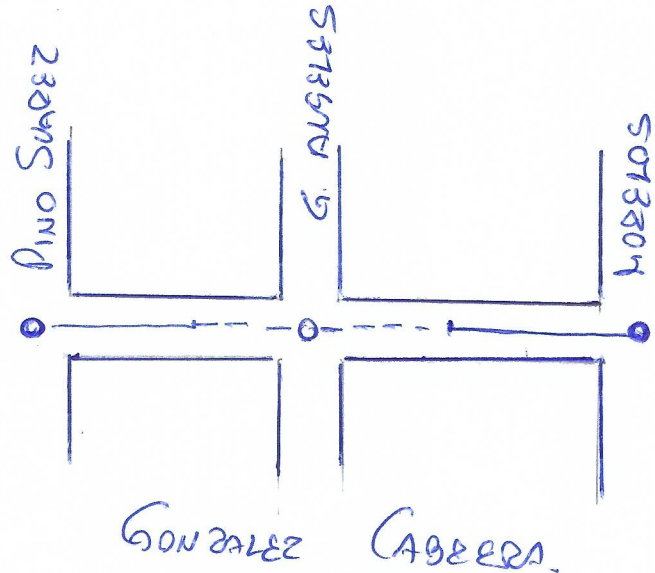

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. J JESUS HERNANDEZ GONZALEZ
SUPERINTENDENTE
