



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

No. 002

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA


DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

06/Ago/19

El día de hoy se comenzó con los trabajos de excavación por medios mecánicos dentro de la obra. Excavando un total de 66.97m^3 con una sección de 1.00 de profundidad x 0.80 de ancho. Y en las secciones de la barda una sección de 1.00 de profundidad x 1. de ancho.

Al terminar se procederá con el alicata de taludes y la consolidación de fondo de cerra con compactador de bañalina.

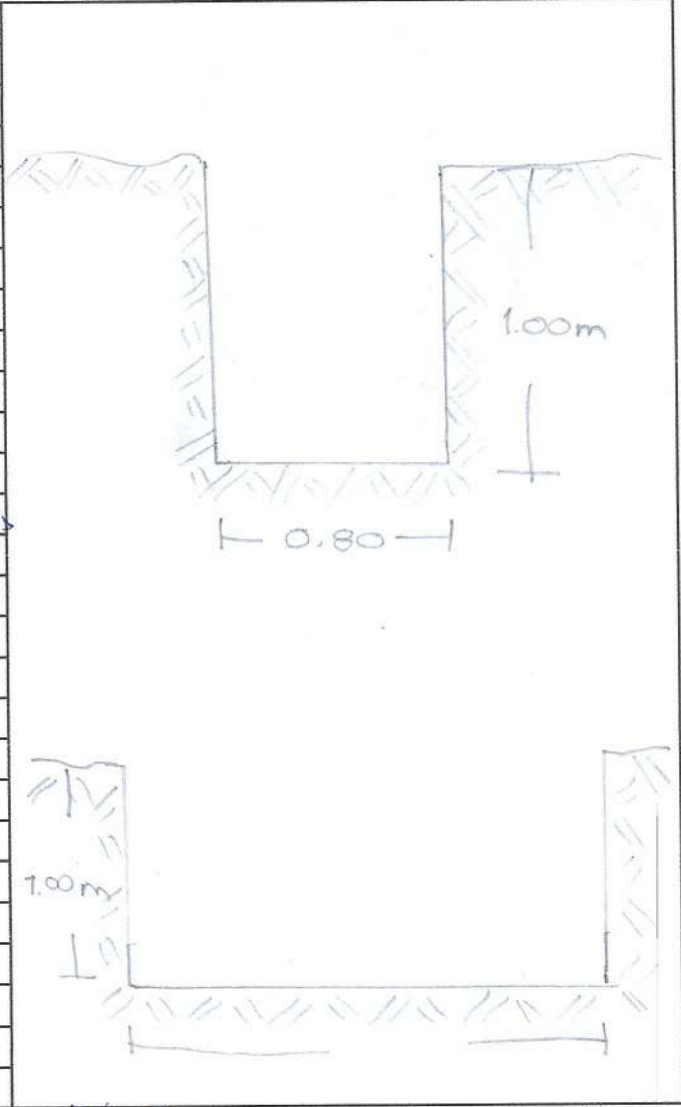

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

NO. 003

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA


DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

08/Ago/2019

Se realizaron los trabajos de colocación de base de piedra bola para base de cimentación con un espesor de 0.20m de altura.

Se deja preparado para la colocación de plantilla de concreto pobre de $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$

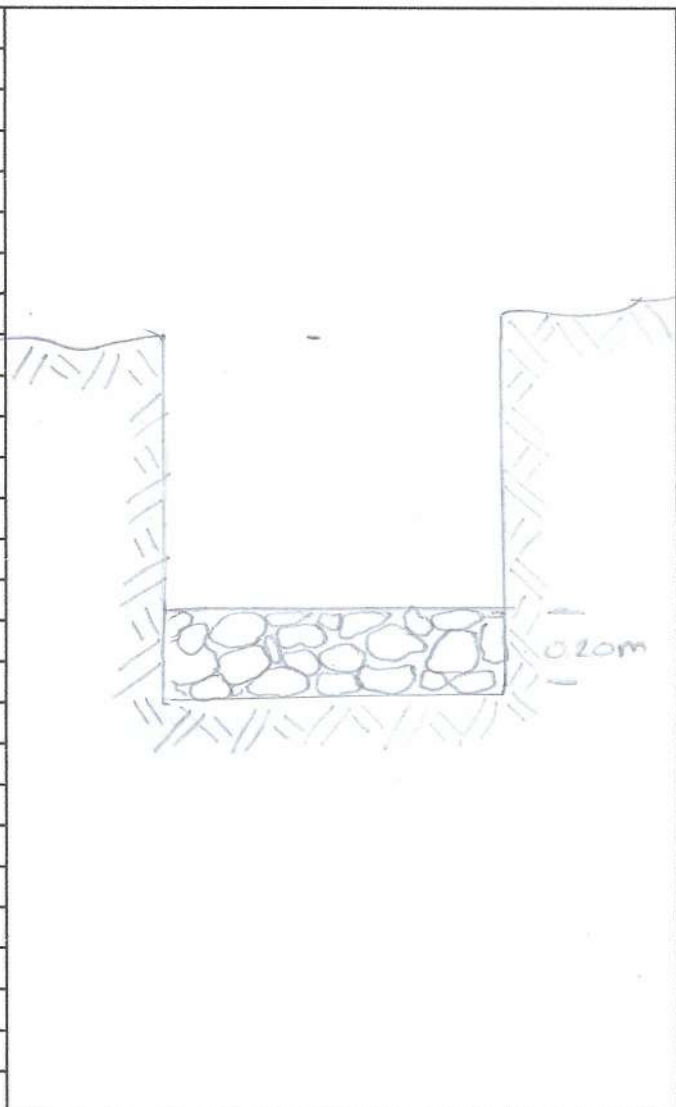

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE

NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO


BITACORA DE OBRA 2019

No. 004

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	C R O Q U I S
--------------------------	---------------

09/Ago/19
Dentro de la supervisión de la obra de hoy se realizaron los trabajos de la colocación de plantilla de concreto pobre con una $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con un espesor de 5cm.
Al igual se realizan trabajos de habilitación de acero para el refuerzo en cimentación con varilla de No. 3,

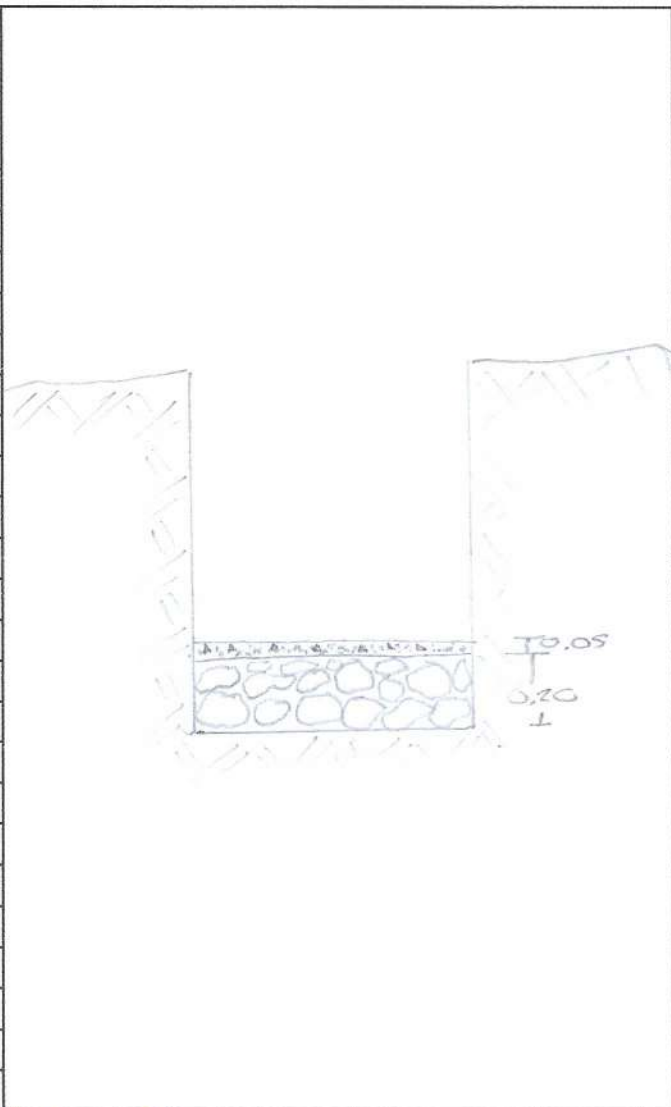

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

No. 005

BITACORA DE OBRA 2019

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA


DESCRIPCION DEL CONCEPTO	C R O Q U I S
--------------------------	---------------

13/Ago/19

Los trabajos que se encuentran realizando el día de hoy son:

La colocación de armado con varilla de No. 3 @ 20 cm por ambos sentidos en toda la barda perimetral al igual que los castillos.

Se procede a realizar la colocación de concreto hecho en obra con una $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con un espesor de 15 cm.

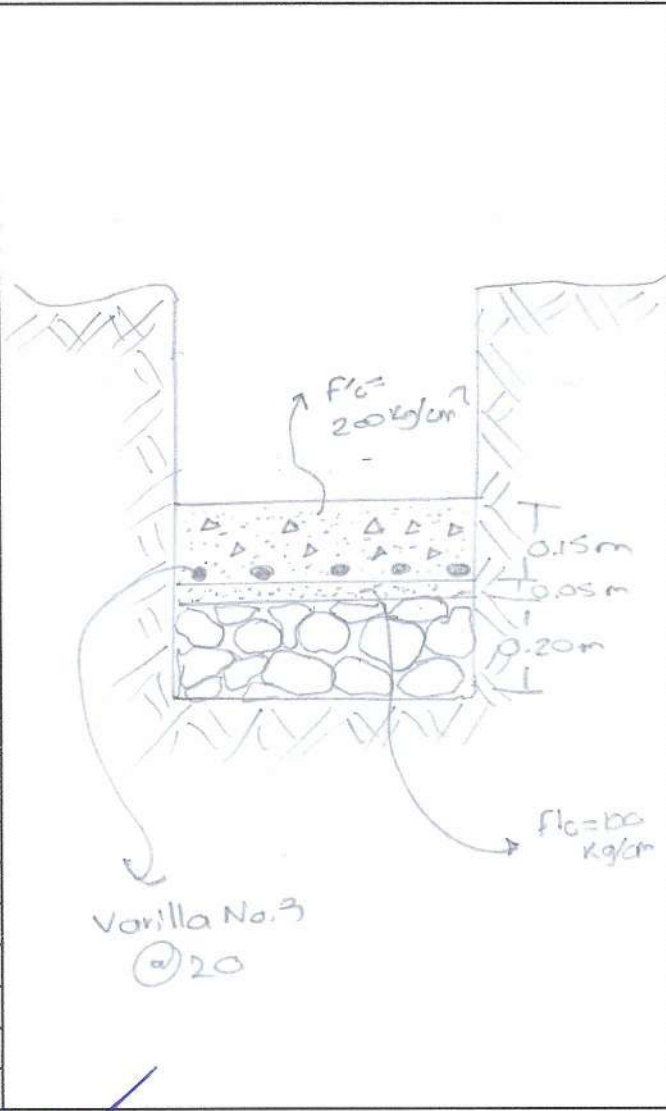

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

No. 006

BITACORA DE OBRA 2019


MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	C R O Q U I S
--------------------------	---------------

15/Ago/19

Se inician con los trabajos de colocación de mureta de enrase en cimentación con block solido de 15x20x40 cm a una altura de 0.60 m con un total de 3 unidades

Se determinan dos disposiciones de mureta, una para cimentación de colindancia y otra para cimentación central

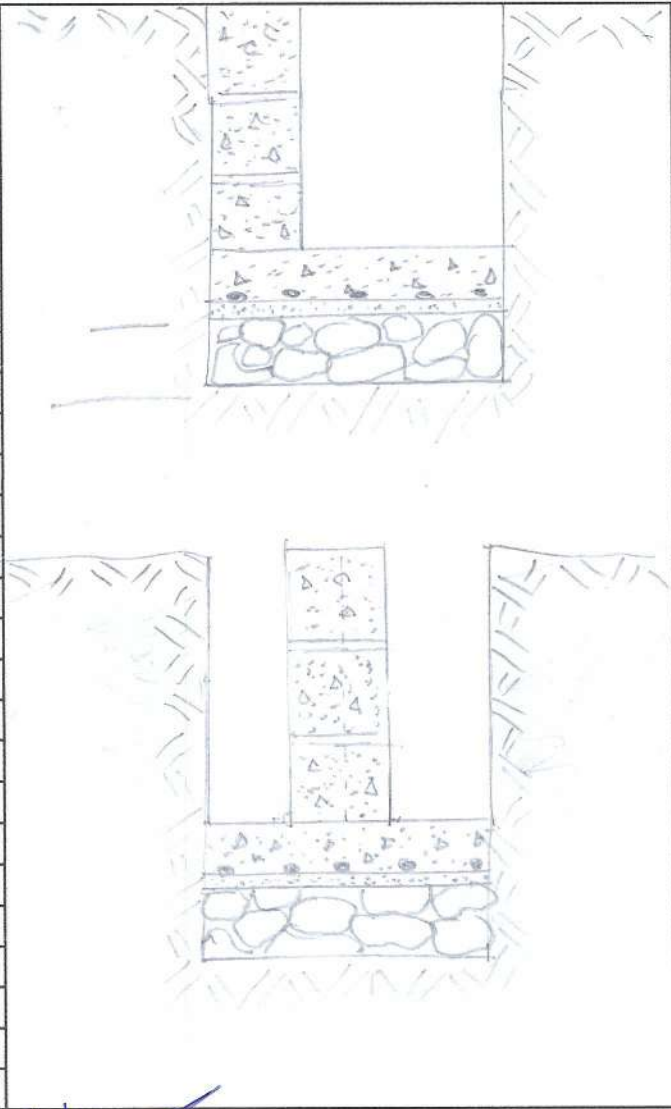

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

NO. 007

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	C R O Q U I S
--------------------------	---------------
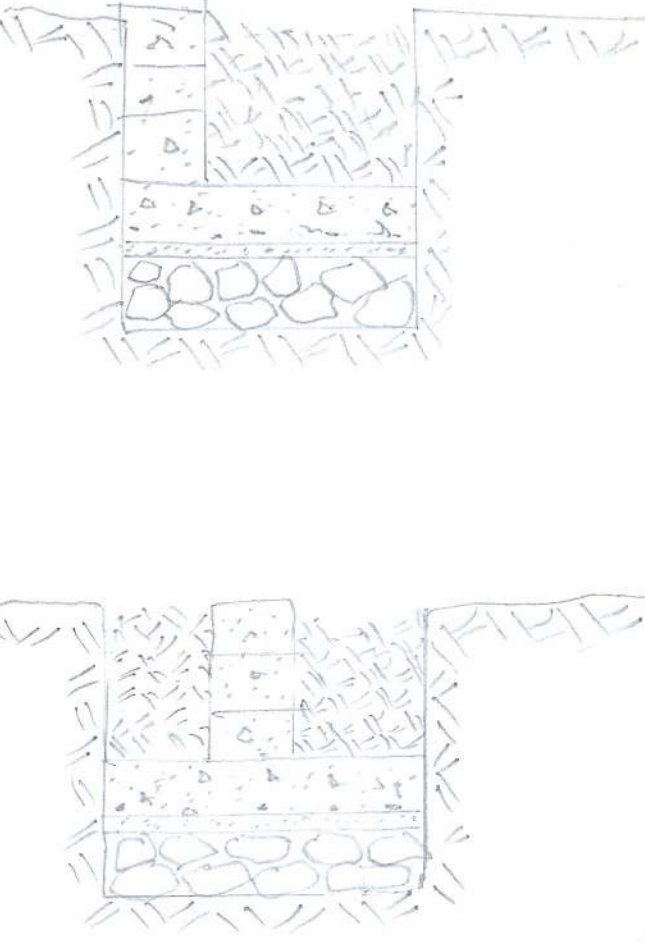
<p style="text-align: right;">20/Ago/19</p> <p>El día de hoy se continúa con los trabajos de relleno de cepas con material de banco (Realista) dentro del área de trabajo, así mismo se comienza con la compactación del mismo.</p> <p>Se comienza con el armado de cadenas de desplante en algunos áreas.</p> 	
--	---

COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE
NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA,
S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FOLIO

BITACORA DE OBRA 2019

No. 008



MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ETAPA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

C R O Q U I S

23/Ago/19

Se realiza el habilitado de la barda para dar a de desplante de 15x20 cm, se realiza el armado y colocacion en los areas faltantes y se prepara para la colocacion de unaron de madera.

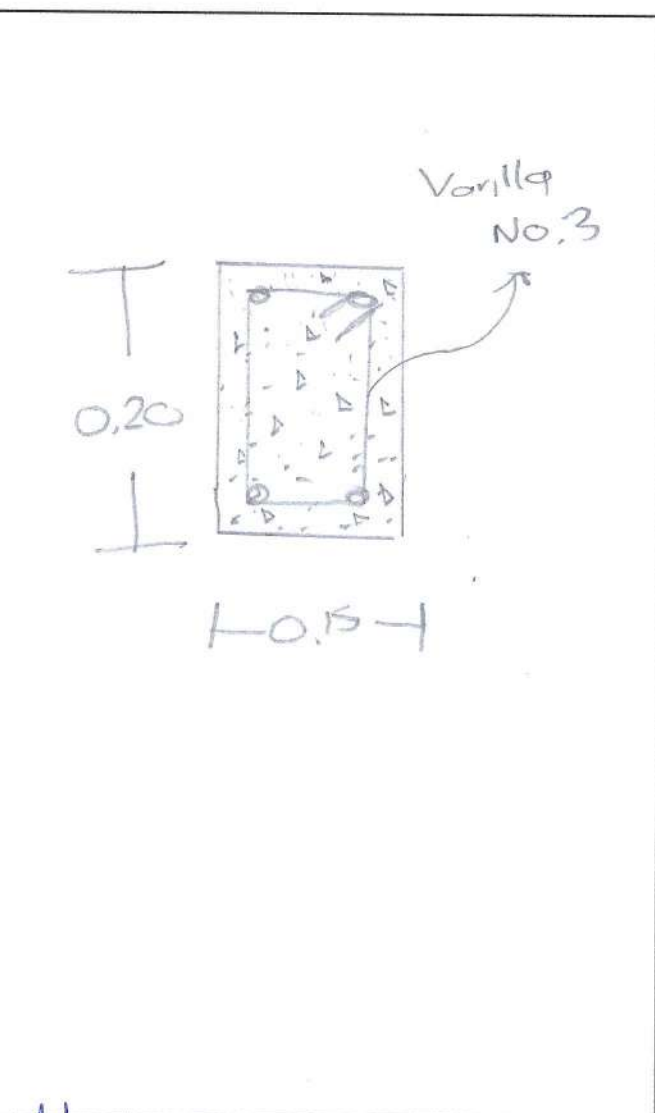COORDINADOR/DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

SUPERINTENDENTE

NOMBRE Y FIRMA
