



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS

### HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

METAS: 694.52 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, 94.04 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ACABADO ESTAMPADO

COLOR VERDE, 198.19 M2 DE BAQUETA, 191.17 ML DE GUARNICION, 77 ML TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2"

113.8 M DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PEAD 12"

CONTRATO NO: ADMINISTRACION MUNICIPAL

IMPORTE: \$ 1,464,099.40

### MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

REDUCCION: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

CONTRATISTA: C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ  
SANCHEZ

FECHA DE INICIO: 13/06/2023

FECHA DE TERMINO: 28/08/2023

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

☐

COPIAS DEL CONTRATO

☐

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

CONTRATISTA

\_\_\_\_\_  
ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ


\_\_\_\_\_  
C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

\_\_\_\_\_  
L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

\_\_\_\_\_  
C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ



JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS,S.L.P

## HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CERRITOS

**METAS: 694.52 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, 94.04 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ACABADO ESTAMPADO**

COLOR VERDE, 198.19 M2 DE BAQUETA, 191.17 ML DE GUARNICION, 77 ML TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2"

113.8 M DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PEAD 12"

CONTRATO NO: ADMINISTRACION MUNICIPAL

IMPORTE: \$1,464,099.40

## MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATISTA: C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE INICIO: 13/06/2023

FECHA DE TERMINO: 28/08/2023

[illegible]

**CONTRATISTA**

**SUPERVISOR**

Vo. Bo.

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

## BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

### MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

01

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Martes, 13 de Junio de 2023

El día de hoy se hizo la entrega de planos y preta a disposición del lugar al contratista.

Miércoles, 14 de Junio de 2023

Visitando el lugar que ocupa la calle Privada de Díaz Mirón encontramos una cuadrilla de topógrafos realizando trabajos correspondientes al trazo y nivelación de línea de drenaje sanitario estableciendo sus puntos de referencia y ejes.

Jueves, 15 de Junio de 2023

En la visita del día de hoy se observaron los trabajos correspondientes a excavación en material tipo III (apertura de

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

SUPERINTENDENTE

# BITACORA



## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

02

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS


ceja) medido en banco, según secciones constructivas.

Lunes, 19 de Junio de 2023

Visitando la calle Privada de Diaz Mirón se realizaron los trabajos correspondientes a compactación por medios mecánicos de terreno natural al 90% de su PVS.M.

Martes, 20 de Junio de 2023

En la visita del día de hoy se observaron trabajos correspondientes a excavación en ceja por medios mecánicos en terreno tipo III, realizándose una zanja con una profundidad de 1m de altura y 0.80m de ancho.

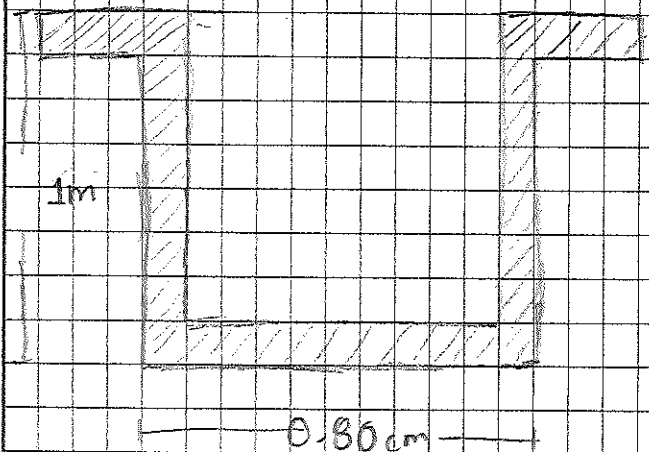

EJECUTOR

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

03

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Miércoles, 21 de Junio de 2023  
En la vista del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a suministro y colocación de plantilla o cama de arena con un espesor de 10 cm, esto para alojar y nivelar la tubería.

Jueves, 22 de Junio de 2023  
Visitando el día de hoy la calle Privada de Díaz Mirón se observan trabajos correspondientes a suministro, colocación y prueba de tubería de polietileno de alta densidad de 10" para red de alcantarillado sanitario.

EJECUTOR

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

04

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Sábado, 24 de Junio de 2023

En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes al acostillado de arena hasta 15 cm por encima del lomo de tbo.

Lunes, 26 de Junio de 2023


Con la visita a la Calle Privada de Diaz Mirón, se observaron los trabajos correspondientes al relleno compactado por medios mecánicos, en capas de 20 cm, utilizando material producto de la excavación.

Jueves, 29 de Junio de 2023

En la visita del día de hoy se iniciaron los trabajos correspondientes a la construcción de las desargas

Detalle de Cera de línea de Drenaje.

Relleno de material producto de excavación compactado en capas de 20 cm.

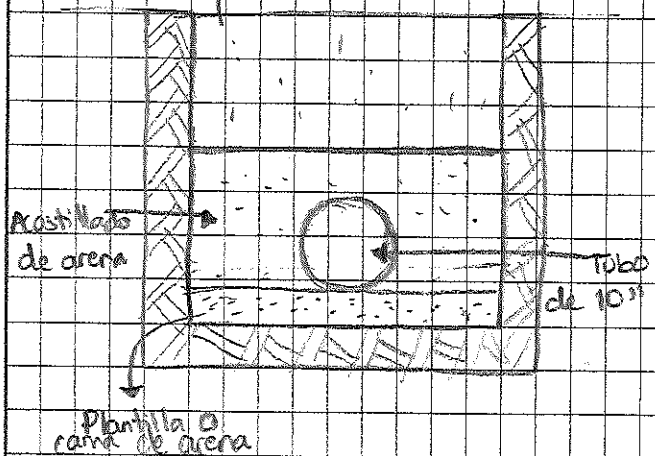

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

L E A O . RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

05

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

domiciliañas de drenaje con tubería de polietileno de alta densidad de 6".

Sábado, 01 de Julio de 2023  
Visitando la calle Privada de Diaz Miron se observa que se realizaron los trabajos correspondientes a la construcción de registro domiciliario a base de tabicón de concreto sólido de 9x13x28 cm a soga, aplanchado pulido, sección interior 40x60x100 cm largo-ancho-profundidad.

Viernes, 05 de Julio de 2023  
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a la realización del pozo de visita tipo común, hasta.

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

06

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023


#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

2.00 mts de profundidad, diámetros interiores de 1.20 mts en la base y 0.60 mts en la parte superior, a base de muro de tabicon a tizon.

Viernes, 14 de Julio de 2023  
En la visita del día de hoy se observaron trabajos correspondientes a excavación en cepa por medios mecánicos en terreno tipo III, realizándose una zanja de 0.60 m de altura y 0.35 m de ancho, suministro y colocación de arena de 10 cm de espesor, para alojar y nivelar tubería.

Lunes, 17 de Julio de 2023  
En la visita del día de hoy se observa que se realizaron trabajos

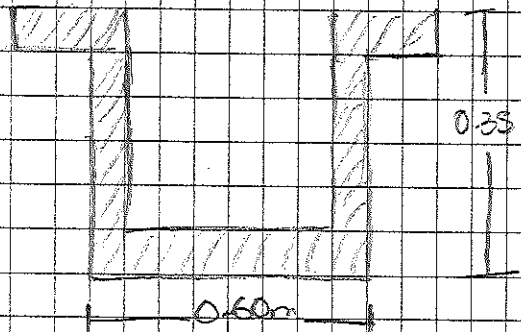

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ



# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

07

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

### CROQUIS

Correspondientes a suministro, colocación y prueba de tubería de PVC hidráulico RD-26 de 2".

Martes, 18 de Julio de 2023


En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a acostillado de arena hasta 15 cm por encima de lomo de tubo.

Jueves, 20 de Julio de 2023

Visitando la calle Privada de Díaz Mirón se observa que se realizaron trabajos correspondientes a relleno compactado por medios mecánicos en capas de 20 cm, utilizando material producto de la excavación seleccionado.

Detalle de Cepa de Línea de agua Potable de 2".

Relleno de material producto de excavación compactado en capas de 20 cm

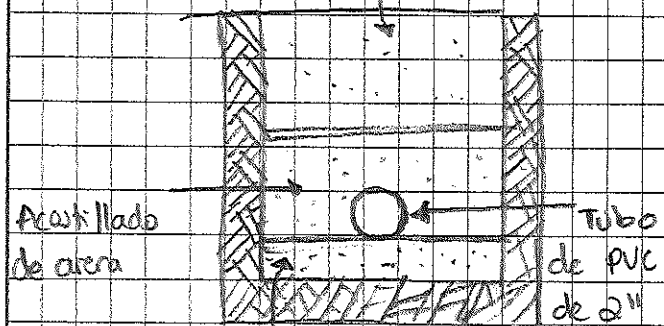

Plantilla o cama de arena

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

L.E.A.O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

08

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Sábado, 22 de Julio de 2023

En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a la construcción de tomas domiciliarias hasta 4.00 mts con tubería de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2".

Lunes, 24 de julio de 2023

En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes a la construcción de caja de válvulas de 1.20x1.00x0.60 m (mt) de tabicon.

Miércoles, 26 de Julio de 2023

Visitando la Calle Privada de Diaz Miron el día de hoy se realizaron

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

SUPERINTENDENTE

**BITACORA**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.**MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.**

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

09

LIBRETA

1

**INCIDENCIAS**

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO****CROQUIS**

los trabajos correspondientes a suministro y colocación de base hidráulica 1 1/2" a finos, compactado al 95% de su PMSM por medios mecánicos.

Viernes, 29 de julio de 2023

En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a Guarnición de concreto simple  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  t.m.a 3/4", R.N., sección trapezoidal 15x20x40 cm.

Lunes, 31 de julio de 2023

Visitando la Calle Privada de Diaz Miron el día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a suministro y colocación de concreto hidráulico  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  t.m.a 1 1/2" de 15 cm

EJECUTOR

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

10

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

de espesor.

Lunes, 7 de agosto de 2023

En la visita de hoy se realizaron trabajos correspondientes a suministro y colocación de concreto hidráulico  $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$  fma  $1 \frac{1}{2}$ " de 15 cms de espesor, acabado estampado color verde.

Lunes, 14 de agosto de 2023

Visitando la calle Privada de Diaz Miron, se observa que se realizan trabajos correspondientes a construcción de banquetas y rampas peatonales y cocheras de concreto simple con acabado escobillado.

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

SUPERINTENDENTE

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

11

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL. PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Jenes, 17 de agosto de 2023  
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a corte y sellado de juntas de dilatación a cada 3.00 m con una profundidad de 5 cm y 5mm de espesor, calafateado en ambos sentidos con sellador autonivelante.

Martes, 22 de agosto de 2023  
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a suministro y colocación de pintura amarilla de tráfico Correx o similar (no diluible) en gornición.

EJECUTOR

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

L.E.A.O. RICARDO GALVAN GALVAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

**BITACORA**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.**MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P**

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

12

LIBRETA

1

**INCIDENCIAS**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE CALLES  
HEROES POTOSINOS Y FCO. VILLA, FRACCIONAMIENTO FCO. VILLA, EN LA COL PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 13 de junio de 2023 al 28 de agosto de 2023

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO****CROQUIS**

Viernes, 25 de agosto de 2023  
En la visita del día de hoy se  
realizaron trabajos correspondientes a  
limpieza gruesa y fina de las  
trabajos.

Lunes, 28 de agosto de 2023  
En la calle Privada de Diaz Miron  
el día de hoy se dieron por terminados  
los trabajos.

EJECUTOR

C.P. ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

L. E. A. O. RICARDO GALVAN GALVAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ
