



# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

07

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 11 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Lunes, 18 de Septiembre de 2023  
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a acostillado de arena hasta 15cm por encima de lomo de tubo.

Miércoles, 20 de Septiembre de 2023  
Visitando la calle 5 de febrero se observa que se realizaron trabajos correspondientes a relleno compactado por medios mecánicos en cupos de 20 cm, utilizando material producto de la excavación seleccionados.

EJECUTOR

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

08

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 11 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023

#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Viernes, 21 de Septiembre de 2023  
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a la construcción de tomas domiciliarias hasta 4.00 mts con tubería de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2".

Sábado, 23 de Septiembre de 2023  
En la visita del día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes a la construcción de caja de válvulas.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Casa SIN<br>3 piezas | Casa #49          |
| Casa SIN<br>2 piezas | Casa #47          |
|                      | Casa #45          |
|                      | Casa #45-B        |
|                      | Casa #43          |
| Casa #48             |                   |
| Casa #46             | Casa #42<br>Solar |
| Casa #44             | Casa #41          |
| Casa #42             | Puerta verde      |
| Casa SIN<br>2 piezas | Casa #39-D        |
| Casa #38             | Casa #39-C        |
|                      | Casa #39-B        |
| Casa #39             | Casa #39          |

EJECUTOR

SUPERVISOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

SUPERINTENDENTE

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

# BITACORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

## MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.

FOLIO

09

LIBRETA

1

### INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN FRANCISCO, CERRITOS, S. L. P.

LOCALIDAD: CEBECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATO No.: ADMINISTRACION MUNICIPAL

FECHA: 11 de agosto de 2023 al 23 de octubre de 2023


#### DESCRIPCION DEL CONCEPTO

#### CROQUIS

Miércoles, 27 de Septiembre de 2023  
En la visita del día de hoy se realizaron trabajos correspondientes a excavación para abrir cajón en terreno tipo III por medios mecánicos.

Jueves, 12 de Octubre de 2023  
Visitando la calle 5 de febrero, el día de hoy se realizaron los trabajos correspondientes a suministro y colocación de base hidráulica 1/12 a finos, compactada al 95% de su psm por medios mecánicos.

Excavación para abrir cajón

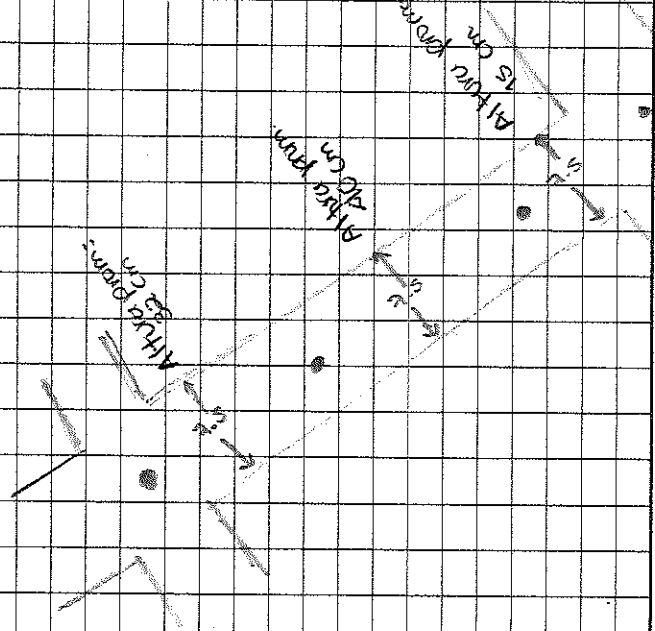

EJECUTOR

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ TOVAR

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

ING. DULCE MARIA ALEJOS MEDELLIN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

