

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:

FOLIO:

04 Mayo 2020

001

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.: MSC-R33-PISM-AD3/SE/03/04/04-SO/02/0A-05-20

OBRA Y/O ACCION: REHABILITACION DE ACCESO A SAN CIRO DE ACOSTA 2A ETAPA

METAS: 358.73

UNIDAD: M2

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 04 DE MAYO DE 2020


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020

NOTAS:

Con la presente fecha se abre la siguiente bitacora correspondiente a la obra "Rehabilitación de acceso a San Ciró de Acosta 2A Etapa"

Estando presentes por parte del contratista y fungiendo el cargo de Superintendente el Ing. Sergio Refugio Amador Huerta y por parte del municipio el Ing. Cesar Augusto de la Cruz Garcia como Supervisor de obra. Se comienzan con los trabajos correspondientes a la pavimentación con concreto hidráulico $F'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$

CROQUIS:

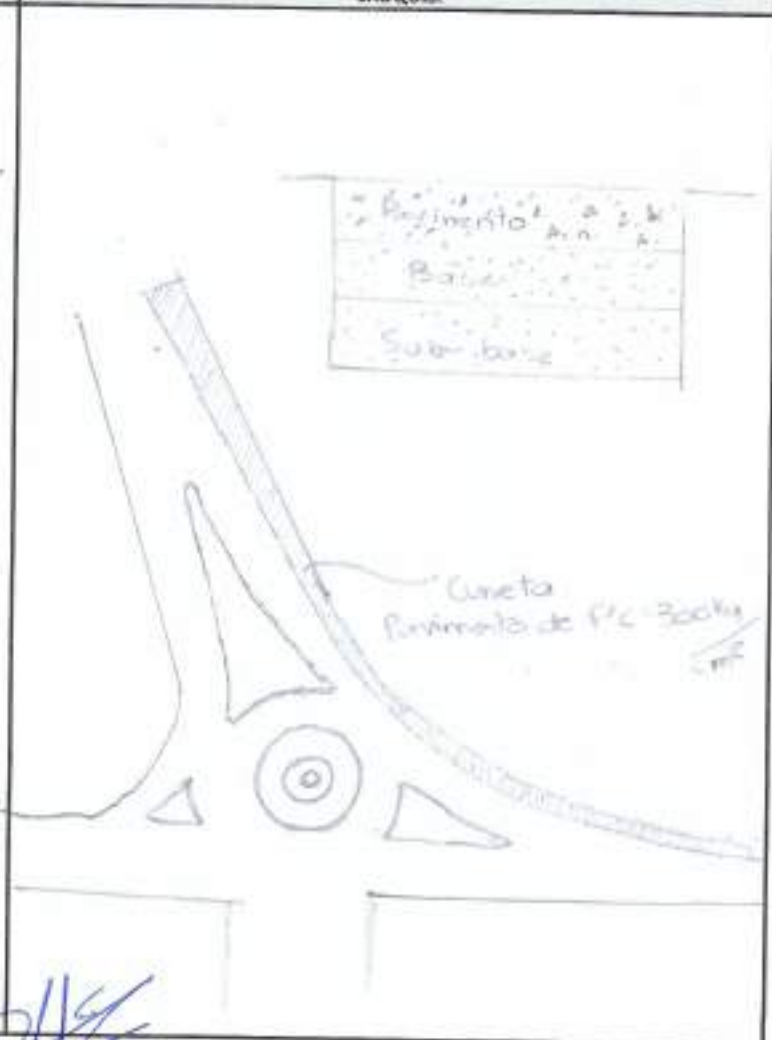

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 8 de Mayo 2020 FOLIO: 002

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.: MSC-R33-FISM-AD3/SE/03/04/50/01/0A-03-20

OBRA Y/O ACCION: REHABILITACION DE ACCESO A SAN CIRO DE ACOSTA 2A ETAPA

METAS: 358.73 UNIDAD: M2

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 04 DE MAYO DE 2020

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020

NOTAS:

CROQUIS:

Dentro de la supervision del dia de hoy se observo la colocacion de sub-base hidraulica, para asi proceder a la compactación y colocacion de la base hidraulica.

Dentro de la area de jardineras se procede a la colocacion de pasto con un total de 281.53 m^2 .



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 14 Mayo 2020 FOLIO: 003

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.: MSC-R33-FISRA-AD3/SE/R3/CH-SD/DI/BA-03-20

OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE ACCESO A SAN CIRO DE ACOSTA 2A ETAPA

METAS: 358.73 UNIDAD: M2

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 04 DE MAYO DE 2020

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020

NOTAS:

En la supervisión del día de hoy se comienza con la colocación del concreto hidráulico $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ reforzado con malla con espesor de 20 cm a resistencia de 7 días. Dentro del área de glorieta principal se comienza con los trabajos de colocación de piso de concreto.

CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVEIRO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: 20 Mayo 2020 FOLIO: 004

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.: MSC-R33-FISM-AD3/SC/03/04-SD/01/0A-03-20

OBRA Y/O ACCION: REHABILITACION DE ACCESO A SAN CIRO DE ACOSTA 2A ETAPA

METAS: 358.73 UNIDAD: M2

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 04 DE MAYO DE 2020


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2020

NOTAS:

CROQUIS:

Se concluyen con los trabajos de Pavimentación con concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, en cuanto a la colocación de piso se continúa con la instalación de piso cerámico además de la colocación de pasto en la glorieta circular.

Se procede a la instalación de plantas de ornato en el perímetro de las isletas

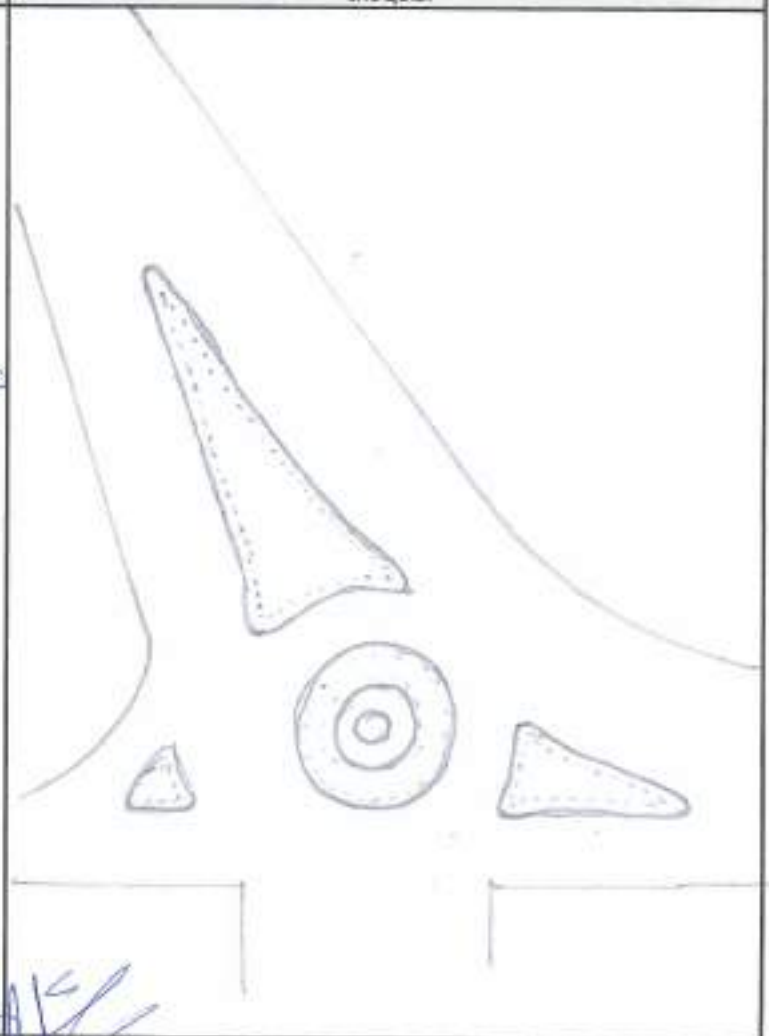

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERINTENDENTE
