

## Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal Acta V (Quinta)

En las instalaciones de Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) del Municipio de Rioverde, S. L. P., siendo las 12:00 horas del día **27 de Julio del 2022**; de conformidad con el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), así como lo establece el Capítulo XI, Artículo 85, la Fracción III, del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social de Rioverde, S. L. P., para efecto de llevar a cabo la **V (Quinta) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P.**

### ORDEN DEL DIA:

1. Registro de Asistencia.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quorum e instalación de la Sesión.
4. Priorización, validación, modificaciones y avances (físicos-financieros) de obras y acciones para el ejercicio 2022.
5. Clausura de la Sesión.

**Primer Punto.** Siendo las 12:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistencia, se corrobora que los asistentes se encuentran registrados en la lista de asistencia y se procede al registro de los mismos conforme van arribando a la Asamblea.

**Segundo Punto.** Siendo las 12:19 horas, el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Hilario Vázquez Méndez, solicita a la mesa de registro le conceda la lista de asistencia para proceder a realizar el pase de lista a los presentes, solicitándoles levantar su mano frente a la Asamblea para dar validez a este punto. Se cuenta con la presencia del C. Arnulfo Urbiola Román Presidente del Consejo, y con la presencia de las CC. Rosa Ma. Huerta Valdez y Nancy Selene Juárez Oviedo, Regidoras Municipales; quienes fungen como Representantes del H. Cabildo; así como se cuenta con la presencia del Ing. Hilario Vázquez Méndez; Coordinador de Desarrollo Social Municipal; también se cuenta con la presencia de los CC. Ezequiel Medina Govea y Paola Yarazeth Ontiveros Castro, Vocales de Control y Vigilancia entre los Representantes Sociales Comunitarios; así como la asistencia de los Representantes Sociales Comunitarios, quienes en la mesa de registro se identificaron y plasmaron su rúbrica en la lista de asistencia: Los CC. Profr. J. Leónides Granados Hernández, Noé de Jesús Martínez Cruz, Hugo Armando Ochoa Reyna, Marisela García Martínez.

ACTA V (QUINTA)  
QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE JULIO DE 2022

Juan Jesús Contreras González, Roberto García Martínez, Graciela Márquez Méndez, Profr. Juan Méndez Galicia, Matilde Galicia Bautista, María del Carmen Cabrera Díaz, Blanca Alicia Cedillo Rocha e Ismael Juárez Vanegas; en ese orden, de acuerdo a la lista de asistencia. Se registra la presencia de los CC. Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Secretario del H. Ayuntamiento; C. P. Joanna Brondo Loreda, Tesorera Municipal; Lic. Juan Manuel Hernández Tenorio, Contralor Municipal; Ing. Daniel Montalvo Pérez, Director de Obras Públicas; Arq. Adrián Esteban Peña Romo, Director del IMPLAN; y el C. José Álvaro Rodríguez Rodríguez, Encargado del Despacho de S.A.S.A.R. quienes fungen como Asesores Técnicos del Consejo.

**Tercer Punto.** Una vez que se verifica que están presentes una mayoría de los convocados como integrantes del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde, S.L.P., y una vez comprobado que existe Quórum legal, para que instale la sesión, quien solicita a los presentes ponerse de pie y les manifiesta que **siendo las 12:21 horas del día miércoles 27 de Julio del presente año, se declara instalada la V (Quinta) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P.,** y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.

**Cuatro Punto:** En este punto relativo a la priorización y validación, modificaciones y avances (fisicos-financieros) de obras y acciones para el ejercicio presupuestal 2022, se les informa que en su poder tienen una carpeta que contiene una impresión del Programa Operativo Anual Ejercicio 2022, y las modificaciones y avances fisicos y financieros. mismos que se irán explicando de acuerdo al desarrollo de los apartados. como se detalla en los siguientes apartados.

Primero, se dan a conocer las Modificaciones al Programa Operativo Anual del Ejercicio Presupuestal 2022, relativo a los recursos asignados al Municipio a través del Ramo 33, dentro de los Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.

Notificándoles que en su poder tienen una carpeta que se les entregó al inicio de la reunión, misma que contiene una impresión del Programa Operativo Anual del ejercicio 2022, con corte al presente día. Dándoles a conocer por apartados las modificaciones que se sugieren para su aprobación por ajustes financieros, productos financieros, cancelación de obras y en tres situaciones por cambio o corrección de nombre. Todo esto es con la finalidad de tener un Programa Operativo Anual 2022 actualizado y dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y contables, así como de las plataformas digitales que nos rigen en esta Administración Municipal.

**ACTA V (QUINTA)**  
**QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)**  
**27 DE JULIO DE 2022**

27 DE JULIO DEL 2022

**MODIFICACIONES**

		<b>EJERCICIO 2022</b>						
<b>OBRA Y/O ACCION</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>INVERSION</b>	<b>MUNICIPIO</b>		<b>TOTAL ANTERIOR</b>	<b>TOTAL ACTUAL</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>FISM</b>	<b>FFM</b>				
<b>NUEVAS OBRAS/ACCIONES</b>								
UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	600,000.00			600,000.00			
<b>AJUSTES AL TECHO FINANCIERO</b>								
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN DE LOS REYES, DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A PANTEON MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	80,000.00	80,000.00		2,510,000.00	2,670,000.00		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE LA PURISIMA A PANTEON MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	80,000.00	80,000.00		2,260,000.00	2,330,000.00		
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL NORTE A TOPAR, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	40,000.00	40,000.00		700,000.00	740,000.00		
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZAPOTE-ALAMEDA	ALAMEDA	8,229.34	8,229.34		118,005.75	126,235.09		
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,896.56		2,896.56	19,303,046.19	19,305,942.75		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	320,000.00	320,000.00		91,020.35	411,020.35		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	7,200.00		7,200.00	239,692.00	246,892.00		
<b>TOTAL DE RECURSO NECESARIO</b>		<b>\$ 1,118,325.90</b>	<b>\$ 808,229.34</b>	<b>\$ 610,096.56</b>				
<b>DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO</b>								
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00	3,260,000.00	2,660,000.00		
ADQUISICION DE 4 CAMONETAS PICK UP DOBLE CABINA PARA AUTOPATRULLA DE LA DGSPM	RIOVERDE	7,200.00		7,200.00	4,567,200.00	4,580,000.00		
<b>CANCELACION DE OBRA</b>								
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR DE LA TANGERINA, DE CALLE DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR LOS AZAHARES, COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	50,000.00	50,000.00					
REHABILITACION CON ADQUIN EN ANDADOR DE LA TANGERINA, DE CALLE DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR LOS AZAHARES, COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	450,000.00	450,000.00					
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>								
PRODUCTOS FINANCIEROS FISM 2022 JUNIO	RIOVERDE	8,229.34	8,229.34					
PRODUCTOS FINANCIEROS FFM 2022 JUNIO	RIOVERDE	2,896.56		2,896.56				
<b>TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE</b>		<b>\$ 1,118,325.90</b>	<b>\$ 808,229.34</b>	<b>\$ 610,096.56</b>				
<b>RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				
<b>CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE</b>								
<b>ACTUAL</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>CORRECCION</b>				<b>LOCALIDAD</b>		
SIDESORE No. 2022-2411: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES AL CADENAMIENTO D+186 AL ORIENTE, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	SIDESORE No. 2022-2411: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA AL CADENAMIENTO C+529, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.				LOS ANGELES		
SIDESORE No. 2022-1804: CONSTRUCCION DE PRIVADA DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HIDRAULICO, DE PROLONGACION DE ESCANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	SIDESORE No. 2022-1804: CONSTRUCCION DE PRIVADA DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE VALENCIA HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.				RIOVERDE		
SIDESORE No. 2022-671: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PORFIRIO DIAZ, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	SIDESORE No. 2022-671: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.				PUENTE DEL CARMEN		

A continuación, se describen los **Avances Físicos y Financieros** de obras y acciones de acuerdo a los rubros descritos por obra. Estos avances, se plasman de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas y por la Tesorería Municipal, respectivamente, con corte a la fecha.

**ACTA Y (QUINTA)  
QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE JULIO DE 2022**

27 DE JULIO DEL 2022

CLAVE NSA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN.	AVANCE FIN.	AVANCE FIN.
			TOTAL	FSM	FFM	OTROS	FSM 2022	FAFM 2022	SUMA				
<b>TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2022</b>			\$ 158,026,848.24	\$ 34,124,848.00	\$ 73,583,412.00	\$ 900,000.00	\$ 28,239.09	\$ 10,749.11	\$ 38,984.24				
<b>SUMAS DE PROGRAMACION</b>			\$ 158,026,848.24	\$ 34,124,848.00	\$ 73,583,412.00	\$ 900,000.00	\$ 28,239.09	\$ 10,749.11	\$ 38,984.24				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>													
AS 1	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	2,200,000.00		2,200,000.00							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>EDUCACION</b>													
ED 1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EP "BENITO JUAREZ", BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	290,000.00	290,000.00								0%	0%
ED 2	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EP "PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS", RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	120,000.00	120,000.00								0%	0%
ED 3	MANTENIMIENTO DE AULAS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EP "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	440,000.00	440,000.00								0%	0%
ED 4	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EP "EMILIO CARRANZA", PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	210,000.00	210,000.00								0%	0%
ED 5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EP "HIMNO NACIONAL", PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	220,000.00	220,000.00								0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>CULTURA</b>													
C 1	REHABILITACION CON VELARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA (IMAC), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	250,000.00		250,000.00							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>DEPORTE</b>													
D 1	REHABILITACION DEL COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO, DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE CENTENARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	4,000,000.00		4,000,000.00							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>													
IA 1	REHABILITACION DE ARREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE MARIN	CRUZ DE MARIN	250,000.00	250,000.00								0%	0%
IA 2	REHABILITACION DE ARREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	LAS PILAS	250,000.00	250,000.00								0%	0%
IA 3	REHABILITACION DE ARREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL MOGALITO	EL MOGALITO	250,000.00	250,000.00								0%	0%
IA 4	REHABILITACION DE ARREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LA PERDIDA	LA PERDIDA	250,000.00	250,000.00								0%	0%
IA 5	ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA	RIOVERDE	3,000,000.00		3,000,000.00							0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 4,990,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 3,390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>AGUA POTABLE</b>													
AP 1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CANAL 5, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	100,000.00	\$ 100,000.00								0%	0%
AP 2	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE A CALLE BENITO JUAREZ, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	415,000.00	\$ 415,000.00								1%	20%
AP 3	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN, DE CALLE PROLONGACION DE JUAREZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA ISLA DE SAN PABLO EL RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	150,000.00	\$ 150,000.00								0%	0%
AP 4	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION DE CALLE HIDALGO, DE CALLE ROSALENA A CALLE GARDENIA, COLONIA ISLA DE SAN PABLO S, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	80,000.00	\$ 80,000.00								0%	0%
AP 5	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN LUIS, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	55,000.00	\$ 55,000.00								0%	0%
AP 7	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE PALMA, DE CALLE GONZALEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	68,000.00	\$ 68,000.00								0%	0%

ACTA V (QUINTA)  
 QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
 27 DE JULIO DE 2022

27 DE JULIO DEL 2022

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. PM		
			TOTAL	FISM	PFM	OTROS	FISM 2022	FAFM 2022	SUMA	AVANCE FIS	AVANCE PFM		
AP5	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LANDA VERDE, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A DRGN EL CARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	75,000.00	\$	75,000.00							100%	24%
AP6	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	55,000.00	\$	55,000.00							0%	0%
AP10	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA, DE BRAYO A TOPAR NORTE, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	85,000.00	\$	85,000.00							0%	0%
AP11	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRONTERA NORTE, DE CALLE QUEZADA HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	75,000.00	\$	75,000.00							0%	0%
AP12	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	80,000.00	\$	80,000.00							0%	0%
AP13	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE PROLONGACION DE ESCANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	32,000.00	\$	32,000.00							0%	0%
AP18	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE CALLE VALENCIA HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	44,000.00	\$	44,000.00							0%	0%
AP11	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIZARDI, DE CALLE PRIMO DE VERDANO A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECURSORES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	60,000.00	\$	60,000.00							0%	58%
AP19	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALDAMA, DE CALLE RAYON AL CADENAMIENTO 0+058, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	32,000.00	\$	32,000.00							80%	25%
AP20	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA AL CADENAMIENTO 1+212, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	445,000.00	\$	445,000.00							0%	0%
AP21	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS, DE CALLE LOS CEDROS HACIA EL ORIENTE A TOPAR, COLONIA ACCION NACIONAL, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	32,000.00	\$	32,000.00							100%	0%
AP22	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA VERASTEGUI, DE CALLE ARBOLEDAS A CALLE LIRIO, INFORMANT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	60,000.00	\$	60,000.00							0%	0%
SUBTOTAL			\$	1,943,000.00	\$	1,943,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	-
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>													
AD1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL NORTE, DE CARRETERA FEDERAL 70 DE CALLEJON A CALLE CRISANTEMO	RIOVERDE	730,000.00		730,000.00							-	0%
AD2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL PONIENTE DE BOULEVARD UNIVERSITARIO DE ACCESO A CENTRAL CAMONERA A DREN DEL CARMEN.	RIOVERDE	1,420,000.00		1,420,000.00							-	0%
AD3	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES AL CADENAMIENTO 0+ 188 AL ORIENTE, BARRIO DE LOS ANGELES RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	480,000.00		480,000.00							-	80%
AD4	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE RAYON, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	812,000.00		812,000.00							-	100%
AD5	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL SUR A TOPAR, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	230,000.00		230,000.00							-	1%
AD6	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNINO CEBILLO, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE SANTA TERESITA, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	215,000.00		215,000.00							-	0%
AD7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE GABRIEL MARTINEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	222,000.00		222,000.00							-	0%

ACTA V (QUINTA)  
 QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
 27 DE JULIO DE 2022

27 DE JULIO DEL 2022

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION				PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SUMA	AVANCE FS	AVANCE FM
			TOTAL	FSM	FFM	OTROS	FSM 2022	FAFM 2023	OTROS			
AD 8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRONTERA, PARA LDTIFICACION MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	405,000.00	405,000.00					-	0%	0%	
AD 9	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO PORTES GIL, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	370,000.00	370,000.00					-	0%	0%	
AD 10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	161,000.00	161,000.00					-	100%	28%	
AD 11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDIAZ, DE CALLE MIGUEL ALSMAN HACIA EL SUR A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	440,000.00	440,000.00					-	0%	0%	
AD 12	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NIÑOS HEROES, DE CALLE EJERCITO NACIONAL, HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	300,000.00	300,000.00					-	0%	0%	
AD 13	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE PORFIRIO DIAZ AL PONENTE, HASTA 183.11 M, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	732,000.00	732,000.00					-	0%	0%	
AD 14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA AL CADDENAMIENTO 0-529, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,355,000.00	1,355,000.00					-	0%	0%	
AD 15	AMPLIACION DE 80 M DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR A TOPAR, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	235,000.00	235,000.00					-	1%	0%	
AD 16	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLATA DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PROLONGACION DE JUAREZ SUR, COLONIA SANTA CECILIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	470,000.00	470,000.00					-	0%	0%	
AD 17	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE HIDALGO, DE CALLE AZUCENA A CALLE GARDENIA, COLONIA BLA DE SAN PABLO I, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	253,000.00	253,000.00					-	0%	0%	
AD 18	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN LUIS, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00					-	0%	0%	
AD 19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE PALMA, DE CALLE GONZALEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	240,000.00	240,000.00					-	0%	0%	
AD 20	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINDA VERDE, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A DREN EL CARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	280,000.00	280,000.00					-	100%	30%	
AD 21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	220,000.00	220,000.00					-	0%	0%	
AD 22	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDIAZ, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	305,000.00	305,000.00					-	0%	0%	
AD 23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE PROLONGACION DE ESCANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	134,000.00	134,000.00					-	0%	0%	
AD 24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIZARDI, DE CALLE PRIMO DE VERDAD A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECURSORES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00					-	100%	70%	
AD 25	AMPLIACION DE 23.07 M DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALDAMA, DE CALLE RAYON AL CADDENAMIENTO 0-058, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	76,000.00	76,000.00					-	100%	30%	
AD 26	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL PONENTE BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CANAL 3 A TALLERES MUNICIPALES, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	4,850,000.00	4,000,000.00		800,000.00			-	0%	0%	
AD 27	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA LOS NARANJOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	805,000.00	805,000.00					-	1%	0%	



**ACTA V (QUINTA)**  
**QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)**  
**27 DE JULIO DE 2022**

CLAVE FOL.	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	31 DE JULIO DEL 2022	
				FISE	RFM	OTROS	FISM 2022	FAPM 2022		AVANCE FIN.	AVANCE FIN.
DU 5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,210,000.00	1,210,000.00					-	0%	0%
DU 6	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS CEDROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE LOS CEDROS HACIA EL ORIENTE A TOPAR, COLONIA ACCION NACIONAL, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	440,000.00	440,000.00					-	90%	0%
DU 7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE EL PÉREZ FLORES, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	663,000.00	663,000.00					-	100%	96%
DU 8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAYÓN, DE CENTRO CULTURAL, LOS ANGELES A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	750,000.00	750,000.00					-	100%	0%
DU 9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYÓN A CALLE CARRANZA, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	1,075,000.00	1,075,000.00					-	90%	96%
DU 11	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR A TOPAR, LA COFRADIA, RIOVERDE S.L.P.	LA COFRADIA	1,950,000.00	1,950,000.00					-	1%	0%
DU 12	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DEL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE A CALLE BENITO JUÁREZ, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,435,000.00	3,435,000.00					-	1%	30%
DU 13	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN JUAN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE PROLONGACIÓN DE JUÁREZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,900,000.00	1,900,000.00					-	0%	0%
DU 15	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE JUÁREZ SUR CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA ETY PLAN DE AYALA A CALLE SAN JUAN, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,100,000.00	2,100,000.00					-	0%	0%
DU 16	CONSTRUCCION DE CALLE AZUCENA CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HACIA EL ORIENTE A TOPAR CON CANAL, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	2,895,000.00	2,895,000.00					-	0%	0%
DU 17	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE AZUCENA A CALLE GARDENIA, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,127,000.00	1,127,000.00					-	0%	0%
DU 18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DREN PLATA, DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CAMINO DE LOS SALITRELOS, PARAMENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "DOLORES HERRERA VOA DE RICHARD", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	660,000.00	660,000.00					-	86%	32%
DU 19	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PRIVADA DE SAN LUIS CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	636,000.00	636,000.00					-	0%	0%
DU 20	CONSTRUCCION DE CALLE FLOR DE PALMA CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE GONZÁLEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	942,000.00	942,000.00					-	0%	0%
DU 21	CONSTRUCCION DE CALLE LANDA VERDE CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A DREN EL CARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	745,000.00	745,000.00					-	100%	22%
DU 22	CONSTRUCCION DE QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE CALLE PORFIRIO DÍAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	785,000.00	785,000.00					-	0%	0%
DU 23	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	602,000.00	602,000.00					-	100%	24%
DU 24	CONSTRUCCION DE CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE BRAVO A TOPAR NORTE, COLONIA LA MORTA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,700,000.00	1,700,000.00					-	0%	0%



**ACTA V (QUINTA)**  
**QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)**  
**27 DE JULIO DE 2022**

27 DE JULIO DEL 2022

CLASE PSA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	RIOVERDE	MUNICIPIO		OTROS	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN.	AVANCE FB	AVANCE FA
			TOTAL	FSM	FFM		FSM 2022	FAFM 2022	SUMA		
DU 25	CONSTRUCCION DE CALLE FRONTERA NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE QUEZADA HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,328,000.00	1,328,000.00					-	0%	0%
DU 26	CONSTRUCCION DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,080,000.00	1,080,000.00					-	0%	0%
DU 27	CONSTRUCCION DE PRIVADA DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HIDRAULICO, DE PROLONGACION DE EBECANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	380,000.00	380,000.00					-	0%	0%
DU 29	CONSTRUCCION DE PRIVADA DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE VALENCIA HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	445,000.00	445,000.00					-	0%	0%
DU 32	CONSTRUCCION DE CALLE AVENIDA VERASTEGUI CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE ARROLEDAS A CALLE URIO, INFONAVIT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,310,000.00	3,310,000.00					-	0%	0%
DU 33	CONSTRUCCION DE CALLE LIZARDI CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE PRIMO DE VERDAD A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECURSORES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	630,000.00	630,000.00					-	100%	85%
DU 35	CONSTRUCCION DE CALLE HACIENDA JESUS MARIA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO A CALLE SAN ISIDRO, FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	3,500,000.00	3,500,000.00					-	0%	0%
DU 36	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ, HACIA EL ORIENTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	332,000.00	332,000.00					-	100%	20%
DU 46	CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ALDAMA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE RAYON AL CADENAMIENTO D-058, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	647,000.00	647,000.00					-	40%	30%
DU 43	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, RIOVERDE, S.L.P.	PROGRESO	1,800,000.00		1,800,000.00				-	0%	0%
DU 44	REHABILITACION A BASE DE SACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUERRO SUR DEL BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CARRETERA SAN CRO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	480,000.00		480,000.00				-	0%	0%
DU 45	REHABILITACION INTEGRAL EN CALLE ALLENDE, DE CALLE MOLINERO A CALLE JULIAN DE LOS REYES RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,700,000.00		1,700,000.00				-	0%	0%
DU 48	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00				-	0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 44,320,000.00</b>	<b>\$ 20,873,000.00</b>	<b>\$ 4,488,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
	<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>										
IC 1	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZAPOTE-ALAMEDA	ALAMEDA	126,235.00	100,000.00			26,235.00		26,235.00	0%	0%
IC 2	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASTORA - LA MURALLA	LA MURALLA	1,000,000.00		1,000,000.00				-	0%	0%
IC 3	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN SEBASTIAN - MIGUEL HIDALGO	SAN SEBASTIAN	1,000,000.00		1,000,000.00				-	0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 3,126,235.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 26,235.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 26,235.00</b>		
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>										
SP 1	SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	19,305,942.71		19,305,942.71			10,749.15	10,749.15	50%	50%
SP 2	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	6,500,000.00		6,500,000.00			-	-	20%	20%
SP 3	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	2,980,000.00		2,980,000.00				-	30%	30%
SP 4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	1,450,000.00		1,450,000.00				-	60%	60%
SP 5	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	18,000,000.00		18,000,000.00				-	45%	45%
SP 6	ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA PARA AUTOPATRULLA DE LA DGGPM	RIOVERDE	4,580,000.00		4,580,000.00				-	100%	100%
SP 7	ADQUISICION DE ORDENADOR PARA CONEXION DE CAMIONAS PARA LA DGGPM	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00				-	80%	80%
SP 8	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA DGGPM	RIOVERDE	484,325.40		484,325.40				-	100%	100%

**ACTA V (QUINTA)  
QUINTA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE JULIO DE 2022**

27 DE JULIO DE 2022

CLAVE FOLIO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN.		
			TOTAL	FSM	FFM	OTROS	FISM 2022	FAFM 2022	SUMA	AVANCE FS	AVANCE FF		
OP 9	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DSSPM	RIOVERDE	55,000.00		55,000.00						-	94%	94%
OP 10	EVALUACION EN MATERIA DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL OPERATIVO DE LA DSSPM	RIOVERDE	187,000.00		187,000.00						-	91%	91%
OP 11	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DSSPM	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00							0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 54,382,388.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 54,371,020.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,748.16</b>	<b>\$ 15,748.16</b>			
	<b>ADMINISTRACION PUBLICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>												
FM 1	MEJORAMIENTO DE PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA RITA	385,000.00		385,000.00						-	0%	0%
FM 2	REHABILITACION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PISOS, EN EL MERCADO MUNICIPAL "CRISTOBAL COLON", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	10,000,000.00	10,000,000.00							-	25%	27%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 10,385,000.00</b>	<b>\$ 10,000,000.00</b>	<b>\$ 385,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
	<b>REQUERIMIENTOS</b>												
RR 1	ADQUISICION DE 2 TIVACOS DE 15,000 L PARA USO COMUNITARIO	EL FRENO	200,000.00		200,000.00						-	100%	76%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>												
Q 1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	RIOVERDE	70,000.00	70,000.00							-	5%	5%
Q 2	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (EQUIPO MENOR)	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00						-	70%	70%
Q 3	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPELERIA)	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00						-	40%	46%
Q 4	SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS	RIOVERDE	350,000.00		350,000.00						-	5%	5%
Q 5	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00						-	90%	90%
Q 6	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	112,522.65	112,522.65							-	100%	100%
Q 7	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	RIOVERDE	1,000,000.00		1,000,000.00						-	0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 2,132,522.65</b>	<b>\$ 182,522.65</b>	<b>\$ 1,950,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
	<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS</b>												
FE 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	687,818.35	411,028.35	240,392.00						-	0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 687,818.35</b>	<b>\$ 411,028.35</b>	<b>\$ 240,392.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			

## RESUELVE

**UNICO:** Después de someter a votación el punto número 4, de acuerdo al orden del día, por **Unanimidad** de los integrantes presentes, se aprueban la Priorización, validación, modificaciones y avances de obras y acciones para el ejercicio 2022. Quedando aprobadas la totalidad de las modificaciones y avances físicos y financieros del Programa Operativo Anual 2022 con corte al 27 de Julio de 2022.

**Quinto Punto:** Para agotar el último punto del orden del día, en uso de la voz el C. Amulfo Urbiola Román, quien dirigiéndose a los presentes y en especial a los integrantes del Consejo se dispone a clausurar la Asamblea manifestando que siendo las 13:09 horas del día miércoles 27 de Julio del año 2022, se declara clausurada la **Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde, S. L. P.**, así como son válidos los acuerdos que en esta asamblea fueron tomados en consideración. Agradeciendo la Asistencia de todo los Presentes, se cierra la presente

Acta.

**FIRMAS**


**PRESIDENTE DEL CONSEJO**



---

**C. ARNULFO URBIOLA ROMAN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**SECRETARIO TECNICO**



---

**ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MUNICIPAL

**REPRESENTANTE DEL H. CABILDO**



---

**C. ROSA MA. HUERTA VALDEZ**  
REGIDORA MUNICIPAL

**REPRESENTANTE DEL H. CABILDO**



---

**C. NANCY SELENE JUAREZ OVIEDO**  
REGIDORA MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO



C. EZEQUIEL MEDINA GOVEA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1  
PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

PROFR. JAIME RAMOS AMAYA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO  
SECTOR 2 INF OJO DE AGUA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

*Noe de Jesus MTCMZ*  
C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SAN ANTONIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

*Marisela Garcia Martinez*  
C. MARISELA GARCIA MARTINEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6  
SECTOR QUEZADA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

C. MARIANA GPE. AGUNDIZ SANCHEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9  
SECTOR PROGRESO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO



C. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES

REPRESENTANTE COMUNITARIO

*Prof. Leonides Granados Hernandez*  
PROFR. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SANTA FE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

*Hugo A. Ochoa*  
C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 5 ZONA CENTRO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

*Juan Jesus Contreras Gonzalez*  
C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7  
ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

*Roberto Garcia*  
C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10  
SECTOR SAN FRANCISCO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Graciela Marquez Mendez  
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11  
MIGUEL HIDALGO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Profr. Juan Mendez Galicia  
PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12  
SAN JOSE DEL TAPANCO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Matilde Galicia B.  
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13  
PLAZUELA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

C. Ma. Eugenia Hernandez Ramirez  
C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14  
EL ZAPOTE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Maria del Carmen Cabrera D.  
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA DIAZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 15  
EL CAPULIN

REPRESENTANTE COMUNITARIO

C. Elizabeth Garcia Perez  
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 16  
EL JABALI

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Bianca Alicia Cedillo  
C. BLANCA ALICIA CEDILLO ROCHA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17  
SAN JOSE DE LAS FLORES

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Ismael Juarez V.  
C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18  
PUENTE PRIETO

**ASESOR TECNICO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO**  
DELEGADO REGIONAL SEDESORE

**ASESOR TECNICO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES**  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

**ASESOR TECNICO**

\_\_\_\_\_  
**C. P. JOANNA BRONDO LOREDO**  
TESORERA MUNICIPAL

**ASESOR TECNICO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO**  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**ASESOR TECNICO**

\_\_\_\_\_  
**C. JOSE ALVARO RODRIGUEZ RDZ**  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
S.A.S.A.R.

**ASESOR TECNICO**

\_\_\_\_\_  
**ING. DANIEL MONTALVO PEREZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ASESOR TECNICO**

\_\_\_\_\_  
**ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO**  
DIRECTOR DE IMPLAN



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024  
**V (QUINTA) SESIÓN ORDINARIA**  
**MIERCOLES 27 DE JULIO DE 2022**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**CONSEJERO**

**CARGO**

**FIRMA DE ASISTENCIA**

**C. ARNULFO URBIOLA ROMAN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE




**ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ**  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

SECRETARIO TECNICO




**C. ROSA MA. HUERTA VALDEZ**  
 REGIDORA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL  
 H. CABILDO



**C. NANCY SELENE JUAREZ OVIEDO**  
 REGIDORA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL  
 H. CABILDO

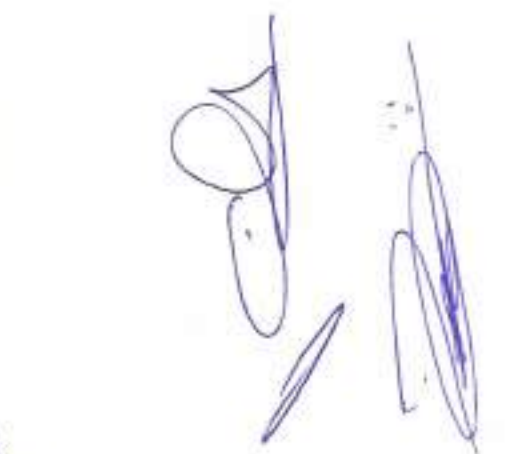







CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

**V (QUINTA) SESIÓN ORDINARIA  
MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2022**

**LISTA DE ASISTENCIA**

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. EZEQUIEL MEDINA GOVEA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1 PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA	
PROFR. JAIME RAMOS AMAYA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 2 INF OJO DE AGUA	
PROFR. J. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 3 SANTA FE / SAN MARCOS	
C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 4 INF LOS NARANJOS	<u>Noe de Jesus MTE CRUZ</u>
C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 5 ZONA CENTRO	<u>Hugo Armando</u>
C. MARISELA GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6 ZONA PLAZA BICENTENARIO	<u>Marisela Garcia Martinez</u> Juan Jesús Contreras Gonzalez
C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7 ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO	
C. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES	





CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

V (QUINTA) SESIÓN ORDINARIA  
MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. MARIANA GUADALUPE AGUNDIZ SANCHEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9 PROGRESO	
C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10 SAN FRANCISCO DE ASIS	<u>Roberto Garcia</u>
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11 MIGUEL HIDALGO	<u>Graciela Marquez Mendez</u>
PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12 SAN JOSE DEL TAPANCO	
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13 PLAZUELA	<u>Matilde Galicia</u>
C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14 EL ZAPOTE	
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA DIAZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 15 EL CAPULIN	<u>Maria del Carmen Cabrera Diaz</u>
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 16 EL JABALI	
C. BLANCA ALICIA CEDILLO ROCHA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17 SAN JOSE DE LAS FLORES	<u>Blanca Alicia Cedillo</u>
C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18 PUENTE PRIETO	<u>Ismael Juarez Vanegas</u>

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

**V (QUINTA) SESIÓN ORDINARIA  
MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2022**

**LISTA DE ASISTENCIA**

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO DELEGADO REGIONAL DE SEDESORE	ASESOR TECNICO	
LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES SECRETARIO DEL H. AYTO.	ASESOR TECNICO	
C. P. JOANNA BRONDO LOREDO TESORERA MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
ING. DANIEL MONTALVO PEREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ASESOR TECNICO	
ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO DIRECTOR DEL IMPLAN	ASESOR TECNICO	
C. JOSE ALVARO RODRIGUEZ RDZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE S.A.S.A.R.	ASESOR TECNICO	

