



MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: MOLOXCO
MONTO: \$ 1,050,000.00
INICIO: 08-abr-20
TERMINO: 06-ago-20
DIAS CALENDARIO: 120

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P., REPRESENTADO POR **PROFR. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA Y C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ , COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE: **CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL C: **ALEXIS GALVAN RUBIO** EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIÉNES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA”, ASI MISMO CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES” Y COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA, EL C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA Y EL ING. SERGIO MARQUEZ CORREA, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EN SU ORDEN; Y QUE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:




**DECLARACIONES**

**I.- “EL AYUNTAMIENTO”.**

**I.1.-** Que es una entidad de carácter público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en cuanto a su régimen interior, y con plena libertad para administrar su hacienda, de conformidad con lo que se establece en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

**I.2.-** Que sus facultades devienen de lo establecido en los preceptos 70 fracciones IV y XXIX; 75 fracción VIII y 78 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y acreditan su personalidad como Presidente Municipal, Primer Síndico y Secretario General para el período 2018-2021 con las copias certificadas del periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de treinta de Septiembre de dos mil dieciocho, que contiene la declaratoria de validez de la elección e integración de los 58 Ayuntamientos de esta Entidad, para el período comprendido del uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta de septiembre de dos mil veintiuno, del acta de sesión Solemne de Cabildo de primero de octubre del mismo año, para la instalación del Ayuntamiento de la Administración Municipal durante el período mencionado del uno de Octubre de dos mil dieciocho.

**I.3.-** Que el pago de las erogaciones que se deriven del presente contrato, se realizara con recursos municipales dentro del programa **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)** para lo cual se cuenta con un saldo disponible en la partida correspondiente para su ejecucion, según el Acuerdo Administrativo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2020, publicado a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil veinte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 18 en su fracción III así como el art. 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí vigente.





MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020



I.4.- Que el número del presente contrato es **XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020**  
 del procedimiento de **POR ADJUDICACION DIRECTA**

I.5.- Que designa al personal de la Dirección de Obras Públicas para que coordine y supervise la correcta elaboración de los trabajos objeto del presente contrato.

I.6.- Que con el presente instrumento se le da cabal cumplimiento a lo estipulado por el Art. 104 en sus XVIII fracciones pertenecientes a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de fecha 24 relativo a los requisitos indispensables que deberá de incluir el instrumento para la contratación de obra pública.

**II.- "EL CONTRATISTA"**

II.1.- Ser una persona Física/Moral debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las oficinas de San Luis Potosí, S.L.P.

II.2.- Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato en su carácter de Administrador Único, y manifiesta bajo protesta de decir la verdad, que no le han sido restringidas ni revocadas en tanto que su representado no participa en algún procedimiento de suspensión de pago, de liquidación o de emplazamiento de huelga, "EL CONTRATISTA", se identifica con credencial oficial

con credencial para votar vigente expedida por el INE con numero folio:

**1024042107812**

II.3.- De nacionalidad mexicana pero en caso de que llegara a adquirir cualquier otra nacionalidad, así se seguirá considerando, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación, todo derecho adquirido a través del presente instrumento.

II.4.- Que tiene capacidad y solvencia económica, financiera, jurídica, técnica, de organización y elementos necesarios para contratar y obligarse en los términos de este instrumento.

II.5.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que exige la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas vigente en el Estado y su Reglamento, así como las bases, normas y especificaciones generales para la contratación y ejecución de obras públicas.

II.6.- Que cuenta con los siguientes registros:

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes:

**CEI1512116L4**

Registro Estatal Único de Contratistas:




**REUC-SLP-0588/19**

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de la obra objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución a fin de obligarse a su cumplimiento en los términos pactados.

**III.- "LAS PARTES"**

Declaran ambas partes que se reconocen recíprocamente la personalidad y carácter con que comparecen a la celebración de este contrato; manifestando, para todos los efectos legales procedentes, que el presente documento se encuentra libre de cualquier vicio del consentimiento, tales como error, dolo o violencia, basándose su suscripción en la buena fe, honradez, legalidad, solidaridad y seriedad de las partes, sujetando el mismo tenor de las siguientes:

*Alex Carcan*

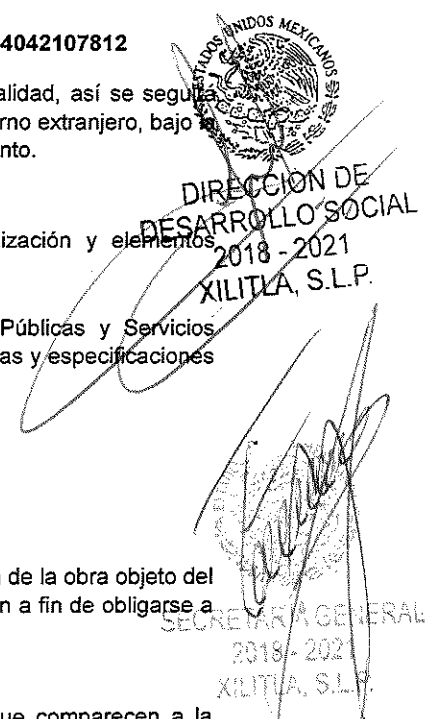



MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020  
CLÁUSULAS:



**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.** "EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a la realización de los siguientes trabajos :

**CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO**

ubicados en **MOLOXCO** Obra que se ejecutará de acuerdo con los proyectos, planos,

especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos autorizados y validados por las autoridades correspondientes, los cuales forman parte integrante de este contrato y constan en el expediente de Concurso

número **XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020**

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO A PRECIO UNITARIO.** El importe total de los trabajos objeto del contrato es el siguiente:

Subtotal:	\$	905,172.41	( NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)
iva 16%:	\$	144,827.59	( CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.)
Total:	\$	1,050,000.00	( UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.** "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos el día **08 de abril del 2020** y a concluirlos a más tardar el día **06 de agosto del 2020** siendo un total de **120 Días Naturales**

de conformidad con el programa de obra anexo, "EL AYUNTAMIENTO" por su parte, verificará su terminación en un plazo de 5 días naturales posteriores a la fecha en que le fuere comunicada la terminación por "EL CONTRATISTA"; y además dispondrá de 20 días naturales posteriores siguientes a la recepción de dichos trabajos a fin de elaborar el finiquito correspondiente.






**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.** "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a tener oportunamente la disponibilidad material de los lugares en que deberán ejecutarse los trabajos materia de este contrato, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 121 de la Ley que rige la Obra Publica en el Estado.

**QUINTA.- ANTICIPOS.** Se otorgara el 30% del importe de este contrato para el inicio de los trabajos, teniendo que ser amortizado en las estimaciones correspondientes. Siendo el importe el siguiente:

Subtotal:	\$	271,551.72	( DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)
iva 16%:	\$	43,448.28	( CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.)
Total:	\$	315,000.00	( TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.** Las partes convienen que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, las que deberán elaborarse en un plazo no mayor a un mes de acuerdo a lo siguiente:

1.-"EL CONTRATISTA" entregará al supervisor asignado por "EL AYUNTAMIENTO" las estimaciones de los trabajos ejecutados durante el período de que se trate dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de corte acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.





MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020

2.- Una vez que el supervisor revise el contenido de la estimación, la dictaminará y regresará a "EL CONTRATISTA".

3.-"EL CONTRATISTA" entregará la estimación y el dictamen del supervisor en el lugar, fechas y horarios indicados previamente por "EL AYUNTAMIENTO".

4.- "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a efectuar el pago de las estimaciones, en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir de que sea autorizado por el Municipio. El lugar de pago, será en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P. ubicada en Plaza Principal S/N Zona Centro en Xilitla, S.L.P. Código Postal 79900.

En caso de incumplimiento de los pagos de las estimaciones y de ajustes de costos, "EL AYUNTAMIENTO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Los gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario a interés compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de noventa días calendario. Posterior a este plazo se obliga "EL AYUNTAMIENTO" a pagar la tasa de interés interbancaria que opere en la banca privada y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".





Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar a "EL AYUNTAMIENTO" las cantidades e intereses respectivos, conforme en una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación, en casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagos en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta un máximo de noventa días. Posterior a este plazo, se obliga "EL CONTRATISTA" a pagar la tasa de interés interbancaria hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO", tal como lo especifica el artículo 138 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de San Luis Potosí.

5.- Cuando la obra tenga un avance físico del 85%, "EL CONTRATISTA" se obligará a entregar el presupuesto total a ejercer, así como los números generadores que avalen dicho importe; y será requisito para continuar estimando.

**SÉPTIMA.- DIFERENCIAS EN PROYECTO.** "EL CONTRATISTA" se obliga a cuantificar la totalidad de los trabajos, y a presentar en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de inicio de las obras, las diferencias de volúmenes que pudieran existir en el catálogo de conceptos, unidades de medida y cantidades de obra. Si cumplido el plazo "EL CONTRATISTA" no presentara diferencia alguna, "EL AYUNTAMIENTO" no aceptará reclamaciones posteriores y este cuenta con 20 días naturales para la regularización y autorización de los expedientes correspondientes.

**OCTAVA.- MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO.** "EL AYUNTAMIENTO" podrá dentro del programa de inversiones aprobado y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato mediante convenio, siempre y cuando, estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Para la correcta aplicación de los convenios de referencia se deberá solicitar la ampliación de la fianza entregada inicialmente y garantizar con esto el monto total a ejercer debidamente autorizado. No se otorgarán anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos anteriormente mencionados.





MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020



**NOVENA.-GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I, II, III, del numeral 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí así como de los artículos 59 al 67 del Reglamento complementario de la Ley antes mencionada, mismas que se expedirán a favor de la Tesorería del Municipio de Xilitla, S.L.P. y conforme a lo siguiente:

1.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir una fianza por la totalidad del anticipo para garantizar la correcta aplicación del mismo, esta garantía subsistirá hasta que se haya amortizado en la proporción correspondiente a cada estimación, la totalidad del anticipo.

2.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir una fianza por el 10%, del monto total contratado, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato cuando se acuerden ampliaciones al contrato original "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía en la misma proporción para que "EL AYUNTAMIENTO" pueda recibir y tramitar las estimaciones correspondientes.

3.- "EL CONTRATISTA" se obliga a garantizar la ejecución de los trabajos objeto de este contrato mediante póliza de fianza por el 10% del monto total de la obra realizada para responder de los defectos que pudieran resultar de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. La vigencia de esta garantía permanecerá por un plazo de doce meses contado a partir de la fecha de la terminación y entrega de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal, al término del cual, de no haber inconformidad por parte de "EL AYUNTAMIENTO" procederá a su cancelación. En caso de presentarse vicios ocultos, o alguna deficiencia en la ejecución de la obra "EL AYUNTAMIENTO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la afianzadora, para que se hagan efectivas las fianzas.

4.- En el supuesto de que la obra lleve implícitos trabajos de impermeabilización, "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la carta de garantía de durabilidad que el fabricante otorga, de esa manera se aseguran dichos trabajos por un período de ocho años. La carta será emitida a nombre del beneficiario, enviando copia a la dirección ejecutora, así como a la supervisión.

**DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción, el ajuste de los costos sólo se aplica sobre los costos directos a los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia y conforme a los lineamientos y metodología establecidos en los artículos 126,127,128, 129,130,131,132 y demás relativos de la Ley en cita, y los artículos 105, 106, 144 a 153 del Reglamento respectivo.

Los ajustes se calcularán con base en el índice de Precios al Productor, en la Actualización de Costos de las Obras Públicas que es publicado por el Instituto Nacional de Estadística, y Geografía del período en que se trate.

En el caso de insumos derivados del petróleo, principalmente asfalto, los ajustes serán calculados con base en el índice de precios genéricos para el mercado nacional expedido por el Instituto Nacional de Estadística, y Geografía incluidos en el índice de precios productor para el periodo en que se trate



DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL  
2018-2021  
XILITLA, S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL  
2018-2021  
XILITLA, S.L.P.

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
INSTITUTO NACIONAL  
2019-2021  
XILITLA, S.L.P.

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2019-2021  
XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA  
2019-2021  
XILITLA, S.L.P.

Handwritten signature and circular stamp.



MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020

Desarrollo Social  
Municipal de Xilitla,  
S.L.P.

La revisión y ajuste de costos se hará previa solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA", que deberá ser presentada dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; transcurrido dicho plazo precluye el derecho del contratista para reclamar el pago, acompañado de la documentación comprobatoria necesaria, la revisión se hará de acuerdo con la Ley de Obras Públicas en mención y su reglamento.

En el procedimiento de revisión "EL AYUNTAMIENTO" previo análisis de la documentación comprobatoria necesaria aportada por "EL CONTRATISTA" dentro del plazo estipulado por la Ley resolverá y notificará la procedencia de la petición. "EL AYUNTAMIENTO" deberá cubrir a "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la estimación, el ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados de acuerdo a lo establecido en el numeral 133 de la multicitada Ley.

"EL CONTRATISTA" podrá solicitar el ajuste de costos aplicable hasta en tanto no haya firmado el acta determinación de obra; una vez firmado el finiquito no habrá ningún pago o concepto adicional.

**DÉCIMA PRIMERA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.** La recepción de los trabajos, se realizará conforme a lo siguiente:

"EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL AYUNTAMIENTO" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y este verificará que los trabajos estén debidamente concluidos mediante los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto marque Ley que rige la Obra Pública y los Servicios Relacionados con esta en el Estado en sus artículos 152 al 157, 161, así como del numeral 135 al 138 del Reglamento de la misma Ley, una vez constatada dicha terminación por parte de "EL AYUNTAMIENTO", este procederá a su recepción dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación de conclusión.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de "EL AYUNTAMIENTO" en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública; los daños y perjuicios que resultaren de su inobservancia, serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO" comunicará a la Contraloría, la terminación de los trabajos, e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que si lo estima conveniente nombre representante que asista al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente, reservándose "EL AYUNTAMIENTO" EL derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo cual si en el presente contrato se presentaran tales circunstancias "EL CONTRATISTA" se compromete a subsanarlas acudiendo a las citas que programe el "EL AYUNTAMIENTO".

Para proceder el finiquito de la obra "EL CONTRATISTA" presentará en forma obligatoria el registro fotográfico del proceso constructivo de la obra, el cuál contendrá al menos 2 (dos) fotografías de cada concepto de trabajo y Plano definitivo.

De igual forma se compromete el contratista a entregar el finiquito correspondiente en un término no mayor a 30 días hábiles, una vez realizada la entrega física de los trabajos; ya que después de la recepción formal de los trabajos se dará por concluida y finiquitada en los términos del procedimiento que para tal efecto señala el artículo 154 de la Ley en cita, razón por la que no procederá reclamación posterior "EL CONTRATISTA" hacia "EL AYUNTAMIENTO".



DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

*Alexis Caban*

SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

SINDECATO  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

TESORERÍA  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.



MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020

Desarrollo Social  
Municipal de Xilitla,  
S.L.P.

**DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA.** "EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos un representante permanente que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá demostrar tener conocimientos técnicos y capacidad de decisión amplia y suficiente.

**DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.** "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos del contrato.

**DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.** "EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecución de los trabajos convenido entre las partes, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" supervisará con una periodicidad mínima de una vez a la semana.

Si al verificarse la supervisión se detecta que el avance es menor, "EL AYUNTAMIENTO" aplicará una retención económica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra realmente ejecutada y la obra que debió realizarse conforme a lo programado para la iniciación de los trabajos, hasta la de su revisión. Por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente.

La pena que se establece en el párrafo que antecede procederá mientras que el monto máximo de las sanciones sea el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, en caso de que este porcentaje sea rebasado, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar por aplicar el procedimiento referente a la rescisión administrativa.

Al realizar el cálculo de la retención de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes, para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada.

En caso de que la obra cuente con supervisión externa el costo por retraso será imputable al "EL CONTRATISTA", este asumirá los cargos de la supervisión externa mediante la deductiva correspondiente de acuerdo a esta cláusula.

En caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA", éste deberá solicitar por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos de su solicitud y anexando la recalendarización propuesta, la cual será a criterio de "EL AYUNTAMIENTO" aceptada o rechazada según considere conveniente.

Si la causa de la demora fuere imputable a "EL CONTRATISTA"; "EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de exigir de inmediato el cumplimiento del contrato o determinar la rescisión administrativa sin detrimento de aplicar las sanciones respectivas.



DIRECCION DE  
DESARROLLO SOCIA  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

*Alonso Carbon...*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.



MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020

"EL AYUNTAMIENTO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.

Las penas convencionales señaladas anteriormente son independientemente de la facultad que tiene "EL AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

**DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** "EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato continuará produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

**DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.** "EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente este contrato, con fundamento en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de San Luis Potosí vigente así como del numeral 124 al 134 respectivos del Reglamento por causas de incumplimiento; acordando las partes, que cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine la rescisión del contrato, operará de pleno derecho, bastando que se cumpla el procedimiento que se establece en esta cláusula.



Si "EL AYUNTAMIENTO" determina justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente la comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" exponiendo las razones que para tal efecto se tuvieron.

De lo anterior, se dará cuenta a la tesorería de "EL AYUNTAMIENTO" de Xilitla, S.L.P., y a la Contraloría Municipal a más tardar el último día hábil del mes a través de un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes inmediato anterior, en el cual se informará sobre la suspensión o rescisión del contrato y las causas que lo motivaron.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos, requisitos legales y disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata, sin responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO" además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme lo establecido por este contrato, ni de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Las causas que a criterio de "EL AYUNTAMIENTO" puedan dar lugar a la rescisión administrativa del presente contrato son:

- A).- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha pactada, incluso considerando el desfasamiento que por falta del anticipo en su caso, pudiera generarse en virtud del atraso en la entrega del mismo.
- B).- Si suspende injustificadamente los trabajos ya sea por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "EL AYUNTAMIENTO" por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de calidad aplicables.
- C).- Si no se da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos y el atraso es mayor de 30 días naturales.







MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020



- D).- Si "EL CONTRATISTA" es declarado en quiebra o en suspensión de pagos.
- E).- Falta de maquinaria adecuada para ejecutar los trabajos.
- F).- Falta de personal calificado para llevar a cabo la obra.
- G).- Cuando se suspendan los trabajos a causa de los problemas laborales de todo tipo, así como con sindicatos y huelgas de la empresa ejecutora.
- H).- Cuando se presenten problemas derivados de subcontratos que realice "EL CONTRATISTA", con proveedores u otros prestadores de servicio en caso de existir y que pongan en riesgo la correcta ejecución de los servicios encomendados.
- I).- Por falta de calidad de la obra y mala ejecución de la misma.
- J).- Falta de solvencia económica de la empresa para ejecutar los trabajos encomendados.
- K).- Desacatar en forma injustificada las ordenes que sobre los trabajos de la obra emita el supervisor de "EL AYUNTAMIENTO" o la autoridad responsable de la obra.
- L).- Cuando se presenten accidentes derivados en el proceso de ejecución de la obra y daños a terceros
- M).- En general por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a las disposiciones legales aplicables en materia de obra pública y a las del presente contrato.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.** "EL CONTRATISTA" acepta de conformidad que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

- A).- El 5/1000 (cinco al millar) del importe de cada estimación por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos, que presta "EL AYUNTAMIENTO".
- B).- El 2/1000 (dos al millar) que será destinado para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción a través del Instituto de Capacitación (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)
- C).- Las que las leyes y decretos vigentes establezcan.
- D).- La parte proporcional del anticipo, hasta su amortización total en el ejercicio para el que le fue otorgado.
- E).- Otros descuentos por adeudos contraídos con la Dirección de Obras Públicas, incluyendo retenciones aplicadas.

**DÉCIMA OCTAVA.-** Las partes convienen que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo únicamente de "EL CONTRATISTA", en los términos que indiquen las disposiciones legales aplicables.

**DECIMA NOVENA.-** Las partes señalan como sus domicilios para la práctica de cualquier comunicación, los siguientes:

"EL AYUNTAMIENTO" - Presidencia Municipal de Xilitla, en la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, Plaza Principal s/n Zona Centro, Código Postal 79900, Xilitla, S.L.P.

*Alex Galan*

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL  
2018 - 2021  
XILITLA, S.L.P.

Stamp: MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. SECRETARÍA GENERAL 2018 - 2021 XILITLA, S.L.P.  
Stamp: MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021 XILITLA, S.L.P.  
Stamp: MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021 XILITLA, S.L.P.



MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.  
 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020



"EL CONTRATISTA".- Que su domicilio se sitúa en:

CALLE MIGUEL ALVAREZ ACOSTA NO. 222, PISO 3, COLONIA CENTRO, XILITLA S.L.P., C.P. 79900

**VIGÉSIMA.-** En caso de controversia surgida con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello no previsto, las partes convienen en resolverla a través de la conciliación, previamente a someterla a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., de acuerdo a lo previsto por el artículo 15 de la ya multicitada Ley, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Los contratantes declaran estar debidamente enterados de todas y cada una de las cláusulas contenidas en este contrato y que conocen todos y cada uno de los artículos que se citen firmando de conformidad en

XILITLA, S.L.P., a 6 de abril del 2020

<p><b>"EL AYUNTAMIENTO"</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PROF. MARTÍN EDUARDO MARTINEZ-MORALES</p> <p>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p> <p>COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL</p> <p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>2018 - 2021</p> <p>ABD. ALFREDO MORAN GOMEZ</p> <p>XILITLA, S.L.P.</p> <p>SÍNDICO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA</p> <p>2018 - 2021</p> <p>XILITLA, S.L.P.</p>	<p><b>"EL CONTRATISTA"</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS &amp; GUS, S.A. DE C.V.</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>ALEXIS GALVAN RUBIO</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>TESORERÍA</p> <p>2018 - 2021</p> <p>C.P. RUBEN AGUILAR ESPINOSA</p> <p>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA</p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>2018 - 2021</p> <p>XILITLA, S.L.P.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>2018 - 2021</p> <p>XILITLA, S.L.P.</p> <p>ING. SERGIO MARQUEZ CORREA</p>
--	--
